

CLFC/2019/5 del 28 marzo 2019

**CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to William Sanzani

CLFC/2019/5

### CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sala Consiglio della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì - Cesena convocato con lettera protocollo PG/AT/00002019/1987 del 19/03/2019.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena	Gabriele Antonio Fratto	Presidente	SI'	10,0000
Bagno di Romagna			NO	1,5724
Bertinoro	Gabriele Antonio Fratto	Sindaco	SI'	2,5384
Borghi			NO	0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole	William Sanzani	Vicesindaco	SI'	1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	SI'	20,1987
Cesenatico			NO	5,5679
Civitella di Romagna	Antonio Dattoli	Consigliere	SI'	1,0861
Dovadola	Massimo Falciani	Assessore	SI'	0,6443
Forlì	William Sanzani	Assessore	SI'	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	SI'	2,9912
Galeata	Potito Scalzulli	Assessore	SI'	0,8216
Gambettola	Eugenio Battistini	Vicesindaco	SI'	2,4223
Gatteo			NO	2,1470
Longiano			NO	1,7173
Meldola	Vittorio Cicognani	Assessore	SI'	2,3730
Mercato Saraceno			NO	1,7505
Modigliana			NO	1,2797
Montiano	Mauro Ruscelli	Assessore	SI'	0,6526
Portico San Benedetto			NO	0,4594
Predappio			NO	1,6514
Premilcuore			NO	0,4665
Rocca San Casciano			NO	0,7146
Roncofreddo			NO	1,0038
San Mauro Pascoli			NO	2,5990
Santa Sofia			NO	1,1692
Sarsina	Enrico Cangini	Sindaco	SI'	1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	SI'	3,9321
Sogliano al Rubicone			NO	0,9739
Tredozio			NO	0,5610
Verghereto			NO	0,7092

Presenti n. 14 quote 74,79  
Assenti n. 17 quote 25,21

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. William Sanzani, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n. 7 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena sono state approvate le modifiche del programma degli interventi 2014 e il consuntivo 2014, proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d'Ambito;
- con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato l'integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - Cesena, conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 8 del 6 ottobre 2017 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019, per le annualità 2017, 2018 e 2019, del gestore HERA S.p.A e la proposta di integrazione del Piano di Ambito.
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

**dato atto** che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2017 n. 22 interventi che invece erano stati programmati come da tabella 3 della relazione allegata;
- vi sono stati n. 14 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel POI: in particolare dei suddetti interventi uno solo costituisce un'anticipazione degli interventi previsti a piano negli anni successivi per un importo di 30.926,77 €;
- vi sono n. 4 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere;

**ritenuto** pertanto di prendere atto:

- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 14 (quote 74,79), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere i necessari approfondimenti sulle motivazioni addotte dal gestore a giustificazione degli scostamenti rilevati sullo stato di avanzamento dei quattro interventi citati nella relazione di accompagnamento allegato 1 al presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2017**

**GESTORE: HERA S.P.A.  
SOTTOAMBITO: FORLI'-CESENA**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, modificato con delibera n.ro 8 del 06 Ottobre 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

		PIANIFICATO 2017	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 8.504.000	€ 59.227	€ 8.563.227
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 287.529	€ 287.529
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 8.504.000	-€ 228.301	€ 8.275.699
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 10.212.000	-€ 5.945.814	€ 4.266.186
TOTALE	Totale pianificato	€ 18.716.000	-€ 5.886.586	€ 12.829.414

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 31 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha eseguito investimenti inferiori per un 2,7% rispetto a quanto pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

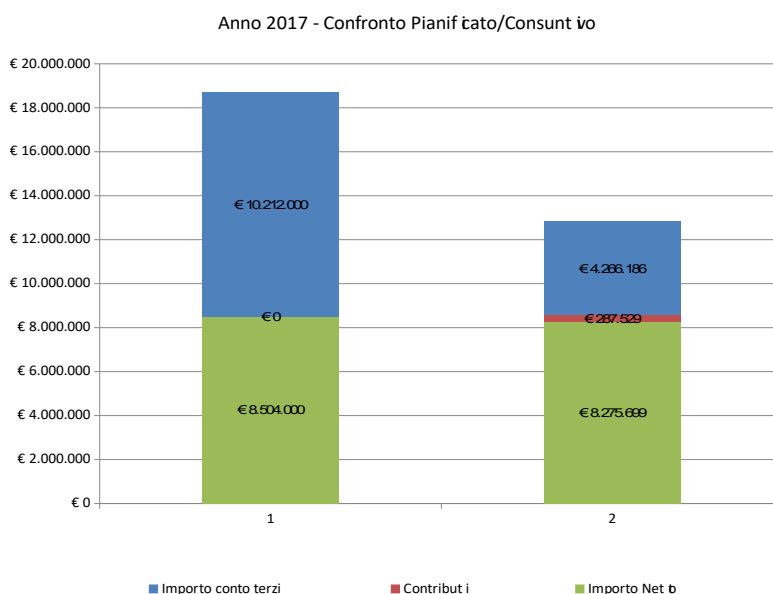


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2017 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2017*): 64

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 56

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	22	€ 39,535	€ 2,996,000	4	2017FCHA0004, 2014FCHA0070, 2015FCHA0021, 2014FCHA0117
2	Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	14	€ 383,157	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	33	€ 8,591,422	€ 12,125,000		
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	9	€ 3,815,300	€ 3,595,000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2016 n.ro 22 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 14 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi;
- vi sono stati n.ro 4 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per i quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto ai 56 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 59 % di questi (33 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 29 % rispetto al pianificato.



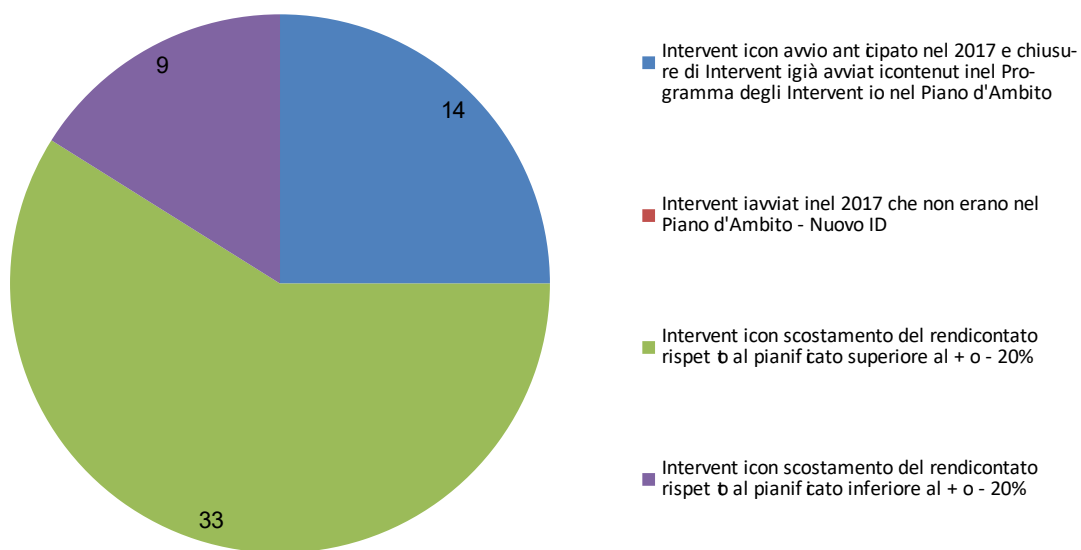


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Unica Reti	Aperto	Bagno di Romagna	74.000,00
2014FCHA0008	POT CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Gestore	Annullato	Bertinoro	180.000,00
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Aperto	Bertinoro	0
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	Aperto	Bertinoro	20.000,00
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Borgi	Romagna Acque	Aperto	Borgi	300.000,00
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Borgi	Romagna Acque	Aperto	Borgi	100.000,00
2014FCHA0049	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,II	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	Annullato	Dovadola	306.000,00
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2'	FOGNATURA	Dovadola	Unica Reti	Aperto	Dovadola	17.000,00
2014FCHA0064	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO	FOGNATURA	Forlì	Romagna Acque	Annullato	Forlì	482.000,00
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPUR	DEPURAZIONE	Forlì	Unica Reti	Aperto	Forlì	30.000,00
2014FCHA0067	POTENZIAMENTO RETE H2O VIA SOPRARIGOSSA GA	ACQUEDOTTO	Gambettola	Gestore	Terminato	Gambettola	0
2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Aperto	Gambettola	0
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Aperto	Gambettola	20.000,00
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BE	ACQUEDOTTO	Portico e San Ben	Gestore	Aperto	Portico e San Benedetto	20.000,00
2015FCHA0025	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	Terminato	Roncofreddo	180.000,00
2015FCHA0026	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	Annullato	Roncofreddo	20.000,00
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	Aperto	Roncofreddo	292.000,00
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOZIA	FOGNATURA	Santa Sofia	Unica Reti	Aperto	Santa Sofia	100.000,00
2014FCHA0113	RISANAMENTO SCARICO 3 SARSINA - SOLLEVAMENT	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	85.000,00
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Ru	Unica Reti	Aperto	Savignano sul Rubicone	400.000,00
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	Sogliano al Rubic	Gestore	Aperto	Sogliano al Rubicone	20.000,00
2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO - DISINFEZI	DEPURAZIONE	Tredozio	Unica Reti	Aperto	Tredozio	350.000,00
							2.996.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2014FCHA0001	MAGNANA BAGNO DI ROMAGNA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagr	Gestore	Terminato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0002	RINN RETE H2O V.CASELLINA	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagr	Gestore	Annullato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0003	RINNOVO CONDOTTA SERB.SCOPE TO	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagr	Gestore	Terminato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0004	RISANAMENTO SCARICHI 6-8-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Annullato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0005	RISAN.SC 4-5-7-9-B.ROMAGNA-LOC.VARIE	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Annullato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONE	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0003	RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0005	RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0006	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Annullato	Bagno di Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI B	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Gestore	Aperto	Bagno di Romagna	150.000,00	0	150.000,00	47.103,76	0	47.103,76	-102.896,24	-68	SVOLTI INCONTRI CON I TECNICI DELL'ENTE.
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagr	Unica Reti	Aperto	Bagno di Romagna	74.000,00	0	0	0	0	0	-74.000,00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0008	POT CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Gestore	Annullato	Bertinoro	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0	-180.000,00	-100	
2014FCHA0010	POT. RETE ACQUEDOTTO DI S.MARIA L1 A	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Terminato	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0011	POTENZIAMENTO RETE ACQU DI S.MARI TRA.B	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Terminato	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0012	POTEN.RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Aperto	Bertinoro	372.000,00	0	0	7.950,32	0	0	-364.049,68	-97	PROLUNGAMENTO TEMPI PER ITER DI ESPROPRIO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL COMUNE DI BERTINORO IL 06/10/2016 PROT. 109174, LA PROCEDURA E' ATTUALMENTE IN CORSO INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. REALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO COERENTE CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA. SCOSTAMENTO 2017 LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE.
2014FCHA0013	POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA NUOVA LOTTO3	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Aperto	Bertinoro	253.000,00	0	0	182.608,39	0	0	-70.391,61	-27	LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE.
2014FCHA0014	POTEN.RETEACQ.SMARIANUOVA LOTTO3 PROVINCIA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Annullato	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	Aperto	Bertinoro	0	0	0	994,89	0	0	994,89	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO AD ASPETTI CONTABILI (PRESENTAZIONE CONTO FINALE E ULTIMAZIONE FATTURAZIONE).
2014FCHA0016	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	Aperto	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0017	RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA	FOGNATURA	Bertinoro	Romagna Acque	Aperto	Bertinoro	295.000,00	0	0	358.718,31	0	0	63.718,31	21	LAVORI IN ESECUZIONE. CONSUNTIVO COERENTE ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AL RITARDO GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016
2014FCHA0018	RISANAMENTO SCARICHI 36-37-38 E POT.ACQUA, BERTIN	FOGNATURA	Bertinoro	Romagna Acque	Annullato	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0124	Rinnovo rete Collinello	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Gestore	Annullato	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0008	RISAN.SC.36 POLENTO	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	Aperto	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0009	Risanamento SC.37-38 COLLINELLO	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	Aperto	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Unica Reti	Aperto	Bertinoro	0	0	0	0	0	0	0,00	0	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	Aperto	Bertinoro	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELLE PRIORITA'
2014FCHA0019	REALIZ. CENTRALE POMP. LOC.FORANO BORGH	ACQUEDOTTO	Borgh	Gestore	Terminato	Borgh	0	0	0	0	-15.130,28	-15.130,28	0,00	0	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2015. INCASSATO NEL 2017 ULTERIORE QUOTA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
2014FCHA0020	REALIZ.CENTRALE STRADONE M.REGGIANO	ACQUEDOTTO	Borgh	Gestore	Terminato	Borgh	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGH-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Borgh	Romagna Acque	Aperto	Borgh	300.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Borgh	Romagna Acque	Aperto	Borgh	100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCAF	FOGNATURA	Castrocaro Terra	Gestore	Aperto	Castrocaro Terra Sole	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0022	BON. RETE ALL. V.FANTAGUZZI	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0023	BON.RETE E ALL. V.AMBUGI - CESENA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Annullato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0024	BON.RETE ALL.VMACRELLI CORB.COMAN.CESENA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0025	RINN RETE H2O LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	50.000,00	0	50.000,00	110.251,47	0	110.251,47	60.251,47	120	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE: AVANZAMENTO LEGATO ALLA CONCOMITANZA DEGLI INTERVENTI ACQUE E FOGNATURA CON ID 2014FCHA0028 E 2014FCHA0039 SU PIEVESISTINA.
2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	184.000,00	0	184.000,00	38.180,38	0	38.180,38	-145.819,62	-79	NECESSITA' DI MODIFICHE PROGETTUALI PER PRESCRIZIONI IN SEDE CONFERENZA DEI SERVIZI
2014FCHA0027	RINN.RETE AC - V. ACQUAROLA CESENA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	Cesena	Romagna Acque	Aperto	Cesena	323.000,00	0	0	411.045,71	0	0	88.045,71	27	INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. CONSUNTIVO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE.
2014FCHA0029	ADEGEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRA	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	540.000,00	0	540.000,00	679.478,20	0	679.478,20	139.478,20	25	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. CONSUNTIVO LEGGERMENTE SUPERIORE AL VALORE PIANIFICATO LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE.
2014FCHA0030	IMPIANTO FITODEPURAZIONE BAGNILE	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	Aperto	Cesena	910.000,00	0	0	350.882,79	0	0	-559.117,21	-61	NECESSITA' DI MODIFICHE PROGETTUALI PER PRESCRIZIONI IN SEDE CONFERENZA DEI SERVIZI
2014FCHA0032	RISAN SC.163 - V. DE CESARI FRAZ.BULGARN	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	-14.190,73	-14.190,73	0,00	0	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2015. INCASSATO NEL 2017 ULTERIORE QUOTA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
2014FCHA0033	RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0035	RISANAMENTO SCARICO 87 AIE TIPANO (RETE-ALL)	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0036	POTENZ. SOLL. E DORSALE S. GIORGIO	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	30.000,00	0	30.000,00	3.985,50	0	3.985,50	-26.014,50	-86	INTERVENTO CONCLUSO NEI TEMPI PIANIFICATI. L'IMPORTO 2017 ERA RELATIVO AD EVENTUALI ONERI PER LA CHIUSURA CONTABILE DEI LAVORI CHE NON SI SONO RESI NECESSARI.
2014FCHA0037	RINN RETE FOG V.CALCINARO CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Annullato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	50.000,00	0	50.000,00	31.296,08	0	31.296,08	-18.703,92	-37	
2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	Aperto	Cesena	2.628.000,00	0	0	1.079.751,16	0	0	-1.548.248,84	-58	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. AVVIO LAVORI POSTICIPATO DI UNA ANNUALITA' RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO CONSEGUENTEMENTE ALL'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI GARA NEL 2016, COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI
2014FCHA0040	RISANAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA UBER	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2014FCHA0128	Risanamento scarico 26 frazione S.Cristoforo	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Terminato	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	80.000,00	0	80.000,00	45.342,88	0	45.342,88	-34.657,12	-43	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMI	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0006	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEP.CESEI	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0025	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMEN	FOGNATURA	Cesena	Gestore	Aperto	Cesena	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0034	RISANAMENTO SCARICO 50-55-136-137-138 AG	FOGNATURA	Cesena, Cesena	Gestore	Aperto	Cesena, Cesenatico	0	0	0	0	-178.165,23	-178.165,23	0,00	0	
2014FCHA0041	RISAN. SC.D1 - ADEG. DEP.CESENATICO	DEPURAZIONE	Cesenatico	Gestore	Terminato	Cesenatico	0	0	0	85.000,00	0	85.000,00	85.000,00	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2015-2016. NEL 2017 SONO STATE COMPLETATE LE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE
2014FCHA0042	POTENZ.SOLL.S9-ADEG. Q.E.-MIS.PORTATA	FOGNATURA	Cesenatico	Gestore	Aperto	Cesenatico	0	0	0	0	-80.042,29	-80.042,29	0,00	0	
2014FCHA0043	NUOVA RETE MISTA V.SQUERO-SUCCI-SEMPRINI	FOGNATURA	Cesenatico	Gestore	Annullato	Cesenatico	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0044	RINN.RETE PER DISSESTO FRANOSO-GIAGGIOLO	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	Terminato	Civitella di Romagna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0045	RINN. RETE AC - VIA CARINI CIVITELLA	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	Terminato	Civitella di Romagna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0012	STUDIO DI FATTIBILITA' ACQUEDOTTI RURALI CIVITELLA	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	Terminato	Civitella di Romagna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0013	RISANAMENTO AGGLOMERATO CIVITELLA DI ROMAGNA	FOGNATURA	Civitella di Romagna	Gestore	Terminato	Civitella di Romagna	0	0	0	30.926,77	0	30.926,77	30.926,77	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. ANTICIPATO LAVORO PREVISTO NEL 2018 IN QUANTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016. INOLTRE SI SONO EVIDENZIATE ECONOMIE RISPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO, CHE ERA DI LARGA MASSIMA.
2017FCHA0028	Estensione acquedotto località Zotto a Civitella	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	Aperto	Civitella di Romagna	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0046	RINNOVO RETE ACQUA VIA TREGGIOLO	ACQUEDOTTO	Dovadola	Gestore	Terminato	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0047	RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	Aperto	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0048	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12 DOVADOLA -I stralcio	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	Terminato	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0049	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,Il stralcio	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	Annullato	Dovadola	306.000,00	0	306.000,00	0	0	0	-306.000,00	-100	
2014FCHA0129	Modellazione sistema fognario Dovadola	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	Terminato	Dovadola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST	FOGNATURA	Dovadola	Unica Reti	Aperto	Dovadola	17.000,00	0	0	0	0	0	-17.000,00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0050	RINNOVO RETE E ALLACCIAMENTI ACQUA V.PALAZZOLA	ACQUEDOTTO	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0051	RINN PENSILE VILLA SELVA FORLI'	ACQUEDOTTO	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0052	POTENZIAMENTO SERBATOIO SADURANO FORLI'	ACQUEDOTTO	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0053	RISAN. SC. D1 FORLI - POTENZ. SEDIM -	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0054	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CARPEN	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0055	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO S. BARTOLO - VIA BOLO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	50.000,00	0	50.000,00	303,84	0	303,84	-49.696,16	-99	INTERVENTO DA STRALCIARE IN QUANTO NE E' STATA RIVALUTATA LA NECESSITA'. SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE SI E' CONVENUTO SOLO DI REGOLARE LA PRESA DI MAGRA CON UNA SARACINESCA MOTORIZZATA PER FAR IN MODO CHE QUANDO PIOVE, L_x005F_x005F_x005F_x0019_APPORTO DI ACQUA METEORICA SIA MINORE A MONTE DEL PUNTO CRITICO; SI E' RIVALUTATO LO STUDIO IDRAULICO REALIZZATO, DOVE SI RITENEVA NECESSARIO SPOSTARE LA LINEA IN PRESSIONE DEL SOLLEVAMENTO SAN BARTOLO CHE RECAPITA SU VIALE BOLOGNA IN UNA RETE NERA DN 200 NEI PRESSI DELL_x005F_x005F_x005F_x0019_INCRUCIO VIA CAVA; DA UNA ANALISI APPROFONDATA IL PROBLEMA DI APERTURA DEI CHIUSINI DI VIA BOLOGNA A MONTE DEL SOLLEVAMENTO STESSO NON SEMBRA GENERATO DA QUELLO SCARICO, CONSIDERANDO CHE E' DOPO IL PUNTO CRITICO;MODIFICANDO LA LINEA IN PRESSIONE DEL SOLLEVAMENTO STESSO SI SAREBBE ANCHE MODIFICATA LA CURVA DELLE PORTATE, CHIARAMENTE A DISCAPITO DELLA PORTATA DELLE POMPE.
2014FCHA0056	ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO S. MARINO 1A - V.BOLC	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Annullato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0057	ADEGUAMENTO DEPURATORE PIEVEQUINTA	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	37.359,35	0	37.359,35	37.359,35	100	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO DOVUTO A RITARDI 2016 GIA' MOTIVATI. 2014 PROGETTO PRELIMINARE; 2014/15 PROGETTO DEFINITIVO E RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE (STB X SISMICA, SOPRINTENDENZA E COMUNE); 23/06/2015 AUTORIZZAZIONE SISMICA; 11/05/2016 PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI DA SOPRINTENDENZA; 15/12/2015 VALUTAZIONE PREVENTIVA POSITIVA DAL COMUNE MA ESITO NEGATIVO DA PROVINCIA; 22/02/2016 TRASMESSO PROGETTO A ATERSIR; 11/05/2016 NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI APPROVAZIONE; MODIFICA PROGETTO; EMERGE DIFFORMITA' NELL_x005F_x005F_x005F_x0019_ IMPIANTO ESISTENTE RISPETTO A QUANTO IN POSSESSO DEL COMUNE, SI PROCEDE IN DATA 05/05/2016 A TRASMISSIONE DI SCIA IN SANATORIA; 11/07/2016 RILASCIATO DAL COMUNE ACCERTAMENTO CONFORMITA'; SI RIPRENDE CONTATTO COL COMUNE X RILASCIO NULLA OSTA ALTERNATIVO MA NEGATA DISPONIBILITA'; 14/12/2016 RIPRESENTATA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE A ATERSIR; 04/04/2017 APPROVATO PROGETTO CON DETERMINA N.57; 11/09/2017 INIZIO LAVORI.
2014FCHA0058	RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO - VIA B. DA DU	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0059	SOLLEVAMENTO FOGNARIO VILLAFRANCA - VIA 13 NOVE	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Annullato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO -VIA	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0062	POTENZ. SOLLEVAMENTO GORIZIA, FORL?	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0063	RINN RETE FOGNA V.PALAZZOLA FORLI'	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0064	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO - II ST	FOGNATURA	Forlì	Romagna Acque	Annullato	Forlì	482.000,00	0	0	0	0	0	-482.000,00	-100	
2014FCHA0065	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITA BORGIO SISA	FOGNATURA	Forlì	Romagna Acque	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0091	STUDI PRELIMINARI RISANAMENTO FOSSI TOMBINATI	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Annullato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0130	Trattamento odori depuratore capoluogo	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Terminato	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0001	SOSTITUZIONE TUBAZIONE RICIRCOLO FANGHI DEPURATI	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	4.169,86	0	4.169,86	4.169,86	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. SCOSTAMENTO DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE
2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DI	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATO	DEPURAZIONE	Forlì	Unica Reti	Aperto	Forlì	30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2017FCHA0010	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATO	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0011	RELINING RETE FOGNARIA VIE LUGHESE/GORIZIA	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Annullato	Forlì	10.000,00	0	10.000,00	828,36	0	828,36	-9.171,64	-91	
2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	Forlì	Gestore	Aperto	Forlì	88.000,00	0	88.000,00	74.992,08	0	74.992,08	-13.007,92	-14	
2014FCHA0066	REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	Forlimpopoli	Gestore	Aperto	Forlimpopoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0067	POTENZIAMENTO RETE H2O VIA SOPRARIGOSSA GAMBET	ACQUEDOTTO	Gambettola	Gestore	Terminato	Gambettola	0	0	0	20.573,20	0	20.573,20	20.573,20	100	INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI AVVIATI NEL 2016. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016
2014FCHA0068	SCARICO 2 VIA SOPRARIGOSSA GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Terminato	Gambettola	50.000,00	0	50.000,00	81.467,82	0	81.467,82	31.467,82	62	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE, OVVERO COMPENSAZIONE DI LAVORI PREVISTI NELL'ANNO 2016 .

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico-Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	
2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Aperto	Gambettola	0	0	0	17.967,24	0	17.967,24	17.967,24	100	SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E PER NECESSITA' DI VARIARE AUTORIZZAZIONE SISMICA
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Aperto	Gambettola	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	PROGETTAZIONE RIPROGRAMMATA A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE PRIORITA' INTERVENTI
2017FCHA0013	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	Aperto	Gambettola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0071	NUOVA RETE FOG NERA V. CORBARI GATTEO	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	Terminato	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0072	NUOVA RETE FOGN. N. V. GIOVANNI23 GATTEO	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	Terminato	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0073	NUOVA RETE FOG NERA V. ALLENDE GATTEO	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	Terminato	Gatteo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0074	RINNOVO RETE X FRANA PIAN DI SPINO	ACQUEDOTTO	Meldola	Gestore	Terminato	Meldola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0075	ESTENSIONE CEPPARETO MELDOLA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Meldola	Gestore	Terminato	Meldola	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0076	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMHOFF TEODORAN	FOGNATURA	Meldola	Gestore	Aperto	Meldola	0	0	0	0,01	0	0,01	0,01	100	
2014FCHA0077	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO RIO PARA	FOGNATURA	Meldola	Gestore	Aperto	Meldola	0	0	0	32.526,33	0	32.526,33	32.526,33	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE.
2015FCHA0014	RADDOPPIO VASCA CAMINATE	ACQUEDOTTO	Meldola	Gestore	Terminato	Meldola	0	0	0	86.526,07	0	86.526,07	86.526,07	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DEL 2016.
2014FCHA0078	ADEGUAMENTO DEPURATORE BACCIOLO - DISINFEZ DEPURAZIONE		Mercato Saracen	Gestore	Terminato	Mercato Saraceno	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI	DEPURAZIONE	Mercato Saracen	Gestore	Aperto	Mercato Saraceno	65.000,00	0	65.000,00	26.213,43	0	26.213,43	-38.786,57	-59	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. MODESTO SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AI RITARDI NELL'AVVIO DELLA GARA DI APPALTO DEL 2016, E GIA' MOTIVATI L'ANNO PRECEDENTE.
2014FCHA0133	REGOLARIZZAZIONE SCOLMATORI MERCATO SARACENO	FOGNATURA	Mercato Saracen	Gestore	Terminato	Mercato Saraceno	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	Mercato Saracen	Gestore	Aperto	Mercato Saraceno	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0080	MONTE ZAULI MODIGLIANA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	Terminato	Modigliana	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0081	ADEG. COLLET. MODIGLIANA E DEP. 2° LOTTO	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	Terminato	Modigliana	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0014	NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	Aperto	Modigliana	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0082	RINNOVO RETE ALL. GALILEI-MARCONI-VOLTA-DAVIN	ACQUEDOTTO	Montiano	Gestore	Terminato	Montiano	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0083	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	950.000,00	0	950.000,00	977.735,64	0	977.735,64	27.735,64	2	
2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	1.375.000,00	0	1.375.000,00	1.540.170,68	0	1.540.170,68	165.170,68	12	
2014FCHA0085	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ACQUEDOTTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	234.000,00	0	234.000,00	305.640,12	0	305.640,12	71.640,12	30	
2014FCHA0086	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	19.000,00	0	19.000,00	188.705,94	0	188.705,94	169.705,94	893	
2014FCHA0087	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	125.000,00	0	125.000,00	163.511,84	0	163.511,84	38.511,84	30	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLIN	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu Romagna Acque	Aperto	Opere Pluricomunali	418.000,00	0	418.000,00	281.855,48	0	281.855,48	-136.144,52	-32	LAVORI AVVIATI. LO SCOSTAMENTO 2017 RISULTA CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNUALITA' 2016	
2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	1.125.000,00	0	1.125.000,00	1.217.802,70	0	1.217.802,70	92.802,70	8	
2014FCHA0090	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	150.000,00	0	150.000,00	171.519,33	0	171.519,33	21.519,33	14	
2014FCHA0092	RINNOVO RETI FOGNARIE PROGRAMMATO	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	770.000,00	0	770.000,00	914.756,79	0	914.756,79	144.756,79	18	
2014FCHA0093	RIPRISTINO ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	85.000,00	0	85.000,00	40.784,11	0	40.784,11	-44.215,89	-52	
2014FCHA0094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	310.000,00	0	310.000,00	267.324,60	0	267.324,60	-42.675,40	-13	
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	0	0	0	9.784,00	0	9.784,00	9.784,00	100	
2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRA	FOGNATURA	Opere Pluricomu Romagna Acque	Terminato	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0097	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - I STRALCI	FOGNATURA	Opere Pluricomu Romagna Acque	Aperto	Opere Pluricomunali	225.000,00	0	225.000,00	9.099,62	0	9.099,62	-215.900,38	-95	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET. SI EVIDENZIANO ANCHE ECONOMIE PER IL RIBASSO DI GARA	
2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BC	FOGNATURA	Opere Pluricomu Romagna Acque	Aperto	Opere Pluricomunali	2.643.000,00	0	2.643.000,00	1.583.279,50	0	1.583.279,50	-1.059.720,50	-40	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. AVVIO LAVORI POSTICIPATO RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO CONSEGUENTEMENTE AI TEMPI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NEL 2015 E ALL'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI GARA NEL 2016, COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI	
2014FCHA0123	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	125.000,00	0	125.000,00	115.938,97	0	115.938,97	-9.061,03	-7	
2014FCHA0126	Verifiche ed adeguamenti sismici impianti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	313.000,00	0	313.000,00	106.005,79	0	106.005,79	-206.994,21	-66	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2017 E STATA TERMINATA LA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DEL PENSILE GAMBETTOLA
2014FCHA0131	Automazione e telecontrollo impianti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	62.000,00	0	62.000,00	60.857,81	0	60.857,81	-1.142,19	-1	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FCHA0132	Rinnovo reti e allacci da Pronto Intervento	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	350.000,00	0	350.000,00	574.414,05	0	574.414,05	224.414,05	64	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	10.000,00	0	10.000,00	3.753,33	0	3.753,33	-6.246,67	-62	
2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	138.000,00	0	138.000,00	228.717,86	0	228.717,86	90.717,86	65	QUESTO ID RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI PREVISTI NEL 2016 RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE ROMITI, RECUPERANDO LO SCOSTAMENTO DELL'ANNO PRECEDENTE.
2015FCHA0018	TELELETTURA CONTATORI GRANDI CALIBRI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomu	Gestore	Annullato	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	15.000,00	46.865,15	0	46.865,15	31.865,15	212	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomu	Gestore	Aperto	Opere Pluricomunali	15.000,00	0	15.000,00	14.371,73	0	14.371,73	-628,27	-4	
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDI	ACQUEDOTTO	Portico e San Ber	Gestore	Aperto	Portico e San Benedetto	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELLE PRIORITA'
2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONO	FOGNATURA	Portico e San Ber	Gestore	Aperto	Portico e San Benedetto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0099	BONIFICA RETE IDRICA VIA SANZIO	ACQUEDOTTO	Predappio	Gestore	Terminato	Predappio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0100	POTENZIAMENTO RETE ACQUA LOC. FIUMANA	ACQUEDOTTO	Predappio	Romagna Acque	Aperto	Predappio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0101	ADEGUAMENTO AREA ED IMPIANTO SOLLEVAMENTO EX	FOGNATURA	Predappio	Gestore	Terminato	Predappio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.A. BS 20 E COLLEGAMENTO A I	FOGNATURA	Predappio	Gestore	Aperto	Predappio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0023	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10	FOGNATURA	Predappio	Gestore	Aperto	Predappio	0	0	0	93.165,91	0	93.165,91	93.165,91	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2017 E' CONSEGUENTE AI RITARDI DEL 2016 (GIA' MOTIVATI NELLE NOTE DELL'ANNO 2016) LEGATI ALLA DIFFICOLTA' DELLA DEFINIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INTERVENTI SPECIFICI DA REALIZZARSI.
2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLE	FOGNATURA	Predappio	Gestore	Aperto	Predappio	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0102	SPOSTAMENTO RETE SP3-FOSSO DELLE CAMINATE	ACQUEDOTTO	Premilcuore	Gestore	Terminato	Premilcuore	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0024	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER S.CASCI	ACQUEDOTTO	Rocca San Cascia	Gestore	Aperto	Rocca San Casciano	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0017	DISMISSIONE DEPURATORE E COLLETTAMENTO PISCINA I	DEPURAZIONE	Rocca San Cascia	Gestore	Aperto	Rocca San Casciano	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0103	NUOVO SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	Roncofreddo	Gestore	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0104	CONSOLIDAMENTO AREA DEP. DIOLAGUARDIA	DEPURAZIONE	Roncofreddo	Gestore	Terminato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0105	RISANAMENTO SCARICO 6 - VIA VALLE - FRAZ.SANTA PAC	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	Annullato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0106	RISAN.SC.1-2-4-5-21, RONCOFREDDO-COMPL.	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	Annullato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2017			CONSUNTIVO HERA 2017					
							PIANO ATERSIR 2017 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2017 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2017 INV. NETTI	CONS 2017 INV. LORDI	CONS 2017 CONTRIBUTI	CONS 2017 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2017
2015FCHA0025	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I L FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Terminato	Roncofreddo	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0	-180.000,00	-100	INTERVENTO CONCLUSO IN QUANTO IL LAVORO HA SUBITO UN CAMBIO DEL SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897. VEDI NUOVO ID 2018FCHA0002. PARTE DEI LAVORI SONO STATI REALIZZATI CON QUESTO ID. LA RESTANTE PARTE, A PARTIRE DEL 2017 VERRA' RENDICONTA SULL'ID 2018FCHA0002
2015FCHA0026	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (CI FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Annullato	Roncofreddo	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897
2015FCHA0027	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Annullato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0028	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (F FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Annullato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V (VIA DEL ZI FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOMERA FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0019	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA		Roncofreddo	Romagna Acque	Annullato	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (CI FOGNATURA		Roncofreddo	Romagna Acque	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I L FOGNATURA		Roncofreddo	Romagna Acque	Aperto	Roncofreddo	292.000,00	0	0	0	0	0	-292.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN NUOVO ID GENERATO NEL 2017 IN QUANTO L'INTERVENTO 2015FCHA0025 E' STATO STRALCIATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA ATERSIR. PEC DEL 17-12-2017. RICHIESTA HERA DEL 29-11-2017 PROT. 117728, VS PROT. AT/2017/7897. SI EVIDENZIA INOLTRE UN ALLUNGAMENTO TEMPI ITER DELLE AUTORIZZAZIONI.
2018FCHA0003	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2018FCHA0004	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV (F FOGNATURA		Roncofreddo	Gestore	Aperto	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0107	RINNOVO RETE VIA G.LORCA-MORETTI-PASOLINI ACQUEDOTTO		San Mauro Pascc	Gestore	Terminato	San Mauro Pascoli	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0108	ADEGEGUAMENTO DEPURATORE SANTA SOFIA ( DISINFE. DEPURAZIONE		Santa Sofia	Gestore	Terminato	Santa Sofia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0109	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA FOGNATURA		Santa Sofia	Gestore	Annullato	Santa Sofia	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA FOGNATURA		Santa Sofia	Unica Reti	Aperto	Santa Sofia	100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0110	ADEG. DEP. SARSINA - DISINFEZIONE DEPURAZIONE		Sarsina	Gestore	Terminato	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0111	ADEG. CAP. E SPOST. SC 7 SARSINA (IMHOFF) DEPURAZIONE		Sarsina	Gestore	Terminato	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0112	RISAN. SCARICO 6 - SORBANO LOC. MOLINO FOGNATURA		Sarsina	Gestore	Terminato	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0113	RISANAMENTO SCARICO 3 SARSINA - SOLLEVAMENTO + F FOGNATURA		Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0	-85.000,00	-100	PROGETTAZIONE SOSPESA PER ATTESA DELLA RISPOSTA DEL COMUNE SU ITER ESPROPRIATIVO O STRALCIO INTERVENTO: INVIATE NUMEROSE COMUNICAZIONI AL COMUNE (09/10/2013 PROT. 126199, 19/06/2015 PROT. 72473, 12/12/2016 PROT. 131389), PERVENUTA RISPOSTA COMUNE IL 23/02/2017 PROT. COMUNE 1668 COMUNICANTE CHE I PRIVATI AVEVANO RAGGIUNTO L'ACCORDO, IN REALTA' I PRIVATI NON HANNO MAI DATO L'ASSENSO ALLA SERVITU'
2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2 FOGNATURA		Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0127	Rifacimento rete Sorbano (solo linea) FOGNATURA		Sarsina	Gestore	Terminato	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI ACQUEDOTTO		Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	10.000,00	0	10.000,00	7.654,26	0	7.654,26	-2.345,74	-23	
2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA ACQUEDOTTO		Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO ACQUEDOTTO		Sarsina	Gestore	Aperto	Sarsina	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0115	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI SAVIGNANO - COMPLE' DEPURAZIONE		Savignano sul Ru	Gestore	Terminato	Savignano sul Rubicone	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0116	DEPURATORE SAVIGNANO ADEGUAMENTO AZOTO TOT- DEPURAZIONE		Savignano sul Ru	Gestore	Annullato	Savignano sul Rubicone	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0134	NUOVA RETE ACQUA VIA ANTOLINA ACQUEDOTTO		Savignano sul Ru	Gestore	Terminato	Savignano sul Rubicone	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND DEPURAZIONE		Savignano sul Ru	Unica Reti	Aperto	Savignano sul Rubicone	400.000,00	0	0	0	0	0	-400.000,00	-100	CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI FOGNATURA		Sogliano al Rubic	Gestore	Aperto	Sogliano al Rubicone	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-20.000,00	-100	RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELLE PRIORITA' INTERVENTI
2015FCHA0032	NUOVO BUSTER PER SERBATOIO MELETO ACQUEDOTTO		Sogliano al Rubic	Gestore	Aperto	Sogliano al Rubicone	100.000,00	0	100.000,00	53.773,19	0	53.773,19	-46.226,81	-46	MINORI ONERI RISPETTO AL PIANIFICATO PER DEFINIZIONE DI SOLUZIONE TECNICA DIVERSA DA QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA. DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE 2016 E DALLE ANALISI DELLE POSSIBILI SOLUZIONI COSTRUTTIVE, SI È OPTATO PER UNA SOLUZIONE IMPIANTISTICA PIÙ SEMPLICE (REALIZZAZIONE DI UN BOOSTER, RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO)
2014FCHA0118	PROGETTAZIONE ADEGEGUAMENTO DEPURATORE TREDI DEPURAZIONE		Tredozio	Gestore	Terminato	Tredozio	0	0	0	3.698,42	0	3.698,42	3.698,42	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE SU QUESTO ID VENGONO RENDICONTATE ESCLUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE POICHE' LE OPERE VERRANNO REALIZZATE MEDIANTE UN NUOVO ID FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET UNICA RETI (2017FCHA0023).
2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDIOZIO - DISINFEZIONE DEPURAZIONE		Tredozio	Unica Reti	Aperto	Tredozio	350.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00	-100	
2014FCHA0119	CAPANNE VERGHERETO-ASSE3 ACQUEDOTTO		Verghereto	Gestore	Terminato	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0120	RISANAMENTO SCARICHI 1-2-3-15-16-17-18 VERGHERET FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Annullato	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2014FCHA0121	RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	25.000,00	0	25.000,00	1.782,58	0	1.782,58	-23.217,42	-92	RITARDO PER NECESSITA' DI EFFETTUARE RILIEVO DI DETTAGLIO DI DIVERSI PUNTI DELLA RETE FOGNARIA ESISTENTE
2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0033	RISAN. SC.1-15-16 VERGHERETO FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0034	RISAN. SC.17 VERGHERETO FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGI FOGNATURA		Verghereto	Gestore	Aperto	Verghereto	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Totale</b>							<b>18.716.000</b>	<b>0</b>	<b>8.504.000</b>	<b>12.829.414</b>	<b>-287.529</b>	<b>8.275.699</b>	<b>-5.886.586</b>		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 5 del 28 marzo 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2017 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 28 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to William Sanzani

Il segretario verbalizzante  
F.to Ing. Stefano Santandrea

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 luglio 2019
