

CLPR/2018/5 dell'11 maggio 2018.

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.

LA COORDINATRICE F.to Tiziana Benassi



CLPR/2018/5

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 - si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2018/2986 del 4.05.2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Locale Tiziana Benassi, che chiama la funzionaria Fausta Pizzaghi, ad assisterla in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
		NO	0,6385
		NO	0,8811
		NO	0,6019
		NO	0,3471
		NO	1,5743
		NO	1,5303
		NO	0,5809
Zanetti Michela	Assessore	SI'	2,8284
		NO	1,8860
		NO	0,4083
		NO	0,5741
Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
Malvisi Davide	Assessore	SI'	5,0320
		NO	1,5152
		NO	1,2243
Grenti Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
Bricoli Giordano	Sindaco	SI'	2,0497
	Riccoboni Davide Zanetti Michela Leoni Elisa Malvisi Davide Grenti Emanuela	Riccoboni Davide Sindaco Zanetti Michela Assessore Leoni Elisa Sindaco Malvisi Davide Assessore Grenti Emanuela Sindaco	Riccoboni Davide Sindaco SI' NO NO NO NO NO NO NO NO NO N



Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MEZZANI	Azzali Romeo	Sindaco	SI'	0,8366
MONCHIO DELLE CORTI	Moretti Claudio	Sindaco	SI'	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8301
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Trevisan Marco	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Gaibazzi Patrizia	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO	Cesari Nicola	Sindaco	SI'	2,0153
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA	Bodria Amilcare	Sindaco	SI'	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052



Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
VARSI			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,0000

Presenti n. 17 quote 65,1 Assenti n. 30 quote 34,9

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice Tiziana Benassi, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione del consuntivo 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 comma 6 lettera c) della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il Programma Operativo Interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano d'Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 54 del 7 ottobre 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Parma di competenza del gestore Iren S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" tale deliberazione tra l'altro dispone che:



- o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo Interventi 2015-19, approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma – o a quanto previsto dal Piano d'Ambito;
- sono presenti n.11 interventi contenuti nel Programma Operativo Interventi 2015-2019 o nel Piano d'Ambito che hanno avuto avvio anticipato nel 2016 o chiusura, sempre nel 2016, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo di €.312.902;
- non sono stati avviati n.31 interventi per un' importo complessivo di €.1.510.000;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti totali netti a tariffa realizzati risultano essere inferiori, rispetto a quanto previsto dal programma operativo, per un importo di €.4.409.289; come anche gli investimenti totali lordi risultano essere inferiori, rispetto a quanto programmato, per un importo di €.4.665.571;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;
- a seguito della trasmissione della documentazione oggetto della presente ai Comuni interessati non sono pervenute osservazioni;



ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi e favorevoli n.17 (quote 65,1), contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI



Servizio Idrico Integrato Consuntivo investimenti annualità 2016 Gestore: IREN S.p.A. (PR)

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 Marzo 2016, che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICA	ATO 2016	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016			
Importo Lordo Pia-				Importo Lordo a		
nificato esclusi gli				Consuntivo esclusi		
Investimenti di				gli Investimenti di		
Struttura [A]	€ 16.425.000	- € 4.665.571	€ 11.759.429	Struttura [A]		
Importo Contri-						
buto Pianificato				Importo Contributo		
[B]	€ 430.000	- € 256.282	€ 173.718	a Consuntivo [B]		
Importo Netto Pia-				Importo Netto a		
nificato [A]-[B]	€ 15.995.000	- € 4.409.289	€ 11.585.711	Consuntivo [A]-[B]		

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato investimenti che si discostano dalla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a - € 4.665.571, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di - € 4.409.289 a fronte dei minori contributi incassati pari a - €.256.282.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

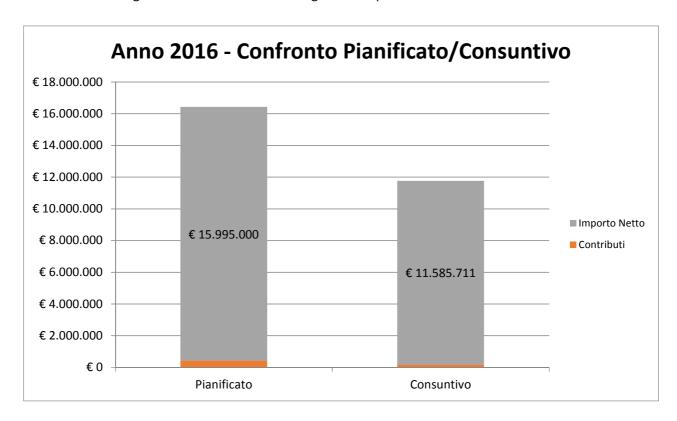


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2016: 78

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 58

		Importo	Importo	Interventi con		
		Lordo [€]	Lordo [€]	nota		PROPOSTA
	Numero	consuntivo	Pianificato	giustificativa		PROVVEDIMENTI
	Interventi	nel 2016	nel 2016	NON esaustiva	ID ATERSIR	ATERSIR
					2014PRIA0003	
					2014PRIA0004	
					2014PRIA0008	
					2014PRIA0022	
					2014PRIA0031	
					2014PRIA0047	
					2014PRIA0049	
					2014PRIA0052	
					2014PRIA0057	
					2014PRIA0061	
					2014PRIA0065	
					2014PRIA0068	
					2014PRIA0074	
					2014PRIA0084	
					2014PRIA0086	
					2014FNIA0080 2016PRIA0110	
					2016PRIA0110	
					2016PRIA0112	
					2016PRIA0114 2016PRIA0115	
					2016PRIA0113 2016PRIA0118	
					2016PRIA0119	
					2016PRIA0119 2016PRIA0121	
					2016PRIA0121 2016PRIA0125	
					2016PRIA0128	
					2016PRIA0128 2016PRIA0135	
					2016PRIA0133	
					2016PRIA0137 2016PRIA0138	
Interventi non					2016PRIA0138 2016PRIA0139	
					2016PRIA0139 2016PRIA0142	
avviati (% di					2016PRIA0142 2016PRIA0147	
scostamento	21	€0	1 510 000	NO		
pari al -100%)	31	€∪	1.510.000	NO	2016PRIA0148	
Intomiosti see					201400140007	
Interventi con					2014PRIA0007	
avvio anticipato					2014PRIA0011	
nel 2016 e					2014PRIA0019	
chiusure di					2014PRIA0034	
Interventi già					2014PRIA0048	
avviati					2014PRIA0050	
contenuti nel					2014PRIA0053	
Programma					2014PRIA0060	
degli Interventi					2014PRIA0088	
o nel Piano			_		2014PRIA0089	
d'Ambito	11	€.312.902	€0	NO	2016PRIA0143	

İ		I				1
		Importo	Importo	Interventi con		DDODOCT*
		Lordo [€]	Lordo [€]	nota		PROPOSTA
	Numero	consuntivo	Pianificato	giustificativa	ID ATERCIA	PROVVEDIMENTI
	Interventi	nel 2016	nel 2016	NON esaustiva	ID ATERSIR	ATERSIR
Interventi						
avviati nel 2016						
che non erano						
nel Piano						
d'Ambito -						
Nuovo ID	0	0	€0			
					2014PRIA0006	
					2014PRIA0010	
					2014PRIA0018	
					2014PRIA0020	
					2014PRIA0023	
					2014PRIA0026	
					2014PRIA0027	
					2014PRIA0032	
					2014PRIA0033	
					2014PRIA0041	
					2014PRIA0042	
					2014PRIA0051	
					2014PRIA0055	
					2014PRIA0056	
					2014PRIA0063	
					2014PRIA0066	
					2014PRIA0071	
					2014PRIA0083	
					2014PRIA0087	
					2014PRIA0091	
					2014PRIA0092	
					2014PRIA0097	
					2014PRIA0099	
					2014PRIA0100	
					2014PRIA0101	
					2014PRIA0102	
					2014PRIA0103	
					2014PRIA0104	
					2014PRIA0105	
					2014PRIA0106	
					2016PRIA0117	
Interventi con					2016PRIA0120	
scostamento					2016PRIA0123	
del					2016PRIA0124	
rendicontato					2016PRIA0130	
rispetto al					2016PRIA0131	
pianificato					2016PRIA0136	
superiore al + o					2016PRIA0127	
- 20%	39	€. 6.047.963	€. 10.010.000	NO	2016PRIA0156	
Interventi con					2014PRIA0029	
scostamento					2014PRIA0067	
del					2014PRIA0085	
rendicontato					2014PRIA0095	
rispetto al					2014PRIA0096	
pianificato					2014PRIA0098	
inferiore al + o -				GIUSTIFICAZIONE	2014PRIA0107	
20%	8	€. 5.398.564	€. 4.905.000	NON RICHIESTA	2016PRIA0111	
						1

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato, nel 2016, 31 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso rispetto a quanto programmato 11 interventi e che 39 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per il quale la giustificazione è risultata esaustiva. Per 8 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

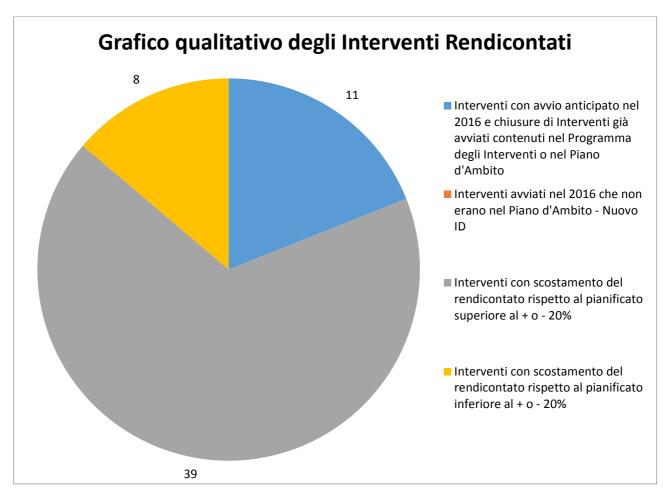


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Importo in- tervento	INVESTIMENTI LORDI 2016
Calestano;	2014PRIA0003	1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	50.000	50.000
Calestano;	2014PRIA0004	2IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio e sorgenti Alpicella	70.000	70.000
Corniglio;	2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	20.000	20.000
Langhirano;	2014PRIA0022	13IAG - Adeguamento fognatura Case Cavatorta in località Giareto	160.000	10.000
Medesano;	2014PRIA0031	19IAG - Sostituzione aeratori vasca ossidazione e installa- zione tappeto poroso depuratore Medesano	40.000	40.000
Neviano degli Arduini;	2014PRIA0047	31IAG - Sistema depurativo Mozzano	50.000	50.000
Neviano degli Arduini;	2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	150.000	50.000
Neviano degli Arduini;	2014PRIA0052	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	60.000	60.000
Noceto;	2014PRIA0057	39IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pom- paggio serbatoio Gatto Gambarone	40.000	40.000
Parma;	2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	800.000	50.000
Parma;	2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	480.000	30.000
Parma;	2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio	470.000	20.000
Parma;	2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	400.000	30.000
Parma;	2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	110.000	90.000
Opere pluricomunali	2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	120.000	30.000
Parma;	2016PRIA0110	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7)	100.000	20.000
Parma;	2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	120.000	120.000
Parma;	2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	280.000	100.000
Parma;	2016PRIA0115	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fognatura Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	70.000	70.000
Parma;	2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	70.000	70.000
Parma;	2016PRIA0119	Interventi di manutenzione straordinaria fognatura pensile all'interno del Canale Maggiore area urbana Cittadella (opera comp.A7)	100.000	60.000
Parma;	2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piaz- zale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	100.000	20.000
Opere Pluricomunali	2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia in- frastrutture posizionate in alveo torrenti	1.180.000	50.000

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Importo in- tervento	INVESTIMENTI LORDI 2016
Langhirano;	2016PRIA0128	71IAG - Sostituzione rete Via Cavatorta lo. Giarreto	50.000	50.000
Langhirano;	2016PRIA0135	80IAG - ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb Manzano	660.000	100.000
Palanzano;	2016PRIA0137	Rifacimento opera di presa Monte Faggeto per impianto Isola	50.000	50.000
Palanzano;	2016PRIA0138	Rifacimento opera di presa Temperla Vairo	80.000	80.000
Palanzano;	2016PRIA0139	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	50.000	50.000
Palanzano;	2016PRIA0142	Opere di protezione prese Lalatta	100.000	10.000
Parma;	2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	70.000	10.000
Parma;	2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	70.000	10.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

			PIAN	NO INVESTIMENT	I APPROVATO	2016		COI	SUNTIVO RENDIC	CONTATO PERIC	DO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0001	Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, Traversetolo, Parma	153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0002	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0003	Calestano	1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	rimandato al 2017 per soppravenuta emergenza serbatoi di Curatico e San Rocco comune di Corniglio (intervento realizzato nel capitolo manut. Str.)	Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavoro impegnata sull'emergenza del servizio) opera prevista nel 2018
2014PRIA0004	Calestano	2IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio e sorgenti Alpicella	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	Eseguito anni precedenti prima del 2015 rimasto refuso in PdI	
2014PRIA0005	Calestano, Felino, Sala Baganza	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0006	Collecchio	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	2.292.343	645.000	130.000	515.000	154.963	0	154.963	-75%	Ripianificata tempistica temporale con comune di Collecchio con adeguamento della convenzione - aggiudicazione ritardata da nuovo decreto LL.PP n° 50 del 2016	
2014PRIA0007	Collecchio	3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	30.000	0	0	0	108.332	0	108.332	100%	Intervento anticipato per emergenza - rifatti anche: manut alla vasca comprensivo della componentistica idraulica, eliminazione ambienti confinati. Nel 2017 si completeranno i lavori di rif. Del tetto e nuovoquadro elettrico di alimentazione e automazione della centrale idrica. (serbatoio del Monte pompaggio per Ripa)	
	Corniglio	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	Effettuate nel 2016 investigazioni sullo stato delle sorgenti	Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavoro impegnata sull'emergenza del servizio) avviata progettazione nel 2018
2014PRIA0009	Corniglio	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0010	Corniglio	5IAG - Ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio Casalina	120.000	120.000	0	120.000	83.138	0	83.138	-30%	Lavoro ultimato verifica aggancio WBS a codice ATERSIR ASSE 3. Importo stornato da codice 054 su cui era caricato erroneamente.	
	Corniglio	21EN - Realizzazione nuovo depuratore Corniglio	1.342.746	0	0	0	55.779	0	55.779	100%	STORNATO - 124.056,43 PORTATO AL CODICE 156. Maggiori oneri dovuti a: adeguamento impianti elettrici - predisposizione inclinometri - adeguamento reti fognarie - regolarizzazione servitù	
2014PRIA0012		24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0013	Corniglio	6IAG - Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa	140.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0014	Corniglio	7IAG - Sistema depurativo in località Tre Rii e località Torre Tre Rii	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0015	Corniglio	8IAG - Sistema depurativo in Località Signatico	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		

			PIAN	NO INVESTIMEN	TI APPROVATO	2016	CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016					INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0016	Corniglio	9IAG - Sistema depurativo località Petrignacola	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0017	Felino	161EN - Ampliamento depuratore Felino (accordo distretto del prosciutto con vasche equalizzazione)		0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0018	Felino	10IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo depuratore Felino	606.668	500.000	0	500.000	618.262	0	618.262	23%	Adeguamento normativo impiantistico cabina di M.T aumentato numero utenze (nuovo sistema trattamento acque di prima pioggia)	
2014PRIA0019	Felino	11IAG -Rifacimento collettore ingresso e sistema flottatori Depuratore Felino	133.211	0	0	0	85.520	0	85.520	100%	Realizzate opere non previste: rifacimento completo condotte dei flottatori - realizzato nuovo sollevamento con condotte per acque meteoriche depuratore	
2014PRIA0020	Fontevivo, Noceto	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	4.661.173	150.000	0	150.000	26.340	0	26.340		di Fontevivo unitamente ad IRETI sta organizzando riunione con	E' stato richiesto nel novembre 2017 alla commissione Provinciale VAM il valore agricolo di mercato congruo per addivenire a cessione bonaria corretta - progetto definitivo depositato presso il comune di Fontevivo in attesa di approvazione
				0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0021 2014PRIA0022	Langhirano, Felino Langhirano	12IAG - Collegamento località Tiorre 13IAG - Adeguamento fognatura Case Cavatorta in località Giareto	160.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	opera concordata con comune da eseguirsi nel 2017	
2014PRIA0023	Langhirano	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli; località Strognano; località Cozzano con relativi collettamenti fognari	260.000	150.000	0	150.000	99.331	0	99.331	-33%	realizzato sistema depurativo di Cozzano - Case Manferdelli in attesa di acquisizione area	
2014PRIA0024	Langhirano	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0025	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0026	Lesignano de Bagni	15IAG - Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	61.435	300.000	0	300.000	91.612	0	91.612	-69%	Ritardo dovuto ad adeguamento aggiudicazione a Decreto LL.PP. N°50 del 2016 -	Lavori in corso di esecuzione
2014PRIA0027	Lesignano de Bagni	49EN - Costruzione nuovo collettore fognario Lesignano capoluogo depuratore Santa Maria del Piano	450.240	340.000	0	340.000	139.152	0	139.152	-59%	opera divisa in due stralci funzionale - nel 2016 realizzato trattao da S.Maria del Piano a via Monti Vitali - in corso di realizzazione secondo stralcio	
2014PRIA0028	Medesano	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0029	Medesano	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	550.000	20.000	0	20.000	19.697	0	19.697	-1%		
2014PRIA0030	Medesano	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	300.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0031	Medesano	19IAG - Sostituzione aeratori vasca ossidazione e installazione tappeto poroso depuratore Medesano	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	rimandato al 2017 causa verifiche tecniche per programmare intervento	Lavori in corso di esecuzione

			PIAN	IO INVESTIMENT	TI APPROVATO	2016		CON	NSUNTIVO RENDIC	CONTATO PERIC	DO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0032	Collecchio, Medesano, Noceto	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola	1.901.943	800.000	0	800.000	11.751	0	11.751	-98%	Opera in ritardo per iter autorizzativo (paessagistica) - Si prevede inizio lavori nel 2017. P.D.C. richiesto in data 17/03/2015 ed autorizzato in data 01/02/2016. E' risultato necessario presentare variante per integrare il progetto iniziale In particolare è stata aggiunta una ulteriore camera di manovra dedicata al caricamento del serbatoio. P.D.C richiesto in data 04/04/2017.	
2014PRIA0033	Collecchio, Noceto, Medesano	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla- ATO-IREN	2.500.000	20.000	0	20.000	1.142	0	1.142	-94%	Opera in attesa di decisione da ditta Barilla - progettazione avviata. L'ampliamento industriale del sito di Rubbiano ha evidanziato il minor fabbisogno idrico rispetto a quanto previsto in convenzione. IRETI è in attesa dalla ditta Barilla del nuovo dato riferito al fabbisogno idrico.	dato avvio al progetto definitivo - modificare convenzione per richiesta idrica Barilla modificata
2014PRIA0034	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	5.480.000	0	0	0	985	0	985	100%	Inizio studi progettuali	
2014PRIA0035	Mezzani	58EN - Opere per realizzazione distretti idrici		0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0036	Mezzani	22IAG - Rifacimento fognatura via Benassi		0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0037	Monchio delle Corti	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi; Rigoso con relativi collettamenti fognari	110.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0038	Monchio delle Corti	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0039	Monchio delle Corti	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0040	Monchio delle Corti	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0041	Monchio delle Corti	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	40.000	40.000	0	40.000	708	0	708	-98%	effettuati interventi di urgenza per messa in sicurezza sanitaria e ripristino funzionale in manutenzione straordinaria - l'opera sarà realizzata nel 2017	Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavoro impegnata sull'emergenza del servizio) avviata progettazione nel 2018
2014PRIA0042	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto	11.705.079	1.000.000	0	1.000.000	26.852	0	26.852	-97%	opera in ritardo per problemi acquisizione area (fallimento). Il valore del terreno da acquisire deve essere validato dal tribunale. Il rogito è avvenuto in data 26 ottobre 2017	L'opera ha subito notevoli ritardi temporali dovuti al fallimento della società proprietaria del terreno su cui dovrà sorgere il nuovo depuratore, acquisto che si è reso possibile alla fine del 2017 dopo il nulla osta del giudice fallimentare incaricato. Nel corso del 2018 è prevista l'approvazione del progetto definitivo e lo svolgimento di gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori. Nel corso del 2019 e 2020 è prevista la realizzazione di un primo stralcio funzionale che comprende la realizzazione di: pretrattamento, trattamento biologico, sedimentatori secondari, vasche di disinfezione, locali tecnici vari e sistemazione aree esterne; tale opera permetterà la dismissione del vecchio impianto di Monticelli ed il trattamento dei reflui provenienti dai nuovi collettori fognari. Ulteriori opere saranno pianificate nel prossimo POI.

			PIAN	IO INVESTIMENT	ΓΙ APPROVATO	2016		COM	ISUNTIVO RENDIC	CONTATO PERIC	DDO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0043	Neviano degli Arduini	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0044	Neviano degli Arduini	28IAG - Sistema depurativo Lodrignano Cabina	10.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0045	Neviano degli Arduini	29IAG - Sistema depurativo Magrignano	55.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0046	Neviano degli Arduini	30IAG - Sistema depurativo Montezebio	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0047	Neviano degli Arduini	31IAG - Sistema depurativo Mozzano	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	rimandato al 2017. Effettuate nel 2016 le verifiche tecniche. Problemi disponibilità terreni limitrofi area depurativa necessari allo svolgimento dei lavori. Opera realizzata nel 2017.	
2014PRIA0048	Neviano degli Arduini	32IAG - Sistema depurativo Sella Di Lodrignano	10.000	0	0	0	20.547	0	20.547	100%	importo derivante da opere aggiuntive (ristrutturazione edile fossa- nuova recinzione - sostituzione setti interni)	
2014PRIA0049	Neviano degli Arduini	33IAG - Sistema depurativo Verola	150.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	in corso verifiche sulla stabilità dei versanti - Ca Bodini previsto nel 2017	Verifiche geologiche effettute - realizzata progettazione per spostamento impianto -Acquistata fossa imhoff - previsto inizio lavori con condizioni climatiche adeguate (giugno - luglio 2018)
2014PRIA0050	Neviano degli Arduini	76EN - Nuovo serbatoio di accumulo in località Mendigola a Neviano	66.998	0	0	0	2.310	0	2.310	100%	collaudi e verifiche tecniche lavoro ultimato	progetto in esecuzione - effettuate indagini geologiche -
2014PRIA0051	Neviano degli Arduini	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	660.000	30.000	0	30.000	511	0	511	-98	preparazione elaborati grafici - opera in ritardo per acquisizione terreno	formalizzare acquisto terreno - inizio lavori 2019
2014PRIA0052	Neviano degli Arduini	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	nel 2016 effettuate indagini propedeutiche alla progettazione (studio assetto idraulico). Le indagini effettuate hanno evidenziato la necissità di realizzare l'ampliamento della camera di manovra esistente e di regolarizzare la patrimonialità dell'impianto (servitù esistenti, proprietà strada accesso ecc.)	progetto in corso - opere previste nel 2018
2014PRIA0053	Neviano degli Arduini	36IAG - Sostituzione condotta alimentazione serbatoio Coste di Urzano	4.127	0	0	0	1.181	0	1.181	100%	collaudi e verifiche tecniche lavoro ultimato	
2014PRIA0054	Calestano, Neviano degli Arduini, Langhirano, Felino	37IAG - Interventi cofinanziati con Asse 3, serbatoi montagna	36.223	0	0	0	0	0	0	0%	lavori Casalina	
2014PRIA0055	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio del Comuni di Neviano; Traversetolo; Montechiarugolo	7.898.448	200.000	0	200.000	15.905	0	15.905	-92%	opera posticipata per allineamento temporale realizzazione depuratore di Monticelli	In fase di aggiudicazione il tratto fognario compreso nel 1 lotto - 1° stralcio funzionale di cui è prevista l'esecuzione nel corso del 2018/19
2014PRIA0056	Noceto	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	623.979	350.000	100.000	250.000	47.096	0	47.096	-86%	ritardo causa contrattualizzazione opere	effettuata consegna dei lavori in data 8/2/2018
2014PRIA0057	Noceto	39IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Gatto Gambarone	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	opera terminata importo contabilizzato nelle manut. Straord.	
2014PRIA0058	Noceto	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	30.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0059	Parma	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0%		

			PIAN	NO INVESTIMEN	TI APPROVATO	2016		CON	NSUNTIVO RENDI	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE		
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0060	Parma	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	2.330.000	0	0	0	758	0	758	100%	Anticipazione di spese cartografiche e visure catastali	
2014PRIA0061	Parma	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	800.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	attesa separazione agglomerati Parma-Corcagnano - Del. 201/2016. Si attendeva la formalizzazione dell'agglomerato di Corcagnano separato da quello di Parma, avvenuta con la D.G.R 201 del 2016.	predisporre progetto prel def avviare gara integrata
2014PRIA0062	Parma	44IAG - Ampliamento depuratore di Baganzola (o.c.A7)	300.000	0	0	0	0	0	0	0%	5-0-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	
2014PRIA0063	Parma	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	1.991.000	20.000	0	20.000	2.255	0	2.255	-88%	opera in attesa di definizione agglomerato di Corcagnano. Si attendeva la formalizzazione dell'agglomerato di Corcagnano separato da quello di Parma, avvenuta con la D.G.R 201 del 2016.	Opera in progettazione
2014PRIA0064	Parma	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	131.151	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0065	Parma	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	480.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	In attesa di autorizzazione ARPAE. richiesta IREN acqua gas del 12/6/2013 - autorizzazione ARPAE del 13/04/2017	Iniziati lavori di ristrutturazione grigle fini di ingresso - impiantistica in fase di progettazione
2014PRIA0066	Parma	47IAG - Manutenzione starordinaria nuovo sollevamento Depuratore Parma OVEST	120.000	50.000	0	50.000	84.424	0	84.424	68%	contabilizzate anche opere del 2015	
2014PRIA0067	Parma	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	425.138	20.000	0	20.000	19.581	0	19.581	-2%		
2014PRIA0068	Parma	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio	470.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	problemi acquisizione terreno pozzo. condotta connessa all'acquisizione del terreno per la realizzazione del pozzo cod 084	Opera da progettarsi a verifiche idriche ultimate da realizzarsi sul nuovo pozzo Cornocchio
2014PRIA0069	Parma	50IAG - Rifacimento condotta acquedotto via Trento DN 400	55.010	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0070	Parma	51IAG - Sistemazione rete fognaria Vigatto zona via Donatori Sangue (priorità 1 Comune di Parma)	220.657	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0071	Parma	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	2.000.000	100.000	0	100.000	32.234	0	32.234	-67%	verifiche tecniche concordate con comune di Parma per eventuale utilizzo canale Cavo di Mariano	
2014PRIA0072	Parma	53IAG - Viale Villetta, estendimento fognatura	110.750	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0073	Parma	54IAG - via Rezzonico, sistemazione fognature	80.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0074	Parma	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	400.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	In attesa di indicazioni da comune di Parma	
2014PRIA0075	Parma	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0076	Parma	57IAG - via Gastaldi e via Colorno, estendimento fognaure	220.000	0	0	0	0	0	0	0%		

			PIAN	IO INVESTIMENT	I APPROVATO	2016		cor	NSUNTIVO RENDI	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE		
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0077	Parma	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	470.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0078	Parma	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0079	Parma	60IAG - Zona San Pancrazio, via Madonna dell'Aiuto e strada del Cristo - estendimento fognatura	220.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0080	Parma	61IAG - Ripristino serbatoio pensile Antognano	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0081	Parma	62IAG - Impermeabilizzazione vasche contenimento siero latte. Dep PR Ovest	10.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0082	Parma	63IAG - Rifacimento condotte fognatura via Trento DE 800	105.070	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0083	Parma	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	985.966	90.000	0	90.000	273.295	0	273.295	203%	Incentivata distrettualizzazione comune di Parma	
2014PRIA0084	Parma	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	110.000	90.000	0	90.000	0	0	0		problemi acquisizione terreno. si attendeva iter conclusivo piano urbanistico per avere area dal privato - problema risolto per individuazione area all'interno delle aree cedute al comune dal privato	
2014PRIA0085	Parma	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	20.038	20.000	0	20.000	16.570	0	16.570	-17%		
2014PRIA0086	Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	120.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	progetto rimandato in attesa di nuovo sistema unificato cartografico territoriale	
2014PRIA0087	Parma, Fontevivo, Noceto	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	936.180	20.000	0	20.000	243.924	0	243.924	1119%	Anticipato intervento per problema nitrati	
2014PRIA0088	Parma, Montechiarugolo, Noceto	67IAG - Raddoppio impianto denitrificazione Centrale idrica Marore	179.541	0	0	0	6.413	0	6.413	100%	collaudi e verifiche tecniche lavoro ultimato	
2014PRIA0089	Parma	68IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo centrale idrica Marore	734.142	0	0	0	825	0	825	100%	collaudi e verifiche tecniche lavoro ultimato	
2014PRIA0090	Sala Baganza	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano		0	0	0	0	0	0	0%		

			PIAN	IO INVESTIMENT	I APPROVATO	2016		CON	ISUNTIVO RENDI	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE		
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0091	Sala Baganza	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	1.317.620	500.000	0	500.000	8.949	0	8.949	-98%	Opera in ritardo per iter autorizzativo (paessagistica) - Si prevede inizio lavori nel 2017. P.D.C. richiesto in data14/04/2015 ed autorizzato in data 04/01/2016. E' risultato necessario presentare variante per integrare il progetto iniziale In particolare è stata aggiunta una ulteriore camera di manovra dedicata al caricamento del serbatoio ed incrementata la superficie del fabbricato.(P.D.C richiesto in data 12/04/2016 ed autorizzato in data 21/09/2017).	- nel marzo 2018 effettuato incontro con comune di Sala Baganza per definizione colori strutture (come definito da
2014PRIA0092	Sorbolo	119EN - Ampliameto depuratore Sorbolo	2.204.646	330.000	0	330.000	452.835	0	452.835	37%	Adeguamento degli impianti elettrici alle normative sopravvenute - Demolizione trovanti sotterranei non censiti - opere richieste da Bonifica Parmense (valvole non ritorno scarico nel canale) - raddoppio potenza generatore.	
2014PRIA0093	Sorbolo	118EN - Opere per realizzazione distretti idrici	30.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2014PRIA0094	Traversetolo	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature		0	0	0	0	0	0	0%		
	Opere pluricomunali	71IAG - Manutenzioni straordinarie		3.020.000	0	3.020.000	3.489.708	0	3.489.708	15%		
2014PRIA0096	Opere pluricomunali	72IAG - Manutenzioni starordinarie		1.490.000	0	1.490.000	1.469.894	0	1.469.894	-1%		
2014PRIA0097	Opere pluricomunali	73IAG - Manutenzioni straordinarie	21.966.088	845.000	0	845.000	1.324.442	0	1.324.442	56%	Si sono risolti diversi problemi evidenziati nel corso dell'anno e negli anni precedenti non più rimandabili. Da stornare - 436.386 da inserire al codice 123. Eseguito storno	
	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo	74IAG - Aggiornamento cartografico	1.063.273	100.000	0	100.000	108.832	0	108.832	8%		
2014PRIA0099	Opere pluricomunali	75IAG - Sostituzione, potenziamento condotte idriche al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.		1.020.000	0	1.020.000	514.272	0	514.272	-49%	eseguite le opere richieste da riqualificazioni comunale	
201400100	Opera pluricamunali	76IAG - Sostituzione, potenziamento condotte fognarie al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte fognarie in occasione di cignalificazioni ctradali da parte dei comuni		275.000	0	275.000	39.542	0	39.542	-85%	oseguito la opera richierta da ricualificazioni comunale	
	Opere pluricomunali Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	riqualificazioni stradali da parte dei comuni. 77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	330.000	40.000	0	40.000	94.885	0	94.885	137%	nell'esecuzione delle opere di telecontrollo si sono dovuti adeguare completamente alcuni impianti elettrici	

			PIAN	IO INVESTIMENT	I APPROVATO	2016		COI	NSUNTIVO RENDI	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE		
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2014PRIA0102	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	1.321.043	250.000	0	250.000	27.734	0	27.734	-88%	ritardi per problemi verifiche presenza segnale telefonico	Lavori in corso di esecuzione
2014PRIA0103	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	505.078	170.000	0	170.000	207.900	0	207.900	22%	nell'esecuzione delle opere di telecontrollo si sono dovuti adeguare completamente alcuni impianti elettrici	
	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	143EN - Estendimento reti acqedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.		200.000	150.000	50.000	151.454	97.186	54.269	-24%	eseguite le opere richieste da Comuni	
	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	720.000	60.000	50.000	10.000	94.172	76.532	17.640	56%	eseguite le opere richieste da Comuni	
	Opere pluricomunali	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua	2.249.845	490.000	0	490.000	294.150	0	294.150	-39%	interventi eseguiti in base alle esigenze riscontrate	
2014PRIA0107	Opere pluricomunali	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna	1.410.871	110.000	0	110.000	125.563	0	125.563	14%		
2016PRIA0108	Langhirano, Felino	Impianto trattamento acqua gallerie Braia/pozzi Fabiola	500.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0109	Corniglio	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	70.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0110	Parma	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7) progettazione e realizzazione verifica sistema	100.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	Richieste indicazioni progettuali a comune in diverse riunioni e comunicazioni. Richieste inviate a comune di Parma in data: 22/07/2016 - 13/09/2016 - 14/11/2016	
2016PRIA0111	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	125.000	125.000	0	125.000	148.719	0	148.719	18%	Vista la complessita delle lavorazioni di risanamento del canale	
2016PRIA0112	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7) progettazione e realizzazione verifica sistema	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	-100%	Naviglio l'intervento è programmato al termine delle lavorazioni del canale Naviglio in accordo con il comune di Parma	
2016PRIA0113	Parma	fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0114	Parma	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	280.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Interventi non effettuati per mancaza passaggio gestionale da comune di Parma. In attesa di presa in carico attività gestionale acque meteoriche bacino tariffario di Parma. Delibera Consiglio d'Ambito del 7/10/2016 - richiesta osservazione a comuni entro data 17/11/2016	Lavori in corso di esecuzione

			PIAN	NO INVESTIMENT	TI APPROVATO	2016		CON	NSUNTIVO RENDI	CONTATO PERIO	DDO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2016PRIA0115	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fognatura Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	Richieste indicazioni progettuali a Comune di Parma in diverse riunioni e comunicazioni. Richieste inviate a comune di Parma in data: 22/07/2016 - 13/09/2016 - 14/11/2016	
2016PRIA0116	Parma	Interventi di sistemazione strutturale rete fognaria Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	100.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0117	Parma	rifacimento tratto fognario in corrispondenza dell'attraversamento tangenziale sud via Langhirano (opera comp.A7)	100.000	100.000	0	100.000	28.714	0	28.714	-71%	Opera in parte realizzata da ultimare per verifica sistemi di riparazione da addottare	
2016PRIA0118	Parma	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7) Interventi di manutenzione straordinaria	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	Richieste indicazioni progettuali a Comune di Parma in diverse riunioni e comunicazioni. Richieste inviate a comune di Parma in data: 22/07/2016 - 13/09/2016 - 14/11/2016	
2016PRIA0119	Parma	fognatura pensile all'interno del Canale Maggiore area urbana Cittadella (opera comp.A7)	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	In attesa di ultimazione verifiche interne (scarichi abusivi). Si stanno effettuando ispezioni all'interno del canale per individuazione degli scarichi abusivi.	Lavoro terminato
2016PRIA0120	Parma	interventi di manutenzione straordinaria collettore di scarico caditoie via Varese (opera comp.A7)	100.000	100.000	0	100.000	74.121	0	74.121	-25%	opera realizzata spendendo cifra inferiore	
2016PRIA0121	Parma	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	100.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	In attesa ultimazione opere di messa in sicurezza torrente Baganza da parte AIPO e Regione	Opera in progettazione - tempistiche concordate con comune di Parma
2016PRIA0122	Fontevivo	80IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio pensile Ponte Taro	200.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0123	Fontevivo	Sistemazione rete fognaria FONTEVIVO capoluogo area Rio Scagno e Canale Vecchio. Collettamento fognatura con sostituzione canalette con adeguate tubazioni	200.000	200.000	0	200.000	436.386	0	436.386	118%	Importo di - 436.386 imputato su codice 97. Realizzato maggior sviluppo collettore per collegamento fognature esistenti posizionate a monte che scaricavano nel rio Scagno.	
2016PRIA0124	Montechiarugolo	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	200.000	50.000	0	50.000	1.550	0	1.550	-96%	Iniziati studi per abbattimento pensile che con accordo con comune sarà realizzato nel 2017	Lavoro ultimato
2016PRIA0125	Opere pluricomunali	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti 75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce	1.180.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Non si è ravvisata necessità di intervento	
2016PRIA0126	Sorbolo, Parma	Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	400.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0127	Sorbolo	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	100.000	80.000	0	80.000	162	0	162	-99%	Richiesto da comune attraversamento condotta gas in attesa di delibera comunale preventivo gas. In attesa di pagamento di preventivo per attraversamento rete gas metano.	In attesa autorizzazione FF.SS per attraversamento ferroviario condotta gas - (come richiesto da Sindaco Sorbolo)
2016PRIA0128	Langhirano	71IAG - Sostituzione rete Via Cavatorta lo. Giarreto	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	opera concordata con comune da eseguirsi nel 2017	lavoro terminato
2016PRIA0129	Sorbolo	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0130	Opere pluricomunali	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	1.360.000	100.000	0	100.000	125.965	0	125.965	25%	Eseguite opere in base a necessità	
2016PRIA0131	Opere pluricomunali	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST; PR EST; FELINO	100.000	100.000	0	100.000	1.569	0	1.569	-98%	nel 2016 effettuate verifiche impiantistiche per installazione - opere previste nel 2017	Previste installazioni nel corso del 2018

			PIAN	NO INVESTIMENT	TI APPROVATO	2016		CON	ISUNTIVO RENDI	CONTATO PERIC	DOO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2016PRIA0132	Tizzano Val Parma	73IAG - Man Str. Sistema fognario Pietta Cisone per evoluzione frane	411.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0133	Mezzani	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0134	Mezzani	73IAG - Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	150.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0135	Langhirano	80IAG - ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb Manzano	660.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	Ritardo per iter autorizzativo. Conferenza prog. Preliminare 13/04/17. Opera prevista nel 2017. Si sono riscontrate difficolta iniziali nell'acquisizione del terreno necessario all'ampliamento del serbatoio Le Olive. Nel frattempo è stato rimodulato l'assetto idraulico dell'acquedotto di Langhirano che prevede la realizzazione di un nuovo sito impiantistico in località Braia composto da: nuovo serbatoio, nuova centrale di potabilizzazione e nuovi pompaggi per l'immissione dell'acqua in rete. Questo nuovo sito impiantistico permetterà di ridurre i consumi energetici e di abbassare la pressione di esercizio della rete di distribuzione idrica. A centrale realizzata si procederà alla ristrutturazione/adeguamento del serbatoio Le Olive che andrà a servire la zona "alta" del capoluogo e fungerà da riserva/emergenza per le "zone basse". Per il serbatoio di Manzano si stanno formalizzando gli accordi per l'acquisto del terreno. Serbatoio di Manzano in attesa definizione acquisto terren	Serbatoio Le Olive in attesa delibera approvazione progetto preliminare. Serbatoio di Manzano in attesa di acquisto terreno da parte comune di Langhirano opera pronta per essere appaltata.
2016PRIA0136	Palanzano	Realizzazione nuovi impianti di clorazione per consolidare corretto mantenimento dei parametri allegato 1 parte A D.Lgs 31/01	195.000	75.000	0	75.000	92.221	0	92.221	22%	interventi eseguiti secondo necessità per conformità sanitarie	
2016PRIA0137	Palanzano	Rifacimento opera di presa Monte Faggeto per impianto Isola	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	iniziati studi sull'assetto generale acquedottistico	Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavo impegnata sull'emergenza del servizio) opera prevista nel 2018
2016PRIA0138	Palanzano	Rifacimento opera di presa Temperla Vairo	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	-100%		Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavo impegnata sull'emergenza del servizio) opera prevista nel 2019
2016PRIA0139	Palanzano	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	iniziati studi sull'assetto generale acquedottistico	In attesa di sopralluogo con tecnico comunale - opera prevista nel 2018
2016PRIA0140	Palanzano	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	20.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0141	Palanzano	Messa a norma serbatoio Caneto	80.000	0	0	0	0	0	0	0%		
	Palanzano	Opere di protezione prese Lalatta	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	fatto studio per verifica utilizzo sorgente (probabile dismissione	Opera rimandata nel 2018 a causa della emergenza idrica sopravvenuta nel corso del 2017. (indisponibilità di riserve idriche alternative e forza lavo impegnata sull'emergenza del servizio) opera prevista nel 2019
2016PRIA0143	Palanzano	Rifacimento imhoff Vaestano	30.000	0	0	0	30.252	0	30.252	100%	intervento anticipato per urgenza fatiscenza impianto	
2016PRIA0144	Palanzano	Rifacimento imhoff Selvanizza A	80.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0145	Palanzano	Rifacimento imhoff Sommogroppo	20.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0146	Palanzano	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		

			PIAN	IO INVESTIMENT	I APPROVATO	2016		CON	ISUNTIVO RENDIC	INTEGRAZIONI NOTE GESTORE		
ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati invetsimenti	Integrazioni/stato avanzamento lavori richieste al Gestore a seguito Ufficio di Presidenza 05.04.2018
2016PRIA0147	Parma	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	Richieste indicazioni progettuali a comune in diverse riunioni e comunicazioni. Richieste inviate a comune di Parma in data: 22/07/2016 - 13/09/2016 - 14/11/2016	
2016PRIA0148	Parma	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	Richieste indicazioni progettuali a comune in diverse riunioni e comunicazioni. Richieste inviate a comune di Parma in data: 22/07/2016 - 13/09/2016 - 14/11/2016	
2016PRIA0149	Parma	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	480.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0150	Parma	via Torrente Gotra realizzazione nuova fognatura mista Vs. collettore via Manubiola. (opera compensativa A7)	40.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0151	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cinghio tombinato (opera comp.A7)	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0152	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fossetta Alta via San Leonardo (opera comp.A7)	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0153	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cava via Ferrarini- via Valera di sopra (opera comp.A7)	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0154	Parma	Interventi di manutenzione straordinaria via Trieste via Montello	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0155	Parma	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	50.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0156	Corniglio	Rifacimento collettore fognario ingresso depuratore Vestola, divelto da ondata di piena torrente.	100.000	100.000	0	100.000	124.045	0	124.045	24%	IMPORTO DI - 124.056,43 CARICATO ERRONEAMENTE SU CODICE 11 -	
2016PRIA0157	Tizzano Val Parma	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto;Reno di TIZZANO; Capriglio; Pianestolla.	300.000	0	0	0	0	0	0	0%		
2016PRIA0158	Sorbolo	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	120.000	0	0	0	0	0	0	0%		
	тота	ALI	117.063.720	16.425.000	430.000	15.995.000	11.759.429	173.718	11.585.711			



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 5 dell'11 maggio 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione del consuntivo 2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 maggio 2018



Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 settembre 2018
