

CLRN/2022/13 del 17 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

IL COORDINATORE

F.to Rizio Santi

CLRN/2022/13

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2022** il giorno **17** del mese di **novembre** alle ore **9:30** si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera PG.AT/2022/0011318 del 10/11/2022.

La seduta si è svolta in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Santi Riziero	Presidente	Sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	Sì	4,9895
CASTELDELICI				0,4219
CATTOLICA	Uguccione Alessandro	Assessore	Sì	4,2784
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	Sì	2,8251
GEMMANO	Riziero Santi	Sindaco	Sì	0,5988
MAIOLO				0,5205
MISANO ADRIATICO				3,6415
MONDAINO				0,6480
MONTECOPIOLO				0,5802
MONTEFIORE CONCA				0,8678
MONTEGRIDOLFO				0,5694
MONTESCUDO - MONTE				1,9471
MORCIANO DI ROMAGNA				2,0428
NOVAFELTRIA				2,0063
PENNABILLI				0,9597
POGGIO TORRIANA	Raggini Ronny	Sindaco	Sì	1,5630
RICCIONE	Andruccio Christian	Assessore	Sì	8,6178
RIMINI	Montini Anna	Assessore	Sì	36,1532
SALUDECIO				1,0581
SAN CLEMENTE				1,6835
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	Sì	2,5823
SAN LEO	Bindi Leonardo	Sindaco	Sì	1,0075
SANT'AGATA FELTRIA				0,8098
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Fussi Pamela	Vicesindaco	Sì	5,6472
SASSOFELTRIO				0,6587
TALAMELLO				0,5864
VERUCCHIO				2,7358

Presenti n. 11 quote 78,26 - Assenti n. 17 quote 21,74

Riconosciuta la validità della seduta Riziero Santi, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:



Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 3 del 28 settembre 2020 del Consiglio Locale di Rimini è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.86 del Consiglio d'Ambito del 21 settembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Modena, Ferrara, Bologna e Rimini, gestiti da HERA S.p.A.;
- con nota PG.AT/2021/0004734 del 21/05/2021 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR il nulla osta di ATERSIR ai sensi della deliberazione di Consiglio d'Ambito n.75/2017, per "Variante progettuale che determina un aumento dell'importo progettuale complessivo superiore a 200.000 € rispetto a quello già previsto nel POI vigente" (Caso D) relativo all'intervento 2018RNHA0012 "REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO" in Comune di Bellaria (RN);

- con deliberazione n.12 del 26 luglio 2022 del Consiglio locale di Rimini è stata approvata la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023;

considerato inoltre che:

- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata a tutti i comuni del bacino provinciale di Rimini, in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano complessivamente pari a 29.694.422,65 €, valore superiore di circa il 32% rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti a favore unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 dal gestore HERA S.p.a. e relativi al bacino tariffario di Rimini, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 13 del 17 novembre 2022

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 17 novembre 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: HERA S.p.A.
BACINO PROVINCIALE DI RIMINI**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 03 del 28/09/2020 (oggetto di successiva revisione straordinaria per le sole annualità 2022 e 2023 con deliberazione di Consiglio Locale di Rimini n.12 del 26/07/2022), che il gestore HERA S.p.A. ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	14.510.000,00	19.323.444,98	4.813.444,98	33%
SOCIETÀTERZE	6.831.919,16	7.110.500,31	278.581,15	4%
FINANZIAMENTI PUBBLICI	1.098.000,00	3.260.422,36	2.162.422,36	197%
TOTALE	22.439.919,16	29.694.367,65	7.254.448,49	32%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Per quanto riguarda il riconoscimento tariffario degli investimenti di struttura si rimanda alle *Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa* approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il Gestore HERA S.p.A. abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 33% con riferimento a quelli direttamente finanziati, e del 4% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è superiore di quello pianificato del 197%. Complessivamente lo scostamento è stato del 32%.

La percentuale di investimenti realizzati, esclusi gli investimenti di struttura, è pertanto dell'88%.

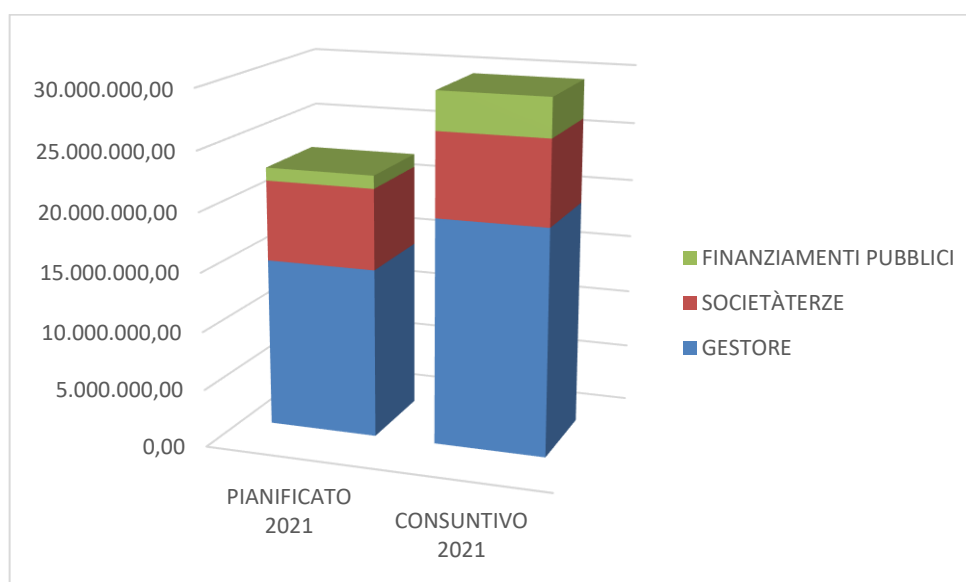


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	6.437.000,00	10.730.421,15	4.293.421,15	67%
DEPURAZIONE	2.595.000,00	4.277.313,46	1.682.313,46	65%
FOGNATURA	12.907.919,16	14.686.633,04	1.778.713,88	14%
ACQUE METEORICHE	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%
TOTALE	22.439.919,16	29.694.367,65	7.254.448,49	32%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per servizio e rappresentati graficamente come segue:

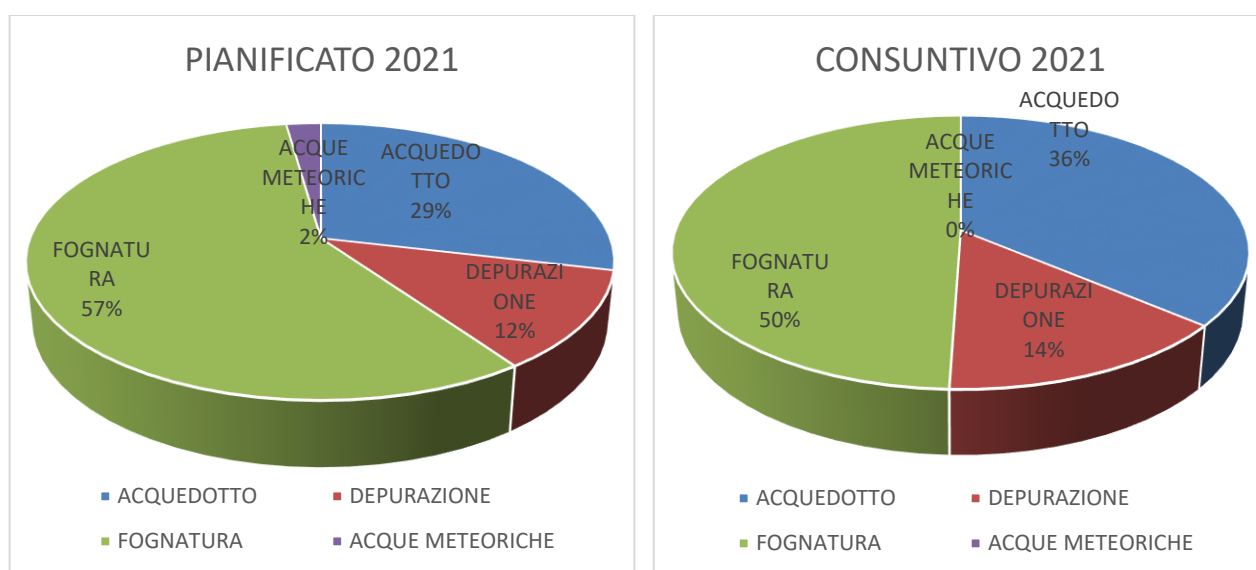


FIG.2 – Suddivisione per servizio investimenti pianificati e consuntivati 2021

Il totale degli investimenti è costituito dagli interventi di manutenzione straordinaria contenuti in titoli cumulativi. Per questi titoli è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i micro-interventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

La tabella successiva fornisce un focus degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie di acquedotto, fognatura e depurazione contenute in titoli cumulativi.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	4.300.000,00	9.633.146,06	5.333.146,06	124%
DEPURAZIONE	1.480.000,00	2.046.497,75	566.497,75	38%
FOGNATURA	2.800.000,00	4.715.283,94	1.915.283,94	68%
ACQUE METEORICHE	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100%
TOTALE	9.080.000,00	16.394.927,75	7.314.927,75	81%

TAB.3 – Investimenti relativi ai titoli cumulativi delle manutenzioni straordinarie

Confrontando i dati della TAB.3 con quelli della TAB.2 si deduce che l'incidenza dei titoli cumulativi nell'anno 2021, era il 40% del valore totale pianificato e si accresce fino al 55% del valore totale consuntivato.

Si riportano di seguito gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

IMPORTO	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	47	656.919,16	483.900,34	-173.018,82	-26%
501.000-1.000.000 €	11	1.211.000,00	1.035.201,41	-175.798,59	-15%
1.000.001-2.000.000 €	10	1.232.000,00	741.325,18	-490.674,82	-40%
2.000.001-5.000.000 €	15	1.719.000,00	884.326,77	-834.673,23	-49%
Oltre 5.000.000 €	16	8.541.000,00	10.154.686,20	1.613.686,20	19%
Interventi cumulativi	21	9.080.000,00	16.394.927,75	7.314.927,75	81%
TOTALE	120	22.439.919,16	29.694.367,65	7.254.448,49	32%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

In ultimo, per i titoli relativi a opere specifiche, viene effettuata un'analisi degli scostamenti tra quanto il Gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- ritardi accumulati per il prolungamento delle attività autorizzative o approfondimenti tecnici
- riprogrammazione di attività
- flusso di fatturazione alle Società degli Asset
- accordo di finanziamento non ancora sottoscritto
- minori/maggiori esigenze di manutenzione straordinaria a riguardo dei titoli cumulativi, i quali hanno una pianificazione annuale di massima

Il numero di interventi a piano relativi a opere specifiche è pari a 99. Il numero di interventi con un importo pianificato nel 2021 è pari a 46. Il numero di interventi con un importo rendicontato nel 2021 è pari a 42. Ci sono inoltre 46 interventi presenti a piano nell'annualità 2021 con importo pianificato pari a 0 e importo rendicontato pari a 0.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	11	680.000,00	0,00
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	7	0,00	581.436,65
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	24	6.411.000,00	6.196.446,64
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	11	6.268.919,16	6.521.556,61
TOTALE	53	13.359.919,16	13.299.439,90

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal Gestore

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono ritenute esaustive e sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI “NON AVVIATI”

Si riporta l'elenco degli interventi “non avviati”, che presentano un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (inseriti convenzionalmente con scostamento pari a -100%).

Possono essere, ad esempio, interventi non iniziati, annullati, sospesi, con accordo di finanziamento non ancora sottoscritto. Per maggiori dettagli si rimanda alle note giustificative contenute nell'allegato 1.

	Codice	Titolo	Ser- vizio	Comune	Tipo Investimento	Importo lordo pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021
1	2017RNHA0018	Nuova rete fognaria in Via Lombardia	F	Riccione	Gestore	30.000,00	
2	2017RNHA0003	Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica	D	Cattolica	Gestore	27.000,00	
3	2014RNHA0011	Completamento rete fog. al coll. Novafeltria	F	Novafeltria	Gestore	20.000,00	
4	2021RNHA0012	Revamping piping sollevamento ISA	F	Rimini	Gestore	7.000,00	
5	2021RNHA0004	PSB - realizzazione vasca Rodella e condotte sottomarine	F	Rimini	Soc. Asset non definita	327.000,00	
6	2021RNHA0010	Nuova rete fognaria in Via della Repubblica Località Sant'Andrea in Besanigo	F	Coriano	AMIR	28.000,00	
7	2017RNHA0015	Adeguamento della linea fanghi e sistema di trattamento odori del depuratore di Riccione	D	Riccione	Gestore	16.000,00	
8	2017RNHA0026	Adeguamento e potenziamento rete fognaria vie Pellico, Bruxelles	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	50.000,00	
9	2014RNHA0055	PSB - condotta sottomarina Ausa	F	Rimini	Romagna Acque	100.000,00	
10	2014RNHA0048	Ottimizzazione sistema fog. Riccione	F	Riccione	Gestore	50.000,00	
11	2014RNHA0072	PSB - realizz. dorsale sud RN II stralcio	F	Rimini	Gestore	25.000,00	

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Rimini n. 3 del				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2020RNHA0001	PSB - collegamento vasche Colonnella I e Colonnella II	F	Rimini	Gestore	6.547.120,00	129.000,00	-	-	129.000,00	139.418,45	-	-	139.418,45	10.418,45	8%	
2	2017RNHA0018	Nuova rete fognaria in Via Lombardia	F	Riccione	Gestore	50.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-100%	Scostamento 2021 legato al fatto che l'intervento è ancora da progettare e ripianificato in quanto dalle valutazioni tecniche svolte dal gestore l'intervento non risulta presentare criticità dal punto di vista ambientale, non viene infatti inficiato il corretto funzionamento del sistema fognario della zona su cui insiste, nè risulta strategico
3	2020RNHA0004	Interventi per l'attuazione del Piano di indirizzo delle acque di prima pioggia (priorità 2)	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	2017RNHA0025	Adeguamento depuratore Cà Baldone S.Agata Feltria (Priorità 3 DGR 201/2016)	D	Sant'Agata Feltria	Gestore	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	2018RNHA0002	Dismissione dep. Ponte S.M. Maddalena e coll. fognario	F	Opere Pluricomunali	AMIR	961.000,00	237.000,00	-	237.000,00	-	181.718,82	-	181.718,82	-	55.281,18	-23%	Intervento in fase di esecuzione. Lo scostamento 2021 è conseguente ai ritardi subiti dalle attività di cantiere per la necessità di definire una variante sismica del sollevamento e a causa della necessaria sistemazione dell'argine
6	2014RNHA0070	Adeg rete fog V.S.chiara-vicolo cima RN	F	Rimini	Gestore	620.000,00	53.000,00	-	-	53.000,00	80.553,57	-	-	80.553,57	27.553,57	51%	Intervento terminato. Scostamento 2021 dovuto al fatto che sono stati anticipati importi pianificati a POI nel 2022
7	2017RNHA0003	Adeguamento trattamenti primari del depuratore di Cattolica	D	Cattolica	Gestore	600.000,00	27.000,00	-	-	27.000,00	-	-	-	-	27.000,00	-100%	Scostamento 2021 legato alla riprogrammazione per riattribuzione priorità interventi riguardanti il depuratore di cattolica. Ai fini del corretto funzionamento dell'impianto non sussistono problematiche impattanti associate a questo intervento, pertanto l'intervento di miglioramento della sezione è stato riprogrammato
8	2014RNHA0005	Costr. di fognatura lungo Via Mulazzano (sc.3)	F	Coriano	Gestore	988.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	2014RNHA0011	Completamento rete fog. al coll. Novafeltria	F	Novafeltria	Gestore	346.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-100%	Scostamento 2021 legato al fatto che dalla progettazione sono emerse alcune criticità realizzative in corso di approfondimento. Una volta individuata la scelta progettuale ottimale verrà avviato l'iter autorizzativo presso gli enti preposti
10	2014RNHA0068	PSB - real. vasca Colonnella e condotte sottomarine	F	Rimini	Gestore	46.344.218,00	445.000,00	-	-	445.000,00	398.604,00	-	-	398.604,00	46.396,00	-10%	
11	2021RNHA0012	Revamping piping sollevamento ISA	F	Rimini	Gestore	2.880.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00	-100%	Intervento già in fase di progettazione (adeguamento pompaggi secondari alle nuove condizioni di funzionamento di marecchie in tempo di pioggia). Scostamento 2021 legato unicamente alle tempistiche di rendicontazione economica delle attività di progettazione già svolte
12	2017RNHA0006	Nuova rete fognaria in Località Passano tra Via Flaminia Conca e Via Stracciarino	F	Coriano	Gestore	60.000,00	-	-	-	-	4.290,59	-	-	4.290,59	4.290,59	100%	Consistente riduzione dell'importo complessivo del progetto legata ad economie realizzative e all'ottimizzazione funzionale della rete fognaria rispetto a quanto previsto in sede di studio di fattibilità. In particolare sono state possibili profondità di scavo molto inferiori a quelle ipotizzate in fase di fattibilità (non era nota la quota del recapito) permettendo un notevole risparmio di costi. intervento concluso
13	2014RNHA0078	Adeg. reti fogna S.Arcangelo Z.Stazione	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	1.744.000,00	-	-	-	-	9.259,77	-	-	9.259,77	9.259,77	100%	Scostamento relativo ad alcune sistemazioni da completare che sono slittate ad inizio 2021, per motivi legati all'organizzazione del cantiere. L'opera è funzionale e in esercizio. Intervento concluso
14	2018RNHA0005	Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica - bacino Via Toscana e strade limitrofe	F	Cattolica	Gestore	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	2021RNHA0001	Adeguamenti sismici impianti e recupero aree serbatoi pensili - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	20.000,00	-	-	20.000,00	88.773,64	-	-	88.773,64	68.773,64	343%	Nuovo ID microinterventi creato in sostituzione degli id specifici 2015RNHA0024 e 2015RNHA0025. Complessivamente l'importo pianificato per il 2021 sui due ID specifici era 20k€. il consuntivo risulta pari a 180 k€ in quanto sono attualmente in fase di adeguamento i seguenti pensili: area pensile Cattolica, Montalbano e S.Martino in Venti. La pianificazione economica inserita a POI per singolo anno risulta di larga massima; ogni anno vengono avviate le attività ritenute necessarie dal servizio, tenendo conto della complessità realizzativa di tali interventi
16	2017RNHA0005	Completamento della separazione della rete fognaria limitrofa a Via di Vittorio - II stralcio - (lotto2)	F	Coriano	Gestore	247.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	25.485,58	-	-	25.485,58	7.485,58	41%	Intervento in fase di progettazione definitiva e in linea con la pianificazione. Le tempistiche erano state ridefinite in relazione agli interventi già realizzati relativi al progetto del I stralcio (ID 2014RNHA0004) e al progetto I stralcio completamento (ID 2019RNHA0002)
17	2017RNHA0017	Adeguamento della fognatura nera (ponte di Viale Venezia)	F	Riccione	Gestore	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	2014RNHA0020	Adeg. sicurezza imp. dep. - RN	D	Opere Pluricomunali	Gestore	-	10.000,00	-	-	10.000,00	42.748,86	-	-	42.748,86	32.748,86	327%	conto cumulativo - maggiori esigenze di adeguamenti alla sicurezza rispetto alla pianificazione
19	2014RNHA0049	Rete di collegamento serbatoio Covignano	A	Rimini	Romagna Acque	3.361.625,00	490.000,00	-	490.000,00	-	120.385,46	-	120.385,46	-	369.614,54	-75%	Scostamento 2021 conseguente al prolungamento dell'iter autorizzativo con la polizia municipale per la gestione del cantiere. Esecuzione al 2022
20	2015RNHA0009	Telecontrollo e automazione impianti fog. RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	200.000,00	-	-	200.000,00	230.905,46	-	-	230.905,46	30.905,46	15%	
21	2015RNHA0005	Studio e primi interventi risan. Rio dell'Asse	F	Riccione	Gestore	375.000,00	19.000,00	-	-	19.000,00	6.021,68	-	-	6.021,68	12.978,32	-68%	Intervento in fase di progettazione definitiva. Scostamento 2021 legato al prolungamento delle attività autorizzative relative agli accordi bonari. In particolare si è reso necessario variare le opere a progetto al fine di evitare la procedura di esproprio
22	2020RNHA0003	Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica	D	Misano Adriatico	Gestore	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	2014RNHA0019	Distrett. reti acqua - RN ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	2020RNHA0008	Nuovi allacci/estensioni reti c/to cliente fognatura - RN ATO 9	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	300.000,00	300.000,00	-	-	498.329,78	486.709,00	0,00	11.620,78	198.329,78	66%	Conto cumulativo - i nuovi allacciamenti e le estensioni reti sono determinate dalle richieste dei clienti. Nel 2021 si è registrata una ripresa del mercato immobiliare e una conseguente maggiore richiesta di questi interventi
25	2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	-	-	-	-	1.014.966,75	-	-	1.014.966,75	1.014.966,75	100%	Conto cumulativo - scostamento 2021 legato all'assenza di importi pianificati a POI per l'attività di sostituzione massiva contatori conseguente al fatto che la valorizzazione di questo id verrà eseguita in occasione dell'aggiornamento di POI del 2022
26	2017RNHA0012	Riqualificazione del depuratore S.Savino Montecolombo	D	Monte Colombo	Gestore	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	2020RNHA0007	Nuovi allacci/estensioni reti/impianti di utenza c/to cliente acquedotto - RN - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	700.000,00	700.000,00	-	-	1.778.447,92	1.124.195,82	-	654.252,10	1.078.447,92	154%	Conto cumulativo - i nuovi allacciamenti e le estensioni reti sono determinate dalle richieste dei clienti. Nel 2021 si è registrata una ripresa del mercato immobiliare e una conseguente maggiore richiesta di questi interventi
28	2021RNHA0004	PSB - realizzazione vasca Rodella e condotte sottomarine	F	Rimini	NON DEFINITO	37.903.417,00	327.000,00	-	327.000,00	-	-	-	-	-	327.000,00	-100%	Intervento in fase di progettazione preliminare. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo al 31/12/2021 non era stato ancora sottoscritto, pertanto i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'accordo attuativo
29	2014RNHA0024	Ripristini asfalti fognatura - RN	F	Opere Pluricomunali	Gestore	-	200.000,00	-	-	200.000,00	189.833,53	-	-	189.833,53	10.166,47	-5%	
30	2021RNHA0010	Nuova rete fognaria in Via della Repubblica Località Sant'Andrea in Besanigo	F	Coriano	AMIR	350.000,00	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	-	-	28.000,00	-100%	Intervento in fase di progettazione definitiva. Lo scostamento 2021 è legato al fatto che l'accordo attuativo al 31/12/2021 non era stato ancora sottoscritto, pertanto i costi sostenuti verranno rendicontati nell'anno di sottoscrizione dell'accordo attuativo
31	2014RNHA0021	Manut. stra. imp. dep. - RN	D	Opere Pluricomunali	Gestore	-	1.370.000,00	-	-	1.370.000,00	2.003.112,84	-	-	2.003.112,84	633.112,84	46%	Conto cumulativo - maggiori esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione rispetto alla pianificazione
32	2015RNHA0014	Soanne risanamento scarico n. 5	F	Pennabilli	Gestore	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	2014RNHA0073	PSB - interventi di mitigazione del rischio idraulico nel capoluogo di Rimini - dorsale AUSA	F	Rimini	Gestore	9.734.797,00	68.000,00	-	-	68.000,00	90.124,47	-	-	90.124,47	22.124,47	32%	Scostamento 2021 dovuto a maggiori oneri per valutazioni geologiche e strutturali di dettaglio ed integrative rese necessarie
34	2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria sollevamento 1B	F	Rimini	Gestore	1.650.000,00	759.000,00	-	-	759.000,00	471.522,06	-	-	471.522,06	287.477,94	-37%	Intervento in fase realizzativa. in linea con la pianificazione prevista a POI. Scostamento 2021 legato all'avanzamento cantiere e fine lavori prevista in linea con pianificazione di POI
35	2014RNHA0076	Adeguamento fognatura mista in Via Pace	F	Santarcangelo di Romagna	Gestore	506.641,00	7.000,00	-	-	7.000,00	1.482,26	-	-	1.482,26	5.517,74	-78%	Scostamento 2021 conseguente al fatto che l'attività espropriativa è ancora in corso. Si prevede avvio dei lavori per il 2022

	Codice	Titolo	Servizio	Comune	Tipo Investimento	Importo progettuale	Pianificato 2021 - approvato con deliberazione del C.L. di Rimini n. 3 del				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021				Scostamento		
							Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Investimento di terzi pianificato 2021	Investimento gestore pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento di terzi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
119	2014RNHA0016	Manut. stra. imp. acquedotto - RN - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	Gestore	-	700.000,00	-	-	700.000,00	725.867,31	-	-	725.867,31	25.867,31	3%	
120	2015RNHA0002	PSB - riconversione dep. Marecchiese	D	Rimini	Romagna Acque	7.217.948,00	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	100%	Intervento in fase realizzativa. Scostamento 2021 dovuto al fatto che sono stati anticipati lavori previsti per le annualità 2022-2023
121	2017RNHA0030	Adeguamento depuratore Pennabilli Località Ponte Messa	D	Pennabilli	Gestore	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
122	2017RNHA0007	Nuova rete fognaria in Via della Repubblica Località Sant'Andrea in Besanigo	F	Coriano	Gestore	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							-	-	-	-	-	-	Investimento di terzi consuntivo 2021	-	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							24.222.467,16	1.098.000,00	6.831.919,16	16.292.548,00	29.694.367,65	3.260.422,36	7.110.500,31	19.323.444,98			
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							22.439.919,16	1.098.000,00	6.831.919,16	14.510.000,00	29.694.367,65	3.260.422,36	7.110.500,31	19.323.444,98	132%		



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Rimini

F.to Sante Rizieri

Il segretario verbalizzante

F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
