

CLMO/2015/8 del 23 novembre 2015

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi
realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito
APPROVAZIONE**

IL COORDINATORE

F.to Caterina Bagni

parere di regolarità tecnica

Il direttore

(F.to Ing. Vito Belladonna)

CLMO/2015/8

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.00 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8131 del 17 novembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI'	0,6622
BOMPORTO	Borghi Alberto	Sindaco	SI'	1,3444
CAMPOGALLIANO	Pederzini Chiara	Assessore	SI'	1,1971
CAMPOSANTO	Baldini Antonella	Sindaco	SI'	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	NO	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Vigarani Massimiliano	Assessore	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO	Lodi Flavio	Vicesindaco	SI'	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Costi Maria	Sindaco	SI'	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO			NO	0,5274
MARANELLO	Caselli Patrizia	Assessore	SI'	2,1548
MARANO SUL PANARO			NO	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Benatti Maino	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Guerzoni Giulio	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Nannetti Federica	Sindaco	NO	1,9843
NOVI DI MODENA			NO	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Iseppi Stefano	Assessore	SI'	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI'	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI'	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Gozzoli Gianfranco	Sindaco	SI'	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Silvestri Alberto	Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO	Pistoni Sonia	Assessore	SI'	4,9025

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2871
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA	Bonucchi Marco	Sindaco	SI'	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Vicesindaco	SI'	1,9704
SPILAMBERTO			NO	1,6242
VIGNOLA	Smeraldi Mauro	Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA	Balugani Pietro	Sindaco	SI'	0,7682
PROVINCIA DI MODENA			NO	10,0000

Presenti n. 22 pari a quote 66,7315

Assenti n. 26 pari a quote 33,2685

Sono presenti inoltre l'ing. Marco Grana Castagnetti, il dott. Pierluigi Maschietto, l'ing. Mauro Pacchioli e il dott. Mario Ori dello staff di Atersir.

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante e, richiamato l'o.d.g. proposto nella lettera di convocazione del Consiglio Locale "SII: approvazione del consuntivo investimenti SII 2014 presentato dai Gestori del Servizio", invita alla trattazione del seguente oggetto.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore AIMAG S.p.A.**

Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.

Proposta di integrazione del Piano di Ambito

APPROVAZIONE

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 1 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i gestori AIMAG S.p.A., HERA S.p.A. e SORGEAQUA s.r.l.;

- con deliberazione n. 27 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A.;
- con deliberazione n. 2 del 13 aprile 2015 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la "Revisione straordinaria del programma degli interventi del SII anni 2015-2017 per il gestore AIMAG S.p.A. e proposta di integrazione del Piano di ambito";
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.
- le succitate linee guida prevedono altresì che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto "Programma operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017", in atti al protocollo ATERSIR PG/2015/7785 del 4 novembre 2015, il gestore AIMAG S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, ma limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore AIMAG S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore AIMAG S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del Piano d'ambito approvato con deliberazione dell'assemblea dell'ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore AIMAG S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti.

Con:

voti favorevoli 22 per 66,7315 quote

astenuti 0

votazioni contrarie 0

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore AIMAG S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del Piano d'ambito approvato con deliberazione dell'assemblea dell'ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore AIMAG S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
Gestore: AIMAG s.p.a.**

5 novembre 2015

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.1 del 26 Marzo 2014, che il gestore AIMAG ha presentato in data 4 Novembre 2015 (prot. P.G./2015/0007785) come richiesto da ATERSIR in data 16 Luglio 2015 (prot. PG/2015/0004964).

PIANIFICATO 2014		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 7.515.604	-€ 715.425	€ 6.800.179	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 724.000	-€ 85.968	€ 638.032	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo netto escluso interventi post Terremoto 2012	€ 6.791.604	-€ 629.457	€ 6.162.147	Importo netto escluso interventi post Terremoto 2012
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 6.937.000	-€ 5.800.220	€ 1.136.780	Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 6.937.000	-€ 6.858.820	€ 78.180	Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo netto interventi post Terremoto 2012	€ 0	€ 1.058.600	€ 1.058.600	Importo netto interventi post Terremoto 2012
Importo Netto Complessivo Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 6.791.604	€ 429.143	€ 7.220.747	Importo Netto Complessivo a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come per il gestore AIMAG siano stati distinti gli investimenti in seguito al sisma del 2012 da tutti gli altri normalmente inclusi nella pianificazione; dal resoconto si nota come il gestore nel corso del 2014 abbia effettuato minori investimenti (€ 715.425) riguardanti gli interventi extra terremoto mentre per quanto riguarda gli interventi per il terremoto, è vero che il gestore anche in questo caso ha investito molto meno rispetto quanto pianificato ma è anche vero che rispetto a quanto avrebbe dovuto incassare come contributo non lo ha incassato, trovandosi quindi ad aver anticipato circa € 1.100.000 nel corso del 2014. A livello di bilancio complessivo il gestore AIMAG si trova quindi ad aver investito come importo netto € 429.143 in più rispetto a quanto programmato.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

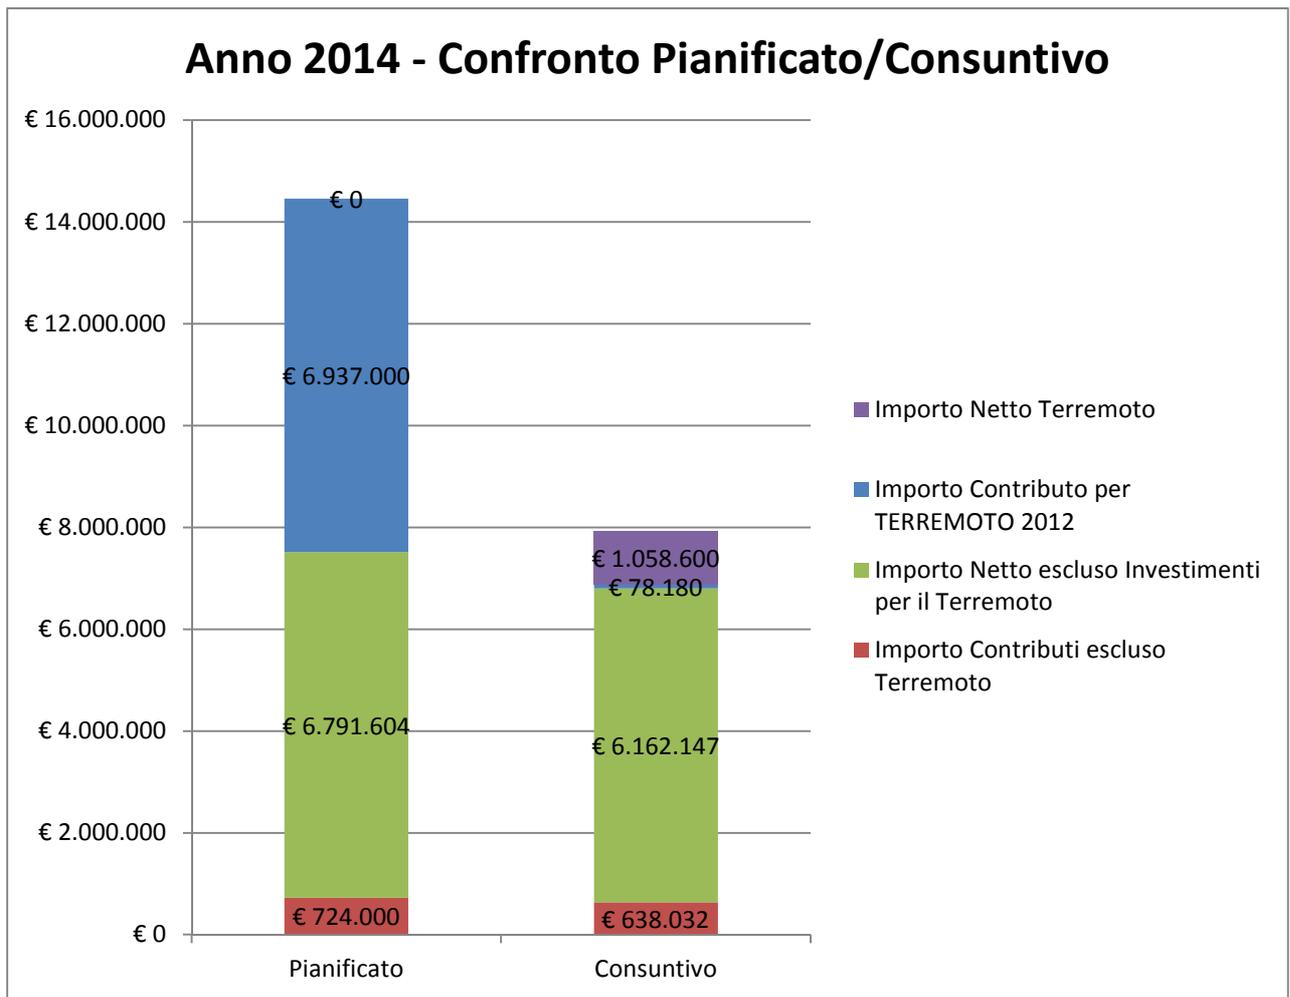


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014 (escluso gli interventi di Struttura): 62

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 60

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	8	€ 0	€ 825.297	4	2014MOAG0015, 2014MOAG0043, 2014MOAG0057, 2014MOAG0077	
Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	€ 253.871	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1	€ 21.044	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	38	€ 3.694.492	€ 10.001.307	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	16	€ 3.967.551	€ 3.626.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 8 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3) per un totale di circa 825 mila euro; per 4 di questi la giustificazione, che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento del progetto, non è stata ritenuta esaustiva e per tal motivo ATERSIR sta valutando quali provvedimenti assumere. In compenso però il gestore ha avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 5 interventi. Inoltre si può notare come rispetto ai 60 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 63% di questi (38 interventi) ha avuto uno sco-

stamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per tali interventi le giustificazioni del gestore sono state ritenute esaustive e non si intende assumere alcun provvedimento.

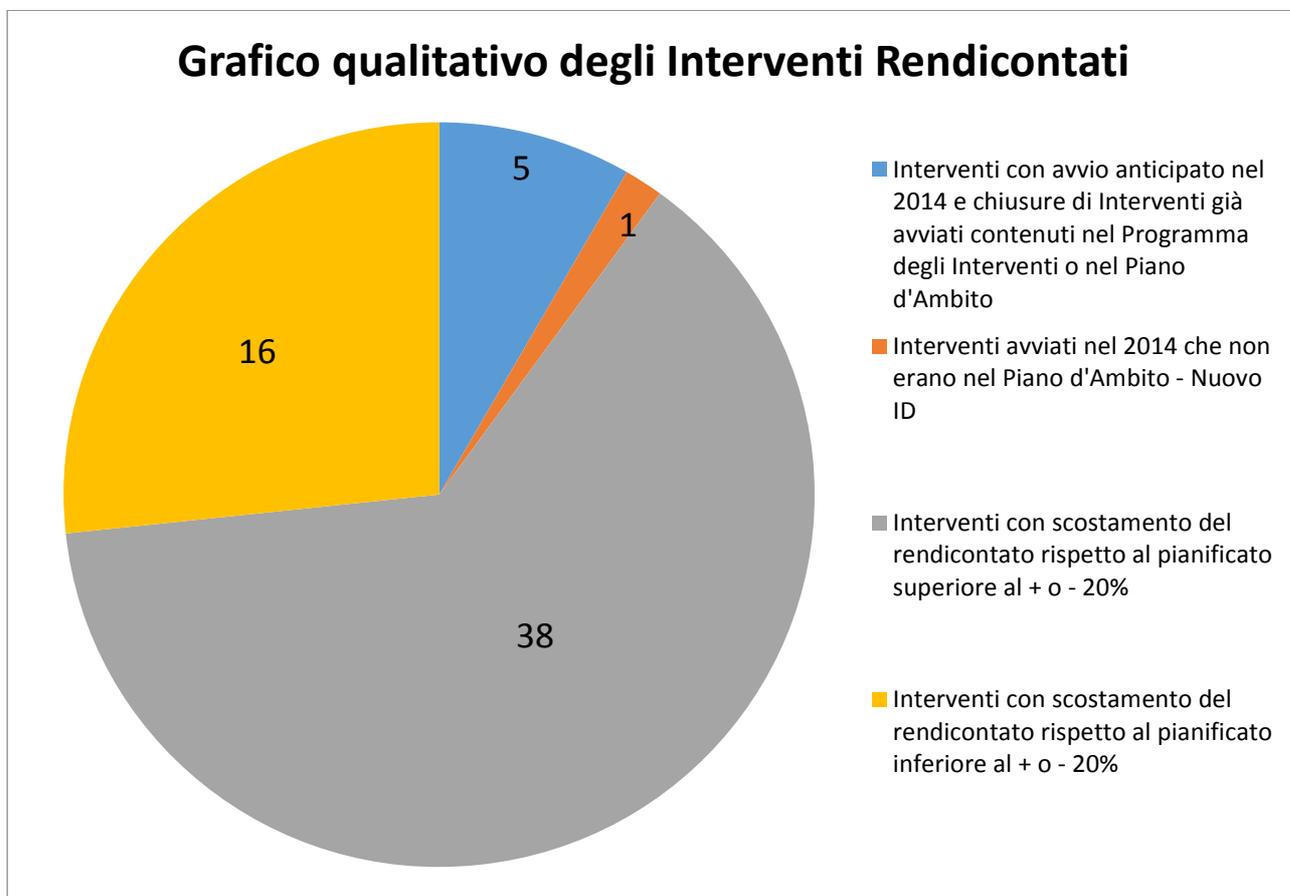


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014MOAG0004	Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario	F	Bomporto	101.297
2014MOAG0015	Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	F	Concordia sulla Secchia	120.000
2014MOAG0016	Collettore fognario via Grande a Concordia	F	Concordia sulla Secchia	9.000
2014MOAG0043	Protezione catodica adduttrici	A	Tutto il sottambito AIMAG	45.000
2014MOAG0044	Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	A	Tutto il sottambito AIMAG	20.000
2014MOAG0057	Acquisto terreno adiacente centrale acquedottistica di Cognento e realizzazione della viabilità.	A	Tutto il sottambito AIMAG	100.000
2014MOAG0058	Progetto Smart Metering	A	Tutto il sottambito AIMAG	130.000
2014MOAG0077	Rifacimento fognature	F	Tutto il sottambito AIMAG	300.000
			TOTALE	825.297

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

AIMAG SpA

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 4 Modena

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
NUOVO ID ATERSIR	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO EX ATO	DESCRIZIONE INTERVENTO (WBS)	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOAG0001	4047	Interventi per il ripristino della funzionalità delle componenti elettromeccaniche ed elettriche degli impianti di depurazione	D	Bastiglia	80.307	80.307		80.307	181.604	102.200	79.404	126%	Maggiori costi per messa in sicurezza dell'impianto
2014MOAG0002	2924	Risanamento superfici calcestruzzo ammalorate nel depuratore	D	Bomporto		45.000		45.000	20.566	-	20.566	-54%	Ridefinizione dell'area di intervento
2014MOAG0003	4026	Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina	F	Bomporto	120.000								
2014MOAG0004	4046	Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario	F	Bomporto	101.297	101.297		101.297				-100%	Costi contabilizzati in gestione corrente
2014MOAG0005	2926	Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano	F	Campogalliano		35.000		35.000	39.768	-	39.768	14%	
2014MOAG0006	2207	Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale	F	Carpi									
2014MOAG0007	2700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO	D	Carpi		45.000		45.000	158.201	-	158.201	252%	Introduzione di migliorie e nuove parti di impianti per obblighi normativi
2014MOAG0008	2931	Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di ossidazione nel depuratore del capoluogo	D	Carpi		90.000		90.000	71.684	-	71.684	-20%	
2014MOAG0009	2932	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel depuratore del capoluogo	D	Carpi		45.000		45.000	43.996	-	43.996	-2%	
2014MOAG0010	4027	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		Carpi		430.000		430.000	283.630	11.840	271.790	-34%	Minori esigenze rispetto al pianificato
2014MOAG0011	4028	Collettamento fognario Via Remesina	F	Carpi		275.000		275.000	443.850	-	443.850	61%	Maggiori costi per garantire condizioni di sicurezza all'interno dello scavo
2014MOAG0012	4029	Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione	D	Carpi		200.000		200.000	123.241	-	123.241	-38%	Parte di interventi posticipata ad anni successivi
2014MOAG0013	2936	Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di insufflazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo	D	Cavezzo									
2014MOAG0014	2654	COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE	F-D	Concordia sulla Secchia	640.000	100.000	100.000	0	3.842	-	3.842	-96%	Posticipato al 2015
2014MOAG0015	2743	Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	F	Concordia sulla Secchia	180.000	120.000	100.000	20.000				-100%	Posticipato al 2015
2014MOAG0016	2937	Collettore fognario via Grande a Concordia	F	Concordia sulla Secchia		9.000		9.000				-100%	Richiesta di posticipo da parte dell'Amministrazione comunale cofinanziatrice dell'opera
2014MOAG0017	4030	Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti	D	Concordia sulla Secchia		185.000		185.000	79.371	-	79.371	-57%	Parte di interventi posticipata ad anni successivi
2014MOAG0018	4031	Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta	F	Concordia sulla Secchia									
2014MOAG0019	2721	Collettamento fognario della trazione di Camurana al depuratore di Medolla	F	Medolla	180.000								
2014MOAG0020	2447	Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via Candia	F	Novi di Modena	272.000								
2014MOAG0021	2942	Potenziamento sistema di adduzione alla vasca sacchella	A	Novi di Modena									
2014MOAG0022	449	Costruzione fognatura a Ponte S.Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo	F	San Felice sul Panaro	1.629.744	180.000		180.000	47.544	-	47.544	-74%	Lavoro iniziato nella seconda parte dell'anno e posticipato negli anni successivi
2014MOAG0023	2202	Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	D	San Felice sul Panaro	850.000	90.000		90.000	1.568	-	1.568	-98%	Posticipato al 2015 in quanto non concluso iter di riconoscimento del Contributo Ministeriale previsto
2014MOAG0024	2214	Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	F	San Felice sul Panaro	480.000								
2014MOAG0025	2216	Collettamento fognario di Via Villa Gardè	F	San Felice sul Panaro	880.000	230.000		230.000	138.448	-	138.448	-40%	Minori costi sui materiali
2014MOAG0026	4033	Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice		San Felice sul Panaro									
2014MOAG0027	2945	Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino secchia	A	San Prospero		38.000		38.000	20.869	-	20.869	-45%	Risparmi in fase di esecuzione
2014MOAG0028	2905	Collettamento località Grande Rosa a Soliera	F	Soliera	110.000	110.000	55.000	55.000	107.642	50.000	57.642	-2%	
2014MOAG0029	2948	Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi	F	Soliera		45.000		45.000	57.357	-	57.357	27%	Sostituito un tratto più lungo di fognatura ammalorata
2014MOAG0030	4034	Estendimento fognature aree da servire in via Martiri Partigiani a Limidi di Soliera	F	Soliera									
2014MOAG0031	13	Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori	A	Tutto il sottambito AIMAG		610.000	370.000	240.000	577.873	407.332	170.541	-5%	
2014MOAG0032	2106	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	Tutto il sottambito AIMAG		359.000		359.000	431.426	-	431.426	20%	
2014MOAG0033	2108	Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari	F	Tutto il sottambito AIMAG		235.000		235.000	248.820	-	248.820	6%	
2014MOAG0034	2114	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	A	Tutto il sottambito AIMAG		70.000		70.000	77.194	-	77.194	10%	
2014MOAG0035	2116	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	A	Tutto il sottambito AIMAG		53.000		53.000	58.276	-	58.276	10%	

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
NUOVO ID ATERSIR	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO EX ATO	DESCRIZIONE INTERVENTO (WBS)	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOAG0036	2118	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	A	Tutto il sottambito AIMAG		60.000		60.000	65.915	-	65.915	10%	
2014MOAG0037	2119	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG	1.960.000	490.000		490.000	490.000		490.000	0%	
2014MOAG0038	2221	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG	196.693	88.000		88.000	60.309	-	60.309	-31%	Parte di interventi posticipata ad anni successivi
2014MOAG0039	2222	AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG	222.565	50.000		50.000	44.960	16.301	28.659	-10%	
2014MOAG0040	2459	Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG	60.000	18.000		18.000	24.678	-	24.678	37%	Maggiori studi di fattibilità
2014MOAG0041	2704	Manutenzione straordinaria adduttrici	A	Tutto il sottambito AIMAG		185.000		185.000	133.765	-	133.765	-28%	Minori esigenze rispetto al pianificato
2014MOAG0042	2705	Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	A	Tutto il sottambito AIMAG	570.000	45.000		45.000	29.134	-	29.134	-35%	Parte di interventi posticipata ad anni successivi
2014MOAG0043	2707	Protezione catodica adduttrici	A	Tutto il sottambito AIMAG		45.000		45.000				-100%	Intervento posticipato ad anni successivi
2014MOAG0044	2919	Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	A	Tutto il sottambito AIMAG	20.000	20.000		20.000				-100%	Contributo già liquidato nel 2013
2014MOAG0045	2949	Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo	A	Tutto il sottambito AIMAG		45.000		45.000	35.661	-	35.661	-21%	Risparmi ottenuti a seguito di indagini di mercato
2014MOAG0046	2953	Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti	A	Tutto il sottambito AIMAG									
2014MOAG0047	2957	Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri del Lavoro	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG		230.000		230.000	26.813	-	26.813	-88%	Eseguita solo progettazione, spostato al 2015
2014MOAG0048	2958	Potenziamento della dotazione del laboratorio	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG		35.000		35.000	56.207	-	56.207	61%	sostituite strumentazioni e apparecchiature obsolete
2014MOAG0049	2959	Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati)	D	Tutto il sottambito AIMAG		75.000		75.000	67.112	-	67.112	-11%	
2014MOAG0050	2960	Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG		29.000		29.000	25.961	-	25.961	-10%	
2014MOAG0051	2961	RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA	A	Tutto il sottambito AIMAG		1.500.000		1.500.000	1.801.363	50.359	1.751.004	20%	
2014MOAG0052	2962	Ripristino di asfalti	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG		230.000		230.000	244.032	-	244.032	6%	
2014MOAG0053	2963	Manutenzione straordinaria rete fognaria	F	Tutto il sottambito AIMAG		380.000		380.000	657.816	-	657.816	73%	Maggiori interventi di MS per sostituzione di reti ammalorate eseguite prevalentemente sul reticolo fognario di Carpi
2014MOAG0054	2965	INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI	A	Tutto il sottambito AIMAG		45.000		45.000	59.587	-	59.587	32%	Maggiori costi legati alla sperimentazione di nuove soluzioni
2014MOAG0055	4035	Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	A	Tutto il sottambito AIMAG		30.000		30.000	38.015	-	38.015	27%	Necessità di apparecchiature aggiuntive rispetto al progetto
2014MOAG0056	4036	Installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo	D	Tutto il sottambito AIMAG		45.000		45.000	35.089	-	35.089	-22%	economie nelle installazioni
2014MOAG0057	4038	Acquisto terreno adiacente centrale acquedottistica di Cognento e realizzazione della viabilità.	A	Tutto il sottambito AIMAG		100.000		100.000				-100%	Intervento ripianificato
2014MOAG0058	4039	Progetto Smart Metering	A	Tutto il sottambito AIMAG		130.000	99.000	31.000				-100%	Mancata partecipazione al bando
2014MOAG0059	4040	Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)	F	Tutto il sottambito AIMAG		200.000		200.000	52.980	-	52.980	-74%	Parte di interventi posticipata ad anni successivi
2014MOAG0060	4041	Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale acquedottistica di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume	A	Tutto il sottambito AIMAG									
2014MOAG0061	4042	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto	D	Tutto il sottambito AIMAG									
2014MOAG0062	4043	Efficientamento energetico impianti di depurazione	D	Tutto il sottambito AIMAG		75.000		75.000	41.438	-	41.438	-45%	posticipato al 2015 per la parte rimanente
2014MOAG0063	4044	Controllo Impianti	D	Tutto il sottambito AIMAG		75.000		75.000	61.529	-	61.529	-18%	
						8.005.604	724.000	7.281.604	7.269.135	638.032	6.631.103		

INTERVENTI NUOVI IN SEGUITO A VARIANTE APPROVATA					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
NUOVO ID ATERSIR	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO (WBS)	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOAG0078	ND	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua "ZONA BOSCO"	A	Camposanto	€ 350.000						-		
2014MOAG0079	ND	Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi	F	Carpi	€ 110.000						-		
2014MOAG0080	ND	Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi	F	Carpi	€ 135.000						-		
2014MOAG0081	ND	Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi	F	Carpi	€ 375.000						-		
2014MOAG0082	ND	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Tintori	A	Concordia sulla Secchia	€ 250.000						-		
2014MOAG0083	ND	Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di Rovereto	A	Novi di Modena							-		
2014MOAG0084	ND	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Villanova	A	San Felice sul Panaro	€ 345.000						-		
2014MOAG0085	ND	San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto	D	San Prospero	€ 345.000						-		
2014MOAG0086	ND	Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera	F	Soliera	€ 50.000						-		
2014MOAG0087	ND	Acquisto autobotte	D	Tutto il sottambito AIMAG	€ 340.000						-		
2014MOAG0088	ND	MIGLIORAMENTI E M.S. VARIE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	A	Tutto il sottambito AIMAG					21.044		21.044		Intervento non previsto a piano, reso necessario per guasti ad apparecchiature
2014MOAG0089	ND	Costi residui Servitu' per interventi ultimati	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG							-		
									21.044	0	21.044		

INTERVENTI IN SEGUITO AL SISMA 2012

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014						
	CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO (WBS)	SERVIZIO	COMUNE	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti		
2014MOAG0064	4001	Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	D	Tutto il sottambito AIMAG	580.000	500.000	500.000	0	37.888	-	37.888	-92%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0065	4012	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e installazione sistema di automazione	A	Tutto il sottambito AIMAG	120.000	350.000	350.000	0	15.677	-	15.677	-96%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0066	4013	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano	A	Tutto il sottambito AIMAG	150.000	350.000	350.000	0	10.393	-	10.393	-97%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0067	4017	Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, all'altezza del by-pass posto a nord di Camurana	A	Mirandola		2.000.000	2.000.000	0	3.102	-	3.102	-99,84%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0068	4018	Adeguamento centrale di Campogalliano	A	Tutto il sottambito AIMAG					7.769	-	7.769		Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0069	4019	Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento	A	Tutto il sottambito AIMAG		331.000	331.000	0	132.671	-	132.671	-60%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0070	4020	Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cognento	A	Tutto il sottambito AIMAG	449.900	250.000	250.000	0	17.410	-	17.410	-93%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0071	4021	Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via Faiani, nel Comune di Novi di Modena	A	Novi di Modena		300.000	300.000	0	1.640	-	1.640	-99%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0072	4022	By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - Canale dei Montanari	A	Modena		50.000	50.000	0	9.033	-	9.033	-82%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0073	4023	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Camposanto	A	Medolla		610.000	610.000	0	2.455	-	2.455	-99,60%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0074	4024	Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra il DN 700 in C.A. all'altezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	A	Modena		500.000	500.000	0	29.892	-	29.892	-94%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0075	4025	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di Bomporto	A	Bomporto		510.000	510.000	0	3.049	-	3.049	-99%	Spese di progettazione, iter di approvazione dei contributi ancora in corso		
2014MOAG0076	4016	Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente adeguamento di rete e impianti	A	Tutto il sottambito AIMAG	926.000	886.000	886.000	0	619.699	78.180	541.519	-30%	Minori esigenze rispetto al pianificato		
2014MOAG0077	4045	Rifacimento fognature	F	Tutto il sottambito AIMAG		300.000	300.000	0				-100%	Posticipato nel 2015		
	4003	Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi	A-F-D	Carpi					2.937	-	2.937		Completamento interventi anni precedenti		
	4006	Adeguamento strutturale Torre Mirandola	A	Mirandola					5.914	-	5.914		Completamento interventi anni precedenti		
	4011	Ripristino palazzina uffici via Bertuzza	A-F-D	Tutto il sottambito AIMAG					126.117	-	126.117		Completamento interventi anni precedenti		
	4015	Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in sostituzione	A	Tutto il sottambito AIMAG					111.133	-	111.133		Completamento interventi anni precedenti		
									6.937.000	6.937.000	0	1.136.780	78.180	1.058.600	1.058.600

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante
F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 09 dicembre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
