

CLMO/2021/4 del 26 aprile 2021

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019  
per il gestore SORGEAQUA s.r.l..**

IL COORDINATORE  
F.to Enrico Diacci

CLMO/2021/4

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0003847 del 20/04/2021, in seduta telematica.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Tomei Gian Domenico	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Zaniboni Monja	Sindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Gargano Giovanni	Sindaco	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Amico Maria Ernesto	Assessore	SI	1,4922
CAVEZZO	Trevisi Fabrizio	Assessore	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI	1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA	Lagazzi Iacopo	Sindaco	SI	0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Calciolari Alberto	Sindaco	SI	0,9382

MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE	DeLuca Matteo	Sindaco	SI	0,5880
NONANTOLA				1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Muzzarelli Gian Luca	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Tomei Gian Domenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO	Rocchi Giordano	Assessore	SI	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Pancaldi Fabrizio	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Casari Carlo	Sindaco	SI	0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Liberi Ugo	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Barani Elisa	Assessore	SI	1,2871
SERRAMAZZONI	Gorrieri Daniele	Assessore	SI	1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO	Costantini Umberto	Sindaco	SI	1,6242
VIGNOLA	Paragliola Anna	ViceSindaco	SI	3,0669
ZOCCA				0,7682

Presenti n. 32 pari a quote 85,445 Assenti n. 16 pari a quote 14,555

Riconosciuta la validità della seduta Enrico Diacci in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore SORGEAQUA s.r.l.**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

**premesse che:**

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito l’approvazione del Piano d’Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**considerato che:**

- con deliberazione n. 10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 45 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il gestore SORGEAQUA, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.8 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2019 risultano in linea con quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti;

con **voti** resi nelle forme di legge

**favorevoli** Comuni (32) per quote pari a 85,445,

**contrari** Comuni (0),

**astenuiti** Comune (0),

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore SORGEAQUA s.r.l. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: SORGEACQUA S.P.A.**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore SORGEACQUA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE SORGEACQUA	€ 579.842	€ 821.792	€ 241.950	42%
INVESTITORI TERZI	€ 0	€ 0	€ 0	
FONDO PERDUTO	€ 330.000	€ 186.887	-€ 143.113	-43%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 909.842</b>	<b>€ 1.008.679</b>	<b>€ 98.837</b>	<b>11%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore SORGEACQUA abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 11 %, all'interno della quale però pesa anche il mancato incasso di buona parte dei contributi a fondo perduto che inizialmente si era preventivato di incassare.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

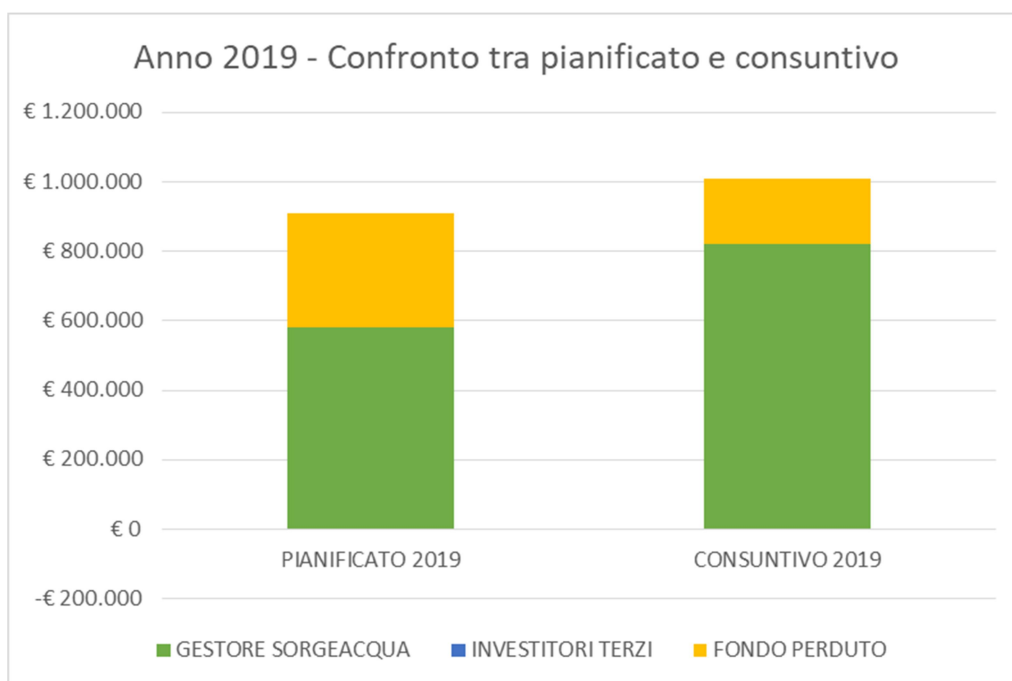


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

## ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 828.700	€ 674.846	-€ 153.854	-19%
DEPURAZIONE	€ 45.000	€ 170.781	€ 125.781	280%
FOGNATURA	€ 25.000	€ 85.433	€ 60.433	242%
STRUTTURA	€ 11.142	€ 77.619	€ 66.477	597%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 909.842</b>	<b>€ 1.008.679</b>	<b>€ 98.837</b>	<b>11%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza invece gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi <b>non avviati</b> (% di scostamento pari al -100%)	3	€ 140.000	€ 0
1b	Interventi <b>non avviati</b> dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	0	€ 0	€ 0
2a	Interventi con <b>avvio anticipato</b> nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	7	€ 0	€ 123.544
2b	<b>Chiusure di Interventi</b> già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	0	€ 0	€ 0
3	Interventi avviati nel 2019 che <b>non erano contenuti nel Piano d'Ambito</b> - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0
4	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>superiore al + o - 20%</b>	27	€ 629.842	€ 755.259
5	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>inferiore al + o - 20%</b>	2	€ 140.000	€ 129.876
	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>€ 909.842</b>	<b>€ 1.008.679</b>

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato



Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 36 interventi (categorie 2a, 4 e 5) e 3 interventi hanno un importo a consuntivo pari a zero (interventi non avviati);
- vi sono n.ro 7 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a).

Inoltre si può notare come rispetto ai 36 interventi che il gestore ha rendicontato, circa il 75 % di questi (27 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con un aumento totale degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 19% rispetto al pianificato.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
MANUTENZIONI	€ 428.000	€ 606.191	€ 178.191	42%
< 500.000	€ 470.700	€ 291.943	-€ 178.757	-38%
500k - 1.000k	€ 0	€ 6.354	€ 6.354	
1.000k - 2.000k	€ 0	€ 31.492	€ 31.492	
2.000k - 5.000k	€ 0	€ 0	€ 0	
>5.000k	€ 0	€ 0	€ 0	
STRUTTURA	€ 11.142	€ 72.699	€ 61.557	552%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 909.842</b>	<b>€ 1.008.679</b>	<b>€ 98.837</b>	<b>11%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che i maggiori scostamenti sono riconducibili a interventi con fascia di importo bassa, ovvero inferiore a 500.000 euro.

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straordinarie compensano quasi totalmente gli altri ritardi attribuibili ai singoli interventi.

## ALLEGATO 1

SORGEACQUA SpA  
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO SORGEACQUA 2019						
						PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	40.000,00	0		40.000,00	13.588,56	0		13.588,56	-26.411,44	-66	Parte dei lavori di sostituzione reti imputati all'id 2019MOSA0001
2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	20.000,00	0		20.000,00	35.375,41	0		35.375,41	15.375,41	76	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	6.750,00	0		6.750,00	8.828,41	0		8.828,41	2.078,41	30	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	0	0		0	15.503,16	12.402,53		3.100,63	15.503,16	100	Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori
2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC S	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	105.000,00	0		105.000,00	0	0		0	-105.000,00	-100	Intervento per cui è stata richiesta la sostituzione con interventi di rifacimento reti
2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	10.000,00	0		10.000,00	41.569,81	0		41.569,81	31.569,81	315	Necessità impreveduta per realizzazione nuovo pozzetto schiume e rifacimento linee ricircolo sedimentazione, dep. Crevalcore Capoluogo
2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Crevalcore	5.000,00	0		5.000,00	1.563,88	0		1.563,88	-3.436,12	-68	Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	30.000,00	0		30.000,00	10.213,71	0		10.213,71	-19.786,29	-65	Minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	20.000,00	0		20.000,00	34.619,06	0		34.619,06	14.619,06	73	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	6.750,00	0		6.750,00	22.220,15	0		22.220,15	15.470,15	229	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	0	0		0	15.988,43	12.790,44		3.197,99	15.988,43	100	Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori
2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	10.000,00	0		10.000,00	64.841,11	0		64.841,11	54.841,11	548	Realizzazione nuova ossidazione al dep. di Casoni + rifacimento linea di ossidazione e sostituzione piattelli al dep. Finale Capoluogo
2014MOSA0007	Adeguamento depuratore di Massa Finalese	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	5.000,00	0		5.000,00	3.150,52	0		3.150,52	-1.849,48	-36	Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014MOSA0006	Collegamento della fognatura della zona artigianale Crocetta al dep	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2014MOSA0028	Interventi urgenti per allagamenti a Finale Capoluogo	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Finale Emilia	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	20.000,00	0		20.000,00	38.965,57	0		38.965,57	18.965,57	94	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	6.750,00	0		6.750,00	12.507,14	0		12.507,14	5.757,14	85	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	20.000,00	0		20.000,00	0	0		0	-20.000,00	-100	Parte dei lavori di sostituzione reti imputati all'id 2019MOSA0001
2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	0	0		0	6.354,28	5.083,42		1.270,86	6.354,28	100	Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori
2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	0	0		0	17.218,44	0		17.218,44	17.218,44	100	Stesa dei tappeti d'usura eseguita nel 2019 per attesa assestamento scavi eseguiti nell'estate 2018
2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	10.000,00	0		10.000,00	22.731,96	0		22.731,96	12.731,96	127	Quote manutenzione straordinaria P.F. nuovo depuratore Campazzo
2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	5.000,00	0		5.000,00	17.347,14	0		17.347,14	12.347,14	246	Necessità impreveduta di sostituzione linea nera via Prati e linea nera in attraversamento a tangenziale
2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Nonantola	0	0		0	60.715,17	27.272,73		33.442,44	60.715,17	100	Lavoro pianificato per il 2016 ma eseguito nel 2019
2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0		10.000,00	13.063,09	0		13.063,09	3.063,09	30	Necessità impreveduta di sostituzione quadri elettrici pozzi 6 e 7
2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	28.000,00	0		28.000,00	154.634,68	0		154.634,68	126.634,68	452	Necessità impreveduta per: fpo nuovo gruppo elettrogeno Bagazzano, rifacimento parte impermeabilizzazione torre via Respighi Nonantola e torre via Borgo Sant'Agata B.se, fpo RTU SOFREL per TLC Finale Emilia, Bagazzano, Bevilacqua
2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	120.000,00	120.000,00		0	105.978,36	127.062,39		-21.084,03	-14.021,64	-11	Minor richiesta di esecuzione-modifica allacci d'utenza
2014MOSA0026	Demolizione pensile di via Mavora a Nonantola	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2014MOSA0029	Rinnovo della condotta di adduzione Crevalcore - Ravarino. 1° stralc	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0		20.000,00	23.897,32	0		23.897,32	3.897,32	19	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeacqua	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	303.700,00	210.000,00		93.700,00	98.109,74	0		98.109,74	-205.590,26	-67	Lavori in parte spostati al biennio 2020-21 per mancato ottenimento dei permessi di scavo
2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	STRUTTURA	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	0	0		0	4.920,48	0		4.920,48	4.920,48	100	Implementazione software gestionale CRM con i moduli per RQTI non completata nel 2018
2018MOSA0003	Investimenti di struttura	STRUTTURA	ATO4 - MO	Gestore	Opere Pluricomunali	11.142,00	0		11.142,00	72.698,91	0		72.698,91	61.556,91	552	Completamento implementazione software gestionale CRM con i moduli per TICS e TIBSI, implementazione nuovo software di gestione acquisti, gare e appalti, digitalizzazione e implementazione SJT reti SII
2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	15.000,00	0		15.000,00	8.628,06	0		8.628,06	-6.371,94	-42	Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	3.375,00	0		3.375,00	6.971,75	0		6.971,75	3.596,75	106	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	15.000,00	0		15.000,00	0	0		0	-15.000,00	-100	Lavori spostati al biennio 2020-21 per mancato ottenimento dei permessi di scavo
2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	0	0		0	2.844,07	2.275,26		568,81	2.844,07	100	Ritenute d'acconto del 50 su SAL già emessi sbloccate a seguito di saldo fine lavori
2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	10.000,00	0		10.000,00	21.449,31	0		21.449,31	11.449,31	114	Necessità impreveduta di sostituzione soffiante + compressore dep. Ravarino Capoluogo
2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Ravarino	5.000,00	0		5.000,00	1.972,88	0		1.972,88	-3.027,12	-60	Non rilevata la necessità di ulteriori sostituzioni
2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	15.000,00	0		15.000,00	9.570,13	0		9.570,13	-5.429,87	-36	Minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	3.375,00	0		3.375,00	24.140,41	0		24.140,41	20.765,41	615	Maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	20.000,00	0		20.000,00	12.844,02	0		12.844,02	-7.155,98	-35	Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	5.000,00	0		5.000,00	2.970,83	0		2.970,83	-2.029,17	-40	Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	5.000,00	0		5.000,00	683,09	0		683,09	-4.316,91	-86	Minor necessità di lavori rilevata in fase esecutiva
2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	FOGNATURA	ATO4 - MO	Gestore	Sant'Agata Bolognese	0	0		0	0	0		0	0,00	0	
<b>Totale</b>						<b>909.842</b>	<b>330.000</b>		<b>579.842</b>	<b>1.008.679</b>	<b>186.887</b>		<b>821.792</b>	<b>98.837</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 4 del 26 aprile 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore SORGEAQUA s.r.l..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 aprile 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena  
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 luglio 2021
