

CLRN/2017/8 del 8 novembre 2017

CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione ordinaria del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Stefano Giannini

CLRN/2017/8

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sede della Provincia di Rimini, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo AT/2017/6664 del 24/10/2017.

Assume la presidenza il Coordinatore Stefano Giannini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BELLARIA IGEA MARINA	Giovanni Giovanardi	Assessore	SI	5,0261
CASTELDELICI			NO	0,4582
CATTOLICA	Mariano Gennari	Sindaco	SI	4,5123
CORIANO	Michele Morri	Assessore	SI	2,8705
GEMMANO			NO	0,6362
MAIOLO			NO	0,5596
MISANO ADRIATICO	Stefano Giannini	Sindaco	SI	3,4304
MONDAINO			NO	0,7089
MONTEFIORE CONCA			NO	0,8987
MONTEGRIDOLFO			NO	0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO			NO	2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA	Ripa Mirco	Assessore	SI	2,0811
NOVAFELTRIA			NO	2,1793
PENNABILLI			NO	1,1056
POGGIO TORRIANA	Franco Antonini	Vicesindaco	SI	1,5948
RICCIONE	Lea Ermeti	Assessore	SI	9,0400
RIMINI	Gianluca Brasini	Assessore	SI	35,4884
SALUDECIO			NO	1,1084
SAN CLEMENTE	Mirna Cecchini	Sindaco	SI	1,6637
SAN GIOVANNI in MARIGNANO	Nicola Gabellini	Assessore	SI	2,6050
SAN LEO	Leonardo Bindi	Assessore	SI	1,0938
SANT'AGATA FELTRIA			NO	0,9201
SANTARCANGELO di ROMAGNA			NO	5,5920
TALAMELLO			NO	0,6130
VERUCCHIO	Roberto Sandon	Assessore	SI	2,8534
PROVINCIA di RIMINI			NO	10,0000

Presenti n. 12 72,2595 quote

Assenti n. 14 27,7404 quote

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione ordinaria del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato (POI), proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d'ambito;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata l'integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all' approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- Con deliberazione n.5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell'annualità 2016 ed introducendo per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le amministrazioni comunali variazioni;
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato una revisione delle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" (ex delibera CAMB 70/2014);
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI; con nota del 7 luglio 2017 HERA ha inoltre trasmesso una documentazione contenente, per ogni intervento compreso nella pianificazione, gli scostamenti tra i gli importi degli investimenti consuntivati nel 2016 ed i rispettivi valori di programmazione previsti nella medesima annualità.

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente (CAMB 12/2017) prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati.

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che relativamente al 2016 il gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati per un importo di 22.308.568€ rispetto all'importo di 34.669.641 previsto dal Programma degli interventi approvato;
- dai dati presentati è inoltre emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal POI aggiornato come da deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio locale di Rimini. Tuttavia è stato anticipato un intervento previsto in annualità successive (ID2015RNHA0024) per un importo complessivo pari a 7.076,00 €;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria condotta risulta necessario svolgere ulteriori approfondimenti su n° 8 interventi per i quali la nota giustificativa del gestore non è stata ritenuta esaustiva e che in esito a detti approfondimenti ATERSIR valuterà quali provvedimenti assumere nei confronti del gestore;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione di un intervento come sopraindicato) nel corso dell'anno 2016, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2016, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;
- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 11 (quote 58,9468), con voti contrari n. 0, astenuti n.2 Comuni di Riccione e Bellaria (quote 14,0661);

DELIBERA

1. di prendere atto della modifica apportata dal Gestore nel corso dell'anno 2016 (anticipazione di un intervento di cui in premessa), che comporta una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2016, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere i necessari approfondimenti sugli 8 interventi, citati nell'allegato 1, sui quali le note giustificative del gestore non sono state ritenute esaustive, per la valutazione dei provvedimenti da assumere;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2016**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RIMINI**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Programma operativo degli interventi (POI) e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

	PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 29,384,194	-€ 9,815,391	€ 19,568,803	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 10,510,000	-€ 8,767,290	€ 1,742,710	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 18,874,194	-€ 1,048,101	€ 17,826,093	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 5,285,447	-€ 2,545,682	€ 2,739,765	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 34,669,641	-€ 12,361,073	€ 22,308,568	Totale consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 35 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti inferiori per circa l'5,6 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.

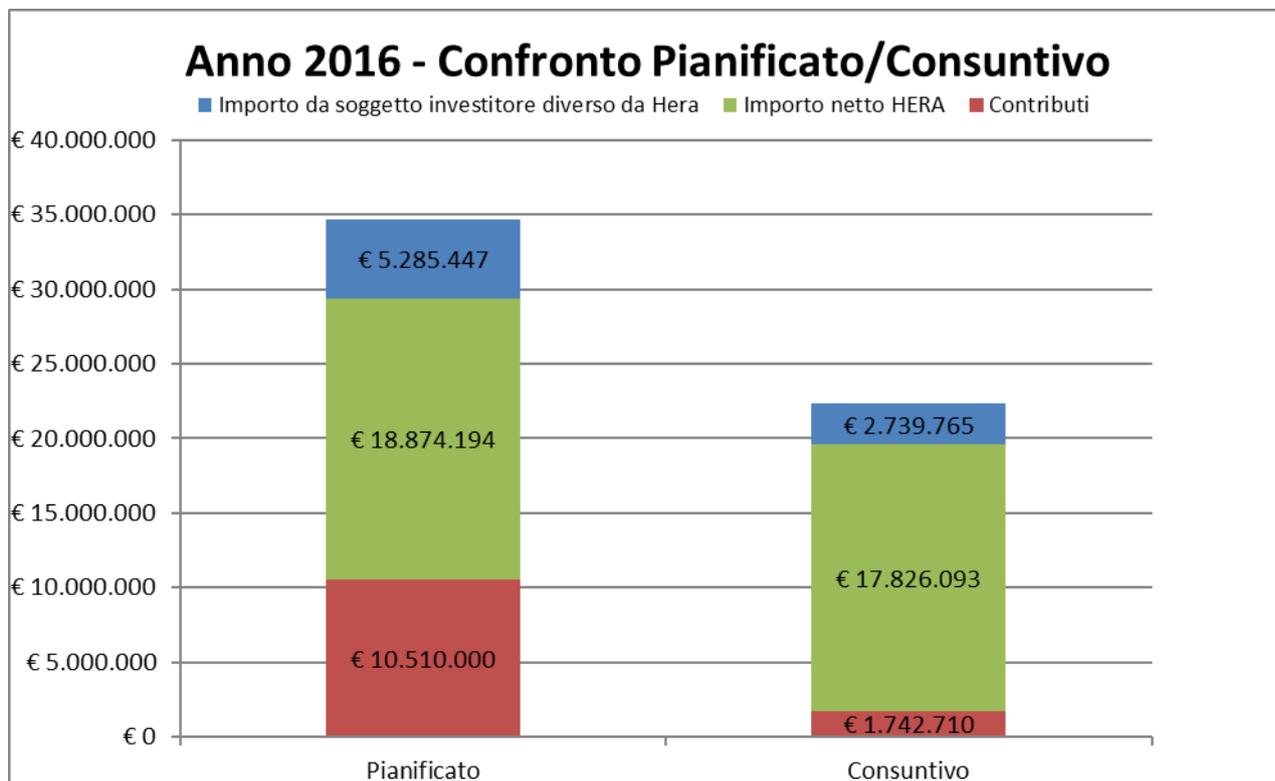


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2016 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2016*): 77

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 57

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	26	€ 0	€ 918.000	2	2014RNHA0003, 2015RNHA0015
					2 *	2014RNHA0011, 2015RNHA0011
2	Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	€ 514.916	€ 0	0	
3	Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0	
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	38	€ 13.884.004	€ 25.614.051	3	2014RNHA0010, 2014RNHA0044, 2014RNHA0045
					1 *	2015RNHA0013
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato	14	€ 7.909.647	€ 8.137.590	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	
* Interventi con note giustificative che propongono modifiche unilaterali della programmazione e per i quali si richiede approfondimento. La programmazione potrà essere variata solo con delibera del C.L.						

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2016 n.ro 26 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- vi sono stati n.ro 5 interventi con avvio anticipato o chiusure di interventi già contenuti nel Programma operativo degli interventi; in particolare di questi solo 1 (ID 2015RNHA0024 RECUP.AREE SERB.PENSILI DISMESSI RN-ATO9) rappresenta un intervento anticipato rispetto al POI per un importo di € 7.076,00;
- vi sono n.ro 8 interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non è stata ritenuta esaustiva e per le quali ATERSIR sta valutando quale provvedimento assumere.

Inoltre si può notare come rispetto ai 56 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 68 % di questi (38 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 46 % rispetto al pianificato.

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

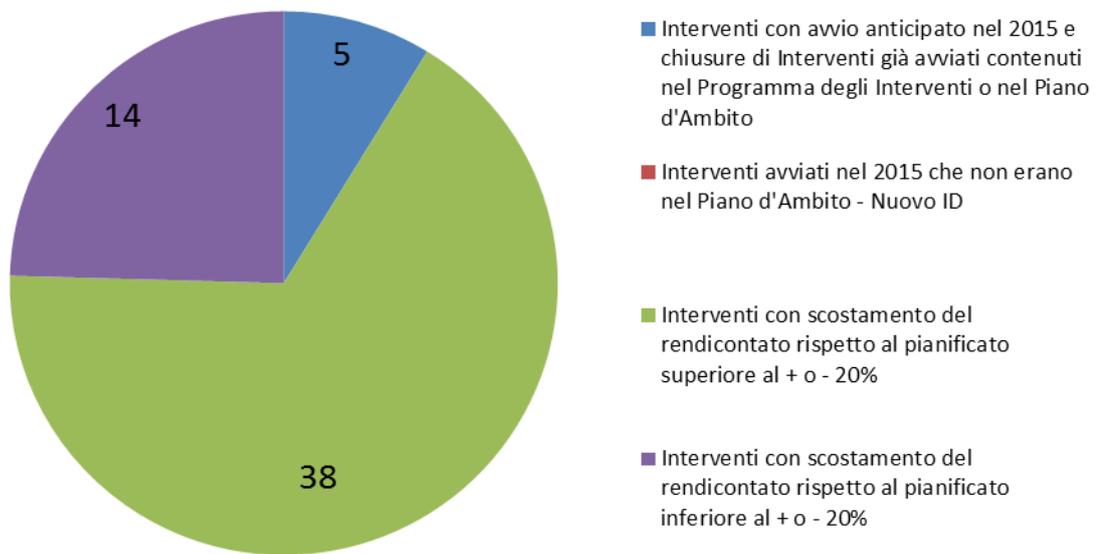


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Cattolica	20,000
							80,000
2014RNHA0006	NUOVO COLLET. LOCALITA BOSCO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Gemmano	10,000
2014RNHA0011	COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Novafeltria	10,000
							30,000
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10,000
2014RNHA0083	ADEG. ATTRAVERS. FERROVIARI - RN - ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10,000
							100,000
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC. 3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Monte Colombo	25,000
2015RNHA0011	MONTESCUDO.ADEG.SCARICO N.RO 2 - MONTESCUDO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Montescudo	10,000
2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Novafeltria	10,000
2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Pennabilli	10,000
2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Poggio Torriana	20,000
2015RNHA0016	SCARICO N.RO 94 - LOCALITÀ GROTTA ROSSA - RIMINI	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	10,000
2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI - (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	10,000
2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST - (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	San Leo	10,000
2015RNHA0001	RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	21,000
2014RNHA0079	NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA SC 3 E 9	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Poggio Torriana	20,000
							37,000
2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE II STR	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	10,000
2014RNHA0057	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Rimini	10,000
							15,000
2014RNHA0058	PSB-REAL. VASCA RODELLA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	15,000
2014RNHA0073	PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	15,000
2014RNHA0074	DEVIAZ. RETE FOG V.GIOVE RIMINI	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	50,000
2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	90,000
2015RNHA0006	RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	15,000
2014RNHA0075	POT. RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	50,000
2014RNHA0077	NUOVA FN V.MANGANETTO A SANTARCANGELO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	100,000
							50,000
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE, PALAZZINA)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	100,000
NON DEFINIBILE	ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI- GESTORE (ALL. 2)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	100,000
							918,000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%

ALLEGATO

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2016 Bacino Ex-ATO 9 Rimini

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIA RICCIONE	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	193.563	0	193.563	52.208	0	52.208	-141.355	-73%	ECONOMIE SULLA PREVISIONE DI SPESA 2016
2014RNHA0061	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN-I*STR-II*LOT	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	2.100.103	0	2.100.103	1.209.544	0	1.209.544	-890.559	-42%	ECONOMIE SULLA PREVISIONE DI SPESA 2016
2015RNHA0020	COLLETTAMENTO VIA MELITO, SIRTORI, TEANO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Bellaria Igea Marina	0	0	0	0	0	0	0		
2015RNHA0021	COLLETTAMENTO VIA ONOFRI	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Bellaria Igea Marina	0	0	0	0	0	0	0		
2014RNHA0001	ADEG. E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Cattolica	408.000	0	408.000	531.140	0	531.140	123.140	30%	VARIANTE MIGLIORATIVA (STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, INSERIMENTO INVERTER) NECESSITÀ DI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE PER LA CORRETTA MESSA A PUNTO DEL PROCESSO, EMERSE DURANTE LE PROVE FUNZIONALI DI COLLAUDO
2015RNHA0022	ADEG. E RISTRUTTURAZIONE DEP. CATTOLICA - SIS	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cattolica	0	0	0	1.900	0	0	1.900		ULTIME ATTIVITÀ LEGATE ALLA CHIUSURA CONTABILE
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Cattolica	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	AVVIO DI PROGETTAZIONE NEL 2017, REALIZZAZIONE PROGRAMMATA AL 2018-2019.
2014RNHA0002	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. CATTOLICA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Cattolica	560.000	0	560.000	203.073	0	203.073	-356.927	-64%	RITARDO AVVIO LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA, RECUPERATO NEL CORSO DEL TEMPO CONTRATTUALE
2014RNHA0005	COSTR.FOGNATURA LUNGO V.MULAZZANO (SC.3)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Coriano	856.000	-515.000	341.000	42.636	0	42.636	-813.364	-95%	CANTIERE NON AVVIATO NEL 2015-2016 PER IL VERIFICARSI DI FRANE. NEL 2016 E' STATA COMPLETATA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE. REALIZZAZIONE DELL'OPERA NEL 2017.
2014RNHA0004	SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Coriano	0	0	0	21.342	0	0	21.342		SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (NECESSITA' DI PARERE ATERSIR) E PER ESECUZIONE BOB
2014RNHA0006	NUOVO COLLET. LOCALITA BOSCO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Gemmano	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	-100%	ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI APPROVAZIONE, IN QUANTO INTERVENTO ECONOMICAMENTE NON SOSTENIBILE, STIMA 200K€ PER COLLETTAMENTO SOLE 6 UNITA' (FUORI AGGLOMERATO).
2014RNHA0007	COLLET.FOGNA NERA DA V.S.FELICE A M.CONCA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Montefiore Conca	0	0	0	0	0	0	0		
2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N° 4-5-6-7 MONTESCUDO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Montescudo	1.038.000	-512.000	526.000	531.681	0	531.681	-506.319	-49%	SLITTAMENTO LAVORI PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE.
2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Novafeltria	140.000	0	140.000	17.545	0	17.545	-122.455	-87%	RALLENTAMENTI CAUSATI DALL'ITER AUTORIZZATIVO. RITARDI DESTINATI AD INCREMENTARE ALLA LUCE DELLA RECENTE EVIDENZA DELLA NECESSITÀ DI ESPROPRIARE PER FAR FRONTE ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI
2014RNHA0011	COMPLET.RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Novafeltria	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	RIPROGRAMMATA AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI VERIFICA/RIPERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI.
2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	460.000	0	460.000	480.908	0	480.908	20.908	5%	
2014RNHA0081	SOST. CTR PARI CALIBRO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	95.000	0	95.000	106.789	0	106.789	11.789	12%	
2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	170.000	0	170.000	168.191	0	168.191	-1.809	-1%	
2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.200.000	0	1.200.000	1.114.062	0	1.114.062	-85.938	-7%	
2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.175.000	0	1.175.000	1.439.468	0	1.439.468	264.468	23%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	-100%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	75.000	0	75.000	90.396	0	90.396	15.396	21%	
2014RNHA0083	ADEG. ATTRAVERS. FERROVIARI - RN - ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. NON MANIFESTATATISI NECESSITA' NEL 2016
2014RNHA0084	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. ACQ RN	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	80.000	0	80.000	114.843	0	114.843	34.843	44%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	75.000	0	75.000	66.391	0	66.391	-8.609	-11%	
2014RNHA0021	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	1.000.000	0	1.000.000	1.303.278	-25.302	1.277.975	303.278	30%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2015RNHA0023	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	30.054	0	30.054	20.054	201%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0023	MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	450.000	0	450.000	509.002	0	509.002	59.002	13%	
2014RNHA0022	MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	355.000	0	355.000	585.021	0	585.021	230.021	65%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	50.000	0	50.000	62.409	0	62.409	12.409	25%	
2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI - RN	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	500.000	0	500.000	511.859	0	511.859	11.859	2%	
2015RNHA0009	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOG. RN	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	CUMULATIVO	Opere Pluricomunali	50.000	0	50.000	209.245	0	209.245	159.245	318%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014RNHA0035	ADEG.SC.(72A,72B)COLLETT.DEP.A CERASOLO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Coriano	0	0	0	0	0	0	0		
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Monte Colombo	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NEL 2016 NON VI ERANO I PRESUPPOSTI PER LO SVILUPPO URBANISTICO INIZIALMENTE IPOTIZZATO; LO SCARICO 3 SARA' ADEGUATO CON UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCO DI CIRCA 80 AE, RIMANDANDO SE NECESSARIO L'EVENTUALE COLLETTAMENTO IN FUNZIONE DELL'ESITO DELLO SVILUPPO URBANISTICO. QUESTA NUOVA SCELTA PROGETTUALE E' STATA GIA' CONDIVISA CON ATERSIR.
2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 - MONTESCUDO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Montescudo	25.000	0	25.000	0	0	0	-25.000	-100%	LAVORO SOSPESO IN ATTESA DI VALUTAZIONI SE È POSSIBILE ESEGUIRLO CON I TEMPI DETTATI DALLA DGR 201 CONSIDERATO L'AGGLOMERATO <200 AE
2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N.RO 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Novafeltria	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024. L'INTERVENTO PERTANTO E' STATO POSPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2015RNHA0013	ATTIVAZIONE COLLETTORE MONDAINO-SALUDECIO-MONTEGRIDOLFO (SALUDECIO SC. N. 1,2,6,7,8,9,11,12,19; MONTEGRIDOLFO SC. N. 1,2,3,4,5,6,7,8; MONDAINO SCARICHI 1,4,6,7)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere pluricomunali	160.000	0	160.000	33.080	0	33.080	-126.920	-79%	IL CONSUNTIVO 2016 È RELATIVO AL SOLO SCARICO 6 MONDAINO, I CUI LAVORI SI CONCLUDERANNO NEL 2017. L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI NUMERO 1-4 MONEGRIDOLFO RIGUARDANO AGGLOMERATI DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E (OVVERO ZONE FUORI PERIMETRO DELL'AGGLOMERATO), PERTANTO IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024.
2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Pennabilli	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024, QUINDI L'ID E' STATO POSTICIPATO FUORI ARCO PIANO 2016-2021.
2014RNHA0037	NUOVA FOG.E IMP.SOLL.V.ORSOLETO(P.BERNI)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Poggio Torriana	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Poggio Torriana	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	NECESSARI APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA PERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI. IN PARTICOLARE SULLO SCARICO DI CA MAGRINO LE TEMPISTICHE SONO LEGATE ALLA RISOLUZIONE DEL CONTENZIOSO TRA PRIVATI.
2014RNHA0038	REAL. FITODEPURAZIONE BORGONUOVO	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015RNHA0016	SCARICO N.RO 94 - LOCALITÀ GROTTA ROSSA - RIMINI	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	NEL 2016 EFFETTUATE SOLO VALUTAZIONI DI FATTIBILITÀ PER VALUTARE MEGLIO LA SOLUZIONE: PROGETTAZIONE AL 2017
2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI - (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UNA LOCALITÀ ATTUALMENTE NON TRACCIATA COME AGGLOMERATO NELLA DGR 201/2016. LA LOCALITÀ HA UN DIMENSIONAMENTO INFERIORE A 200 A.E. L'INTERVENTO PERTANTO E' STATO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.
2014RNHA0041	ADEG.SC.(4,18)CON NUOVO DEP.A S.ANSOVINO	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Saludecio	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 9 TORELLO EST - (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	San Leo	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RIGUARDA UN AGGLOMERATO DI CONSISTENZA MINORE DI 200 A.E. PER CUI SECONDO LA DGR 201/2016 I TEMPI DI ADEGUAMENTO PREVEDONO DI TERMINARE LA FASE DI PROGETTAZIONE ENTRO IL 2024, QUINDI L'ID E' STATO POSTICIPATO FUORI ARCO PIANO 2016-2020.
2014RNHA0043	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 VERUCCHIO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Verucchio	390.000	0	390.000	26.551	0	26.551	-363.449	-93%	SLITTAMENTO TEMPI PER RICHIESTE DI INTEGRAZIONI PROGETTUALI DURANTE ITER AUTORIZZATIVO.
2014RNHA0042	ADEG.SCARICO 31-PIEVE CORENA VERUCCHIO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Verucchio	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014RNHA0044	COMPLET.COLL.FOQN.V.ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Morciano di Romagna	140.000	0	0	11.242	0	0	-128.758	-92%	SVILUPPO PROGETTAZIONE RALLENTATO PER DIFFICOLTÀ LEGATE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO.
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Saludecio	49.000	0	0	2.752	0	0	-46.248	-94%	SLITTAMENTO PER ALLUNGAMENTO ANOMALO TEMPI APPROVAZIONE COMUNE
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Saludecio	231.000	0	0	17.079	0	0	-213.921	-93%	POSTICIPO INTERVENTO DI UNA ANNUALITÀ A SEGUITO DELLE TEMPISTICHE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE CON AMIR.
2014RNHA0046	NUOVA FOG NERA V.DOGANA ICS 38 VERUCCHIO	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Verucchio	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014RNHA0013	DISM.DEP.PONTES.M.MADDALENA E COLL.FOQNA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	23.496	0	23.496	-76.504	-77%	SLITTAMENTO PER NECESSITÀ DI SVILUPPARE VARIANTE PROGETTUALE (REALIZZAZIONE ARGINATURA PRESCRITTA DA AUTORITÀ DI BACINO).
2015RNHA0001	RIORDINO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-100%	SLITTAMENTO PER NECESSITÀ RASF (COMMITTENTE DEL PROGETTO) DI RICHIEDERE NUOVO PDC IN QUANTO SCADUTO.
2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE. SIST. ACQ. SENATELLO	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	10.000	0	10.000	3.322	0	3.322	-6.678	-67%	
2014RNHA0079	NUOVA COLLEG. CENTRO STORICO DI TORRIANA SC 3 E 9	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Poggio Torriana	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	INTERVENTO CONCLUSO. INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITÀ ANTE 2013 , GLI ULTERIORI ADEGUAMENTI SU TORRIANA PROSEGUONO ATTRAVERSO L' ID "2015RNHA0015". QUESTO ID DEVE ESSERE CHIUSO E PERTANTO L'IMPORTO 2016 NON E' STATO UTILIZZATO
2014RNHA0047	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE I STR	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	2.026.000	0	2.026.000	1.734.871	0	1.734.871	-291.129	-14%	
2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP RICCIONE II STR	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	37.000	0	37.000	0	0	0	-37.000	-100%	RIPIANIFICAZIONE AVVIO PROGETTAZIONE INTERVENTO PER AVERE EVIDENZA DEGLI EFFETTI DEL PRIMO STRALCIO SU UN PERIODO SIGNIFICATIVO DI FUNZIONAMENTO E CONTESTUALE ATTESA DEGLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI SULLA RETE (IN PARTICOLARE EFFETTI ORDINANZE VERSO I PRIVATI).
2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN.. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	190.000	0	190.000	1.063	0	1.063	-188.937	-99%	VERIFICHE PROPEDEUTICHE IN CORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NON FINALIZZATE NEL 2016).
2014RNHA0050	ESTENSIONE VETTORE DI VIA ROMA LATO SUD	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014RNHA0049	RETE DI COLL. SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Rimini	1.030.000	0	0	18.290	0	0	-1.011.710	-98%	RALLENTAMENTO PER NECESSITÀ DI DIVERSE MODIFICHE PROGETTUALI AL PROGETTO RASF (MAGGIORI COSTI, ADEGUAMENTO A NUOVE NORMATIVE...).
2014RNHA0080	NUOVA ADDUT. CORPOLÒ-VILLA VERUCCHIO	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	0	0	0	2.276	-89.602	-87.326	2.276		INTERVENTO CONCLUSO: INCASSATO CONTRIBUTO PUBBLICO E COMPLETATA LA CONSUNTIVAZIONE ECONOMICA.
2015RNHA0002	PSB-RICONVERSIONE DEP.MARECCHIESE	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Rimini	2.399.691	0	0	1.328.077	0	0	-1.071.614	-45%	RITARDI CAUSATI DA PROBLEMATICHE SULLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE DA RECUPERARE A VASCHE DI LAMINAZIONE NON PREVEDIBILI, CHE HANNO RICHIESTO LO STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NON PREVISTI (RIPROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE CAUSA IMPREVISTI).
2014RNHA0052	PSB-RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Rimini	254.756	0	0	936.830	0	0	682.074	268%	LO SCOSTAMENTO È DA IMPUTARE A RENDICONTAZIONI CONTABILI DELL'AVANZAMENTO LAVORI IN PARTE SHIFATE DAL 2015 AL 2016.
2014RNHA0057	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I	FOGNATURA	ATO 9 - RN	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Rimini	10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-100%	ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, I CONSUNTIVI SARANNO RICOMPRESI NELL'ANNO RELATIVO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO.
2014RNHA0068	PSB-REAL VASCA COLONNELLA II	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	50.000	0	50.000	33.970	0	33.970	-16.030	-32%	
2014RNHA0058	PSB-REAL. VASCA RODELLA	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Rimini	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000	-100%	IN CORSO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI SISTEMA CHE COMPRENDE LA ZONA SUD DI RIMINI, L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE POTRÀ PARTIRE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTERA ZONA SUD DI RIMINI. FORMULATE DIVERSE IPOTESI, SOTTOPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2016			CONSUNTIVO HERA 2016					
							PIANO ATERSIR 2016 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2016 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2016 INV. NETTI	CONS 2016 INV. LORDI	CONS 2016 CONTRIBUTI	CONS 2016 INV. NETTI	SCOSTAMENTO	% SCOSTA MENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2016
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE, PALAZZINA)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Santarcangelo di R.	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	ID RELATIVO SOLO AGLI INTERVENTI SULLE VIE SATURNO, MARTE, DELLA PACE E PALAZZINA. GLI ALTRI INTERVENTI GIA' SEGNALATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI A V. RIGHI, VIA FLEMING, FRANKLING E DA VINCI SONO STATI TRACCIATI ATTRAVERSO UN NUOVO ID "ADEG.V.RIGHI,DA VINCI,FRANKLIN,FLAMING". MENTRE L'INTERVENTO RELATIVO A VIA BALDUCCIA - ANCORA IN FASE DI VALUTAZIONE- E' STATO RICOMPRESO ALL'INTERNO DEL NUOVO ID ARSI "OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DI SANTARCANGELO".
2015RNHA0024	RECUP.AREE SERB.PENSILI DISMESSI RN-ATO9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	0	0	0	7.076	0	7.076	7.076		ANTICIPATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI ANNI PIANIFICATI (TENENDO CONTO DEI TEMPI AUTORIZZATIVI).
2015RNHA0025	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ RN-ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	0	0	0	0	0	0	0		
NON DEFINIBILE	ADEG. DEGLI SCARICHI DI AGGLOMERATI- GESTORE (ALL. 2)	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	VOCE GENERICA A CUI NON CORRISPONDO ID
2016RNHA0001	SISTEMA DI AUTOMAZIONE E GESTIONE DEL CICLO AZOTO DEL DEPURATORE DI RICCIONE LINEA 2	DEPURAZIONE	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Riccione	0	0	0	0	0	0	0		
2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	FOGNATURA	ATO 9 - RN	HERA	SPECIFICO	Opere Pluricomunali	20.000	0	20.000	60.806	0	60.806	40.806	204%	INTENSIFICATA L'ATTIVITÀ DEI RILIEVI IN VISTA DELLA GARA DEL SII DI RIMINI
							34.669.641	-10.510.000	18.874.194	22.308.568	-1.742.710	17.826.093	-12.361.073		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 8 del 8 novembre 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione ordinaria del Programma Operativo degli interventi anno 2016 e presa d'atto del consuntivo 2016 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 8 novembre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Stefano Giannini

Il segretario verbalizzante
F.to Ing. Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna 8 gennaio 2018
