

CLPC/2023/9 del 24 novembre 2023

**CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020 – 2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

IL COORDINATORE  
F.to Franco Albertini

CLPC/2023/9

### CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

L'anno **2023** il giorno **24** del mese di **novembre** alle ore **9.00** si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0011780 del 16/11/2023, in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Franco Albertini.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO	Cigalini Maurizio	Sindaco	SI	0,7586
ALSENO	Zucchi Davide	Sindaco	SI	1,5304
ALTA VAL TIDONE	Albertini Franco	Sindaco	SI	1,0225
BESENZONE				0,4630
BETTOLA	Negri Paolo	Sindaco	SI	0,9358
BOBBIO	Pasquali Roberto	Sindaco	SI	1,1649
BORGONOVO	Franzini Fabrizio	Assessore	SI	2,4771
CADEO				1,8990
CALENDASCO				0,8816
CAORSO	Gandolfi Stefano	Assessore	SI	1,5335
CARPANETO	Arfani Andrea	Sindaco	SI	2,3681
CASTEL S. GIOVANNI	Bollati Massimo	Assessore	SI	4,2090
CASTELL'ARQUATO				1,4996
CASTELVETRO P.NO				1,6893
CERIGNALE	Pizzaghi Fausta	Sindaco	SI	0,2290
COLI				0,4305
CORTEBRUGNATELLA	Bertonazzi Renato	Sindaco	SI	0,3474
CORTEMAGGIORE				1,5247
FARINI				0,5004
FERRIERE				0,5138
FIORENZUOLA D'ARDA	Gandolfi Romeo	Sindaco	SI	4,4361

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GAZZOLA	Maserati Simone	Sindaco	SI	0,7937
GOSSOLENGO	Balestrieri Andrea	Sindaco	SI	1,8234
GRAGNANO T.SE				1,4879
GROPPARELLO				0,7977
LUGAGNANO				1,3004
MONTICELLI D'ONG.	Distante Gimmi	Sindaco	SI	1,6437
MORFASSO	Calestani Paolo	Sindaco	SI	0,4453
OTTONE	Girometta Lucia	Vice Sindaco	SI	0,3221
PIACENZA	Bongiorni Matteo	Assessore	SI	29,5559
PIANELLO				0,8148
PIOZZANO				0,3611
PODENZANO	Piva Alessandro	Sindaco	SI	2,7892
PONTE DELL'OLIO	Valla Gabriele	Assessore	SI	1,5084
PONTENURE				2,0585
RIVERGARO	Rancati Monica	Assessore	SI	2,1969
ROTOFRENO				3,6832
S. GIORGIO P.NO				1,7932
S. PIETRO IN CERRO				0,4216
SARMATO	Ferrari Claudia	Sindaco	SI	1,0342
TRAVO	Albasi Lodovico	Sindaco	SI	0,8102
VERNASCA				0,7666
VIGOLZONE				1,3932
VILLANOVA				0,6764
ZERBA	Rebolini Pietro	Sindaco	SI	0,2156
ZIANO				0,8924
PROVINCIA di PIACENZA				10,0000

**Presenti n. 24, quote 61,44 Assenti n. 23, quote 38,56**

Riconosciuta la validità della seduta Franco Albertini, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.3 del 15 marzo 2018 del Consiglio Locale di Piacenza è stata approvata la revisione straordinaria delle annualità 2018-2019 del Programma Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a seguito della deliberazione del Consiglio Locale sopra citata;
- con deliberazione n. 2 del 30 aprile 2020 del Consiglio Locale di Piacenza è stata approvata la revisione straordinaria delle annualità 2020-2021 e 2022 e l'inserimento dell'annualità 2023;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d'Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022 il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo

degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;

- la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che:
- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022 e dalla CAMB 84/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2022;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti **favorevoli 22** (quote 55,84) e **contrari 2** (quote 5,60) resi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Irete S.p.A. per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

\*\*\*\*\*



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 9 del 24 novembre 2023

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi – 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2022.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 24 novembre 2023

Il Dirigente  
Area Servizio idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani



Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n°9 del 24 novembre 2023

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**Servizio Idrico Integrato  
Gestore IRETI S.p.A.  
Sotto Ambito Piacenza  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022**

Piacenza, 24 novembre 2023



## 1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 84/2022.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
<b>GESTORE</b>	16.463.837	29.511.283	13.047.446	179%
<b>SOCIETÀTERZE</b>	//	//	//	0%
<b>FINANZIAMENTI PUBBLICI</b>	2.038.076	581.766	-1.456.310	29%
<b>TOTALE</b>	<b>18.501.913</b>	<b>30.093.049</b>	<b>11.591.136</b>	<b>163%</b>

Tabella 1 - Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura pianificati per l'anno 2022 ammontano ad €. 1.236.677, mentre a consuntivo ne sono stati contabilizzati €. 2.388.575, compresa una quota pari ad €. 984, relativa ad ecoincentivi per l'acquisto di mezzi. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 179% del pianificato, con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore all'importo pianificato e si attesta al 29%. Complessivamente la percentuale dell'importo degli investimenti realizzati rispetto all'importo pianificato è pari al 163%.

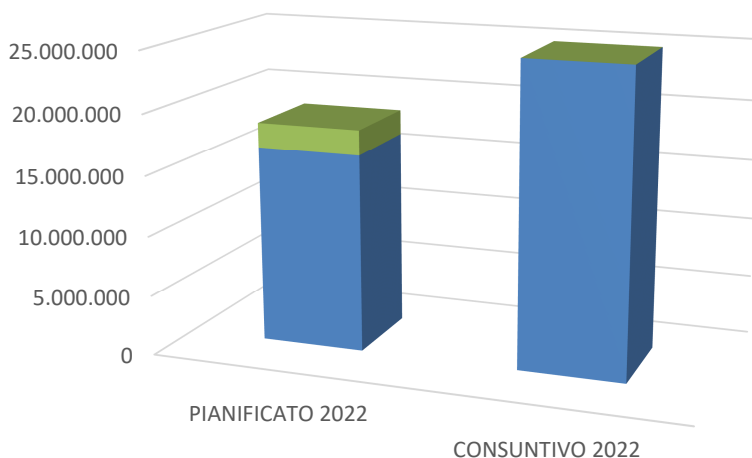


Figura 1 - Confronto tra pianificato e consuntivo 2022

I minori contributi incassati sono riferiti al mancato incasso dei contributi FSC, per complessivi €. 1.605.000 pianificati, riferiti ai lavori di seguito elencati:

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Comuni</b>	<b>Importo progettuale</b>
2018PCIE0263	Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000
2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	540.000
2018PCIE0275	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE	Gropparello	700.000
2021PCIE0345	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola	Fiorenzuola	190.000
2021PCIE0346	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato	Castell'Arquato	160.000
2021PCIE0347	Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano	Lugagnano Val d'Arda	70.000
2021PCIE0348	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni. Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni	Castel San Giovanni	75.000
2021PCIE0349	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e località Tassara (Alta Val Tidone)	Ziano Piacentino	200.000
2021PCIE0350	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e località Casa Rossa in Comune di Pecorara	Pecorara	200.000
2022PCIE0351	Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per raggiungere la piena produttività	Alta Val Tidone	90.000
2022PCIE0352	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per raggiungere la piena produttività	Bobbio	300.000
2022PCIE0353	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per raggiungere la piena produttività	Ferriere	100.000
2022PCIE0354	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso per raggiungere la piena produttività e nuovo collegamento con le sorgenti Erpesina	Morfasso	150.000

Tabella 2- Interventi senza incasso contributo

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

## 2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI


Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	9.514.213	16.394.084	6.879.871	172
DEPURAZIONE	4.695.200	7.487.995	2.792.795	159
FOGNATURA	3.622.500	4.788.680	1.166.180	132
STRUTTURA	1.236.677	2.388.575	1.151.898	193
TUTTI	670.000	1.422.290	752.290	212
<b>Totale complessivo</b>	<b>19.738.590</b>	<b>32.481.624</b>	<b>12.743.034</b>	<b>165</b>

Tabella 3 - Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

Suddivisione per categoria di investimenti a consuntivo

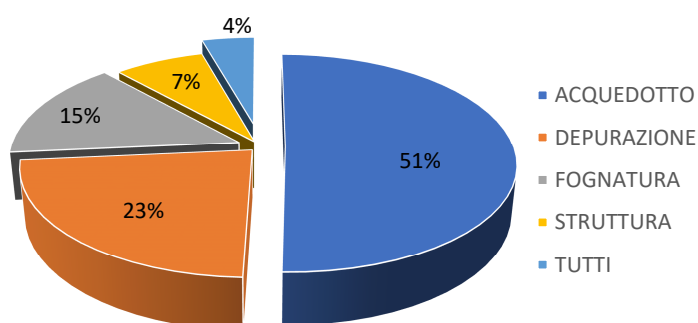

Suddivisione per categoria di investimenti pianificati

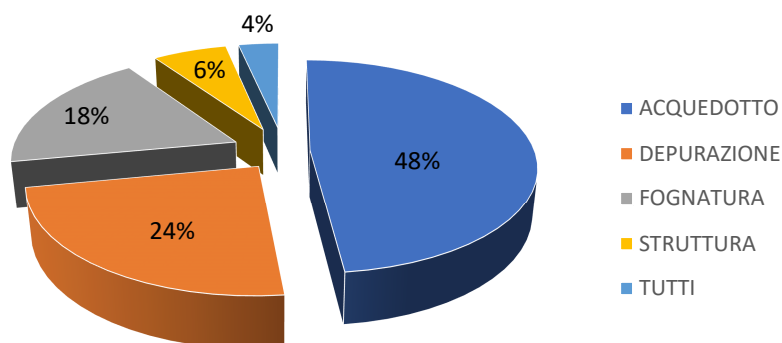


Figura 2-Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
<b>ACQUEDOTTO</b>	2.500.000	8.131.594	5.631.594	225%
<b>FOGNATURA</b>	1.100.000	3.035.279	1.935.279	144%
<b>DEPURAZIONE</b>	1.000.000	1.699.157	699.157	69%
<b>ACQUE METEORICHE</b>	150.000	0	-150.000	-100%
<b>TOTALE</b>	<b>4.750.000</b>	<b>12.866.031</b>	<b>8.116.031</b>	<b>338%</b>

Tabella 4– Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per queste ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che non sono emerse criticità.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

€.	N.	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
<i>Fino a 500.000</i>	150	5.265.000	4.914.267	-350.733,00	93%
<i>500.001-1.000.000</i>	30	2.262.250	3.313.459	1.051.209,00	146%
<i>1.000.000-2.000.000</i>	21	1.568.950	2.730.372	1.161.422,00	174%
<i>2.000.001-5.000.000</i>	12	1.796.500	3.158.687	1.362.187,00	176%
<i>Oltre 5.000.000</i>	1	0	11.955	11.955,00	100%
<i>Manutenzioni e titoli cumulativi</i>	20	7.609.213	15.964.309	8.355.096,00	210%
<b>TOTALE</b>	<b>234</b>	<b>18.501.913</b>	<b>30.093.049,00</b>	<b>11.591.136,00</b>	<b>163%</b>
<i>Investimenti di struttura</i>	1	1.236.677	2.388.575	1.151.898,00	193%
<b>TOTALE</b>	<b>235</b>	<b>19.738.590</b>	<b>32.481.624,00</b>	<b>12.743.034,00</b>	<b>165%</b>

Tabella 5– Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;

- Interventi che non ricadono tra quelli in infrazione, ritenuti prioritari a causa dell'adeguamento degli scarichi previsto dalla normativa;
- Interventi su impianti di depurazione, non in infrazione, programmati con risorse economiche che, data la situazione di instabilità economica del 2022, sono stati rallentati per non dover sostenere spese elevate e non previste, in attesa di una situazione economica più stabile;
- Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche ed al miglioramento del macroindicatore M4;
- Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha avviato numerose Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006 per l'approvazione, consentendo il prosieguo dell'iter di realizzazione dei lavori.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 83

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2022: 129.

	<b>NUMERO INTERVENTI</b>	<b>IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022</b>	<b>IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022</b>
<i>Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)</i>	12	1.460.000	0
<i>Interventi con avvio anticipato nel 2022 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)</i>	58	0	6.603.325
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%</i>	63	15.971.127	23.777.677
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%</i>	8	2.117.463	1.909.003

Tabella 6-Scostamenti tra il rendicontato e il pianificato

Si può notare come molti degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

### 3. INTERVENTI NON AVVIATI

Di seguito l'elenco degli interventi non avviati nell'annualità 2022:

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Comuni</b>	<b>Importo pianificato 2022</b>
2014PCIE0008	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.	Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	50.000
2014PCIE0033	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	Cadeo	300.000
2014PCIE0035	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	Bobbio	60.000
2014PCIE0053	P2011001 - Impianto di telegestione depuratori.	Opere pluricomunali	50.000
2016PCIE0180	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni Cortemaggiore, San Pietro In Cerro, Caorso. Studio di fattibilità.	Grandi opere, Cortemaggiore, Caorso, San Pietro in Cerro	10.000
2016PCIE0192	Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private.	Rivergaro	250.000
2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	190.000
2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	Opere pluricomunali	50.000
2020PCIE0318	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	Opere pluricomunali	150.000
2020PCIE0325	Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso	Caorso	50.000
2020PCIE0329	Studi di fattibilità e modellazioni	Opere pluricomunali	50.000
2020PCIE0332	Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello	Ziano Piacentino	250.000

Tabella 7-Interventi non avviati

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2014PCIE0001	203 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi collegamenti fognari	DEPURAZIONE	Vernasca	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0002	E2008001 - Potenziamento vasche dell'impianto di depurazione di Borgonovo e opere di collettamento della località Cà Verde al depuratore del capoluogo.	DEPURAZIONE	Borgonovo Val Tidone	1.500.000	485.000	0	485.000	7.848	0	7.848	-477.152	-98%	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi.
2014PCIE0004	G20080001 - Miglioramento della qualità dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1° Stralcio: Impianto di produzione acqua potabile località Mortizza - Collegamento Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo esistente Mortizza-scuole - perforazione di tre nuovi pozzi	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Piacenza	5.300.000	0	0	0	11.955	0	11.955	11.955	100%	Costi per certificazioni e collaudi.
2014PCIE0005	G20080003-1 - Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 1° Stralcio: Adeguamento e automazione potabilizz. sino 140 l/s - Condotta Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc. MOCOMERO, potabilizzatore San Protaso. A servizio dei comuni FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0007	G20080008 - Acquedotto intercomunale Bassa Val Trebbia: TRAVO-GAZZOLA: Collegamenti acquedottistici Torrazzo Momeliano Pigazzano e collegamento a Rezzanello (BOFFALORA) (più collegamento Boffalora - Paderna)	ACQUEDOTTO	Gazzola, Travo, Grandi opere, Piozzano	1.180.000	0	0	0	2.568	0	2.568	2.568	100%	Costi progettazione per collegamento Boffalora - Paderna.
2014PCIE0008	G20080009 - Razionalizzazione sistema sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure, Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale, Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio, Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere, Farini, Bettola, Gropparello, Caminata, Pecorara.	ACQUEDOTTO	Bettola, Bobbio, Caminata, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Zerba, Vernasca, Grandi opere, Cerignale, Morfasso, Ottone, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Alta Val Tidone	1.000.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Nell'anno 2022 le principali attività di manutenzione sorgenti sono state realizzate con i finanziamenti di protezione civile siccità 2022
2014PCIE0010	G20080012 -Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: stralcio funzionale relativo al potenziamento sino a 10.000 AE dell'impianto di depurazione di S.Giuliano	DEPURAZIONE	Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, Grandi opere	1.740.000	0	0	0	619.235	0	619.235	619.235	100%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
2014PCIE0011	G20080013 - Sistema depurativo intercomunale Bassa Est: 1° stralcio collettamento Soarza + VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona artigianale + Cignano all'impianto di depurazione di S.Giuliano, e adeguamento scarichi loc. Cantarana mediante realizzazione di fossa Imhoff.	DEPURAZIONE	Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, Grandi opere	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0012	G20080014 - Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio: collettamento di Vigolzone nel reticolo fognario di Podenzano.	FOGNATURA	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	160.851	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0013	G20080015 -Adeguamento scarichi dell'agglomerato di NIBBIANO mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	1.000.000	42.500	0	42.500	397.296	0	397.296	354.796	834%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in corso.
2014PCIE0014	G20080016 - Sistemazione reticolo fognario di CAMINATA e Costiola e adeguamento scarichi dell'agglomerato mediante realizzazione nuovo impianto di depurazione a biodischi	DEPURAZIONE	Grandi opere, Caminata, Alta Val Tidone	800.000	34.000	0	34.000	717.598	0	717.598	683.598	2010%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione.
2014PCIE0015	G20080017 - Intervento di ristrutturazione dell'impianto di depurazione del capoluogo CASTEL SAN GIOVANNI, con adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006).	DEPURAZIONE	Grandi opere, Castel San Giovanni	3.512.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2014PCIE0016	G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo (NIBBIANO) all'impianto di depurazione di Pianello V.T., potenziamento depuratore di PIANELLO e sistemazione strada di accesso	FOGNATURA	Grandi opere, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone	2.386.200	42.500	0	42.500	10.412	0	10.412	-32.088	-75%	Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei nuovi termini della DGR 2338/22. Affidata ed in corso la progettazione esecutiva nelle more della chiusura della CDS.
2014PCIE0017	G20080019 - Adeguamento agglomerato Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione delle fosse Imhoff.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Nibbiano, Alta Val Tidone	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0018	G20080020 - Adeguamento agglomerato Valconasso di Pontenure.	DEPURAZIONE	Grandi opere, Pontenure	847.000	0	0	0	-116.567	116.567	0	0	0%	
2014PCIE0019	G20080022 - Realizzazione tratti di fognatura e impianto di depurazione biologico per COLI, collettamento Coli Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica, Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte, Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed estensione rete loc.Caminata	FOGNATURA	Grandi opere, Coli	1.158.201	0	0	0	36.975	0	36.975	36.975	100%	La conclusione dell'intervento richiede l'ultimazione delle opere di sistemazione delle aree esterne la cui realizzazione è però subordinata alla verifica dell'adeguato completamento delle opere principali. Trattandosi di intervento non ricadente tra quelli in infrazione è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0020	G20080023 - Realizzazione impianto di depurazione e collettamenti fognari per agglomerato Vicobarone 3 e Case Pallaroni di ZIANO	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino, Grandi opere	1.000.000	42.500	0	42.500	20.513	0	20.513	-21.988	-51%	Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei nuovi termini della DGR 2338/22. Affidata ed in corso la progettazione esecutiva nelle more della chiusura della CDS.
2014PCIE0021	G20080026 - Impianto di depurazione di Mezzano Scotti.	DEPURAZIONE	Bobbio	980.000	300.000	0	300.000	1.612	0	1.612	-298.388	-99%	Il titolo non ricade tra quelli in infrazione. Pertanto, è stato dato spazio ad altri interventi per adeguamento normativo degli scarichi.
2014PCIE0024	G20090011 -Sistema depurativo a servizio del comune di CALENDASCO - indennità servitù e danni - adeguamento e messa in sicurezza viabilità di accesso al nuovo depuratore	DEPURAZIONE	Rottofreno, Grandi opere, Calendasco	1.750.000	0	0	0	823.288	0	823.288	823.288	100%	Intervento pianificato annualità precedenti. Lavori in linea con le attività di cantiere.
2014PCIE0030	P2008072 - Potenziamento depuratore capoluogo. 1° stralcio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	1.300.000	225.000	0	225.000	38	0	38	-224.962	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0032	P2010001 - Adeguamento impianto di depurazione per agglomerato Agazzano OVEST.	DEPURAZIONE	Agazzano	1.200.000	51.000	0	51.000	794.276	0	794.276	743.276	1457%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione.
2014PCIE0033	P2010004 - Ampliamento impianto di depurazione Cadeo Colombaia	DEPURAZIONE	Cadeo	1.100.000	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	-100%	La realizzazione dell'intervento richiede l'acquisizione di un'area privata. Le trattative per la cessione bonaria sono state avviate ma non è stato possibile chiuderle nel corso del 2022.
2014PCIE0035	P2010011 - Ristrutturazione sedimentatore.	DEPURAZIONE	Bobbio	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-60.000	-100%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0036	P2010016 - Rifacimento impianti di sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.	FOGNATURA	Cadeo	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014PCIE0039	P2010049 - Adeguamento dell'impianto di depurazione agglomerato Capoluogo Ovest-Rio Gazzola e collettamento scarichi	DEPURAZIONE	Gazzola	1.040.000	44.200	0	44.200	99.352	0	99.352	55.152	124%	Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei nuovi termini della DGR 2338/22. In corso l'acquisizione delle aree e in fase di completamento la progettazione esecutiva.
2014PCIE0041	P2010067 - Realizzazione impianto di depurazione per adeguamento scarico agglomerato Pecorara e sistemazioni reti fognarie capoluogo	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.500.000	63.750	0	63.750	19.889	0	19.889	-43.861	-68%	Nell'ottica di ottimizzare la realizzazione dei depuratori in infrazione di Piacenza i lavori sono stati ripianificati nel rispetto dei nuovi termini della DGR 2338/22. In corso CDS.
2014PCIE0042	P2010070 - Sistemazione del sistema di depurazione agglomerati Cicogni Nord, Centro e Sud	DEPURAZIONE	Pecorara, Alta Val Tidone	1.000.000	100.000	0	100.000	38	0	38	-99.962	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0044	P2010087 - Sistemazione acquedotto e fognatura in vicolo Nure e zona Ovest Capoluogo	ACQUEDOTTO	Pontenure	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	



Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2014PCIE0047	P2010125 - Realizzazione di impianto per adeguamento scarico dell'agglomerato Bacedasco Alto	DEPURAZIONE	Castell'Arquato	100.000	0	0	0	667	0	667	667	100%	Code intervento
2014PCIE0048	P2010133 - Completamento rete fognaria località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.	FOGNATURA	Podenzano	100.000	0	0	0	7.729	0	7.729	7.729	100%	Code intervento
2014PCIE0053	P2011001 - Impianto di telegestione depuratori.	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Non si sono manifestate esigenze nel corso dell'anno.
2014PCIE0057	P2011016 - Collettamento scarichi via Tinazzo.	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	160.000	0	0	0	51.265	0	51.265	51.265	100%	Lavori terminati nel 2022.
2014PCIE0059	P2011028 - Ristrutturazione impianto di depurazione di Travo capoluogo.	DEPURAZIONE	Travo	1.000.000	200.000	0	200.000	486	0	486	-199.514	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0060	P2011032 - Adeguamento degli scarichi fognari dell'agglomerato Ziano 3, Ziano 4 e Ziano 5	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	900.000	38.250	0	38.250	33.495	0	33.495	-4.755	-12%	
2014PCIE0063	P2014003 - Ampliamento impianto di depurazione di Gossolengo.	DEPURAZIONE	Gossolengo	1.700.000	200.000	0	200.000	724	0	724	-199.276	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2014PCIE0065	P2014006 - Realizzazione tratto di fognatura in località La Verza.	FOGNATURA	Piacenza	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PCIE0071	P2014012/P2014025 - CASTELL'ARQUATO - Realizzazione impianto depurazione S.Lorenzo (loc. Rastella); SAN GIORGIO - Realizzazione nuovo impianto di dep. di Centovera e adeguamento San Damiano tramite collettamento a Centovera; VILLANOVA - Realizzazione rete acquedotto via Stallone e Sant'Agata acquedotto e fognatura.	TUTTI	Caorso, Castell'Arquato, Gazzola, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Villanova sull'Arda, Coli, Farini, Ferriere, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo		200.000	0	200.000	1.060.821	0	1.060.821	860.821	430%	Interventi depuratore San Lorenzo e Centovera in corso.
2014PCIE0072	Cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	208.077	0	208.077	8.077	4%	
2015PCIE0075	P2010063 - Ristrutturazione impianto Quattrocasse	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0084	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo serbatoio diga di Mignano. A servizio dei comuni FIORENUOLA, CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO	ACQUEDOTTO	Carpaneto, Castell'Arquato, Fiorenzuola, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Grandi opere, Gropparello	800.000	100.000	0	100.000	1.379	0	1.379	-98.621	-98%	Difficoltà nel raggiungimento di accordi con i proprietari. In relazione alle osservazioni avanzate da Operation, si è optato per una revisione delle scelte progettuali.
2015PCIE0085	Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2° Stralcio: collegamento CALENDASCO-SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-BORGONOVO-collegamento ROTTOFRENO- Cattagnina	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Grandi opere, Calendasco	900.000	100.000	0	100.000	3.669	0	3.669	-96.331	-96%	Progetto completato. Opera in esecuzione a fine 2023.
2015PCIE0087	Sistema depurativo PODENZANO-VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione e ampliamento depuratore di Podenzano	DEPURAZIONE	Grandi opere, Podenzano, Vigolzone	1.742.000	200.000	0	200.000	1.148	0	1.148	-198.852	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2015PCIE0088	G20090010-2 - Sistema fognario e depurativo a servizio del comune di GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio collettamento loc. Campremoldo e Casaliggio e Centora	DEPURAZIONE	Gragnano Trebbiense, Rottofreno, Grandi opere	1.275.000	0	0	0	33.353	0	33.353	33.353	100%	Intervento in corso da anno precedente. Manca da realizzare l'impianto di sollevamento in quanto AUA acquisita recentemente.
2015PCIE0089	Potenziamento impianto idrovoro di Piacenza Borgoforte	DEPURAZIONE	Grandi opere, Piacenza	3.000.000	300.000	0	300.000	1.451	0	1.451	-298.549	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2015PCIE0090	Rifacimento automazione e rifacimento decantatore secondario n.2. PIACENZA	DEPURAZIONE	Grandi opere, Piacenza	440.000	0	0	0	486.489	0	486.489	486.489	100%	Anticipato intervento in quanto il sedimentatore ha subito un guasto che ha comportato la messa fuori esercizio del medesimo e avrebbe compromesso il funzionamento dell'intero impianto di depurazione del capoluogo.
2015PCIE0092	Potenziamento impianto di depurazione di Cortina - con contributo	DEPURAZIONE	Alseno	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0094	Rifacimento reti acquedotto via della Libertà e piazza Repubblica	ACQUEDOTTO	Besenzone	200.000	0	0	0	5.204	0	5.204	5.204	100%	Anticipati costi di progettazione.
2015PCIE0099	Sistemazione criticità rete fognaria Mottaziana	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	70.000	0	0	0	302.446	0	302.446	302.446	100%	Lavori in corso. Intervento pianificato annualità precedenti.
2015PCIE0100	Collettamento fognario Cadeo Sud (via Emilia)	FOGNATURA	Cadeo	500.000	50.000	0	50.000	45.795	0	45.795	-4.205	-8%	
2015PCIE0101	Collettamento loc. Malpaga all'impianto di depurazione di Calendasco	FOGNATURA	Calendasco	100.000	0	0	0	356.976	0	356.976	356.976	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2015PCIE0103	Sistemazione rete fognaria via Marconi	FOGNATURA	Castell'Arquato	50.000	50.000	0	50.000	343	0	343	-49.657	-99%	Progetto esecutivo in corso. Da valutare con Atersir e Comune disponibilità dei privati a scaricare reflui mediante impianto sollevamento in p.p.
2015PCIE0104	Estendimento rete acquedotto strada della Sforzesca progetto fattibilità per acquisizione contributi	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0106	Rifacimento acquedotto e fognatura via Bixio, Mozza, Portone e Zilli	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	335.000	0	0	0	4.174	0	4.174	4.174	100%	Anticipati costi progettazione Via Mozza da realizzare nel 2023 come da accordi con Comune.
2015PCIE0108	Risoluzione criticità fognarie territorio comunale CASTELVETRO	FOGNATURA	Castelvetro Piacentino	700.000	300.000	0	300.000	1.524	0	1.524	-298.476	-99%	Progetto esecutivo in corso.
2015PCIE0111	Ristrutturazione e potenziamento impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	700.000	100.000	0	100.000	28.344	0	28.344	-71.656	-71%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2015PCIE0112	Realizzazione impianto depurazione di Chiavenna Landi	DEPURAZIONE	Cortemaggiore	500.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Errore di imputazione.
2015PCIE0115	Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica	FOGNATURA	Fiorenzuola	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0117	Potenziamento dell'impianto di depurazione agglomerato Canneto	DEPURAZIONE	Gazzola	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0122	Collegamento acquedotto San Nazzaro al serbatoio Quattro Case (Capoluogo)	ACQUEDOTTO	Monticelli d'Ognina	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0123	Realizzazione fognatura per sistemazione criticità via Breda	FOGNATURA	Monticelli d'Ognina	100.000	0	0	0	1.505	0	1.505	1.505	100%	Anticipati costi di progettazione.
2015PCIE0125	Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e Bertassi (frane)	DEPURAZIONE	Ottone	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0126	Rifacimento rete fognaria capoluogo via Roma, 1° stralcio	FOGNATURA	Podenzano	2.835.000	250.000	0	250.000	38.663	0	38.663	-211.337	-84%	Completato progetto esecutivo.
2015PCIE0128	Ristrutturazione impianto di depurazione Ponte dell'Olio	DEPURAZIONE	Ponte dell'Olio	1.000.000	200.000	0	200.000	1.146	0	1.146	-198.854	-99%	L'intervento, non ricadendo tra quelli in infrazione, è stato rallentato in attesa di una situazione economica più stabile.
2015PCIE0129	Studio preliminare per nuovo approvvigionamento idrico Capoluogo - studio fattibilità e avvio intervento	ACQUEDOTTO	Pontenure	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0130	Rifacimento impianto elettrico impianto di depurazione e nuova linea pretrattamento liquami	DEPURAZIONE	Pontenure	190.000	0	0	0	57	0	57	57	100%	Errore di imputazione.
2015PCIE0132	Potenziamento depuratore capoluogo. 2° stralcio - San Giorgio	DEPURAZIONE	San Giorgio Piacentino	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0134	Estendimento acquedotto rete idrica su SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità per acquisizione	ACQUEDOTTO	Sarmato	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0135	Sistemazione criticità fognarie loc. Case Marchesi. Studio di fattibilità	FOGNATURA	Travo	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0137	Rifacimento rete acquedotto e fognatura loc. Bergonzi	ACQUEDOTTO	Travo	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0138	Rifacimento serbatoio loc. Vezzolacca	ACQUEDOTTO	Vernasca	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2015PCIE0139	Realizzazione nuovo impianto di depurazione (biodischi) per l'agglomerato Vernasca Rete1 e collegamenti fognar	DEPURAZIONE	Vernasca	2.158.600	34.000	0	34.000	8.937	0	8.937	-25.063	-73%	L'intervento è stato rallentato dall'iter approvativo e dalle tempistiche necessarie per l'acquisizione dei terreni.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2016PCIE0152	Acquedotto zona Generesso 2° stralcio: studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000	0	0	0	1.978	0	1.978	1.978	100%	Costi per studio di fattibilità. Possibilità di contributo evidenziata con corrispondenza specifica.
2016PCIE0153	Interventi di miglioramento della distribuzione idropotabile. 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Podenzano	1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0154	Completamento rete fognaria in loc. Bassano.	FOGNATURA	Rivergaro	70.000	0	0	0	1.248	0	1.248	1.248	100%	Siamo in attesa della formalizzazione dell'accordo tra il privato e il Comune per la cessione dell'area su quale dovrà essere realizzato l'impianto di sollevamento.
2016PCIE0155	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure: attraversamento Nure a Farini	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Farini	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0157	Interventi straordinari sul pozzo Le Forche	ACQUEDOTTO	Bettola	110.000	0	0	0	16.840	0	16.840	16.840	100%	Realizzazione q.e. per avviamento impianto
2016PCIE0162	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Farini in fregio all'alveo del torrente Nure	FOGNATURA	Farini	223.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0163	Interventi straordinari sul pozzo Borcaglia	ACQUEDOTTO	Farini	110.000	0	0	0	43.203	0	43.203	43.203	100%	Realizzazione q.e. per avviamento impianto
2016PCIE0164	Rifacimento tratti di fognatura nel capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei dei torrenti Grondana e Nure	FOGNATURA	Ferriere	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0165	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Ferriere capoluogo	DEPURAZIONE	Ferriere	1.145.000	0	0	0	34.299	0	34.299	34.299	100%	Realizzazione q.e. per avviamento impianto
2016PCIE0172	Interventi straordinari sul pozzo Campo Sportivo (difesa spondale)	ACQUEDOTTO	Travo	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0175	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Travo	DEPURAZIONE	Travo	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0176	Interventi straordinari sull'impianto di depurazione di Albarola	DEPURAZIONE	Vigolzone	351.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0177	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure (Finanziamento RER Alluvione)	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Ferriere, Farini	4.905.000	500.000	0	500.000	906.350	0	906.350	406.350	81%	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
2016PCIE0179	Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nel tratto Case Camia - Maioli	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Bettola	745.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0180	Acquedotto intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina, 3° Stralcio: Interconnessione acquedottistica dei comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.	ACQUEDOTTO	Grandi opere, Cortemaggiore, Caorso, San Pietro in Cerro	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	Studio di fattibilità sviluppato internamente in attività gara SII PC.
2016PCIE0182	Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo - Studio di fattibilità	ACQUEDOTTO	Bettola	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0183	Nuova rete fognaria in loc. Recesio - Studio di fattibilità	FOGNATURA	Bettola	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0185	Rifacimento sottoservizi in occasione degli interventi sulla viabilità comunale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0186	* Raddoppio collegamento campo-pozzi di San Protaso al serbatoio pensile del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0188	Realizzazione rete fognatura via Beati	FOGNATURA	Piacenza	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0189	Realizzazione pozzo a Quarto. Cofinanziamento lottizzante.	ACQUEDOTTO	Piacenza	350.000	0	0	0	128.627	0	128.627	128.627	100%	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere
2016PCIE0190	Manutenzione straordinaria digestore anaerobico depuratore di Piacenza.	DEPURAZIONE	Piacenza	400.000	0	0	0	118.351	0	118.351	118.351	100%	Anticipato costi di progettazione.
2016PCIE0191	Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino a Pontenure.	FOGNATURA	Pontenure	100.000	100.000	0	100.000	7.157	0	7.157	-92.843	-92%	Progetto esecutivo completato. Realizzazione da valutare.
2016PCIE0192	Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di rete idrica ed eliminazione di interferenze con proprietà private.	ACQUEDOTTO	Rivergaro	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	-250.000	-100%	In relazione alle osservazioni avanzate da Operation, si è optato per una revisione delle scelte progettuali che prevedono la razionalizzazione del sistema acquedottistico del capoluogo. Sulla nuova proposta di POI 24/27 è stato modificato il titolo per renderlo più coerente con le nuove scelte progettuali.
2016PCIE0193	Collettamento scarichi zona produttiva di Via Piave a Rottofreno - Studio di fattibilità.	FOGNATURA	Rottofreno	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PCIE0194	Rifacimento tratti di rete fognaria in Via Caorsana a Polignano	FOGNATURA	San Pietro in Cerro	300.000	300.000	0	300.000	4.029	0	4.029	-295.971	-98%	Studio di fattibilità completato. Opera attualmente non realizzabile per uso promiscuo con Consorzio di Bonifica.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	
2016PCIE0195	* Estendimento reti con contributo a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali		0	0	0	37.519	72.324	109.843	109.843	100%	Interventi realizzati in base a richieste.
2017PCIE0197	* Studio delle azioni di contenimento del CROMO VI	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0198	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento acquedottistico Calendasco Piacenza: Ponte Trebbia Calendasco.	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0199	* Acquedotto Intercomunale Val Tidone 3° Stralcio Lotto e. Collegamento acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo Maggio - (lungo Via Einaudi)	ACQUEDOTTO	Piacenza, Calendasco, Rottofreno	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0203	* Ripristino danni alluvione depuratore Pradella	DEPURAZIONE	Coli	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0207	* Ripristino danni alluvione depuratore Piancasale	DEPURAZIONE	Bobbio	100.000	0	0	0	2.028	0	2.028	2.028	100%	Costi sostenuti per progettazione e opere preliminari di sfalcio e pulizia area per rilievi/picchettamento.
2017PCIE0210	* Collegamento acquedottistico Cortemaggiore-Besenzone (e studio serbatoio Besenzone)	ACQUEDOTTO	Besenzone	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0212	* Potenziamento pozzi esistenti	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2017PCIE0213	* Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco	ACQUEDOTTO	Calendasco, Piacenza	1.500.000	0	0	0	50.260	0	50.260	50.260	100%	Intervento pianificato anni precedenti. In fase conclusiva la quota intervento finanziata con fondi FSC
2018PCIE0027A	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI DI EMERGENZA	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.500.000	0	2.500.000	8.131.594	0	8.131.594	5.631.594	225%	Nel corso del 2022, i maggiori costi sono principalmente dovuti alle attività di riparazione delle reti e di completo rifacimento prese che, in caso di rottura, permettono di rinnovare la derivazione dell'utente con nuova tubazione in triplo strato, operazione da preferire rispetto alla semplice riparazione. Queste due voci saturano oltre il 60% dell'intero importo delle manutenzioni straordinarie. Ricompresi in questo capitolo anche sono quota parte degli interventi di rinnovamento delle reti ai fini della riduzione delle perdite. Si osserva che l'intera somma permette poi di intervenire in manutenzione straordinaria anche su tutta l'impiantistica elettromeccanica installata, sulle parti idrauliche e civili dei serbatoi. Sono inoltre ricompresi i costi per le nuove attività di distrettualizzazione, in aumento sulla provincia di Piacenza, e di mantenimento dei distretti esistenti.
2018PCIE0027B	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	FOGNATURA	Opere pluricomunali		1.000.000	0	1.000.000	2.990.935	0	2.990.935	1.990.935	199%	Maggiori oneri sostenuti per rifacimenti indifferibili fognature ed impianti di sollevamento tra cui: Soll. Via Piave a Rottofreno, rete mista via Calvi a Castel San Giovanni, Soll. La Valle a San Pietro in Cerro, rete mista in via Puccini a Castel San Giovanni, rete mista in via Pallavicino a Fiorenzuola, rete mista in via Vaiarini a Fiorenzuola, rete mista in via Croce ad albareto di Ziano, rete mista in via Conni a Fiorenzuola, Soll. via Genova a Cadeo, rete mista in via ferrari a Fiorenzuola, rete mista in loc Pigazzano di Travo, rete mista in via Don Galli a Farini.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2018PCIE0027C	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		1.000.000	0	1.000.000	1.699.157	0	1.699.157	699.157	69%	Maggiori costi sostenuti per: Borgonovo scala vasca di ossidazione-Borgonovo ripristino viabilità interna-Castell'Arquato rifacimento carpenterie stabilizzazione fanghi -Pontenure scala vasca di ossidazione-Carpaneto scala vasca di ossidazione n°2-Piacenza rifacimento portone deposito utenze d17-manutenzione griglia Finarda-Monticelli d'Ongina rifacimento cavidotto -Rivergaro f.imhoff Colonnese di Rivergaro rifacimento tubazione scarico e by-pass-Carpaneto scala vasca di ossidazione n°1-Borgoforte acquisto nuova elettropompa di ricircolo fanghi-Piacenza manutenzione turbocompressore hwc-Fiorenzuola revamping circuito di distribuzione aria-Chiaravalle installazione passerella accesso sedimentatore- Castell'Arquato sost diffusori vasca ossidazione-Borgonovo rifacimento carpenterie sedimentatore-Ponte dell'olio Trioli rifacimento carpenterie sedimentatore-San Giorgio rifacimento carpenterie sedimentatore-Lusurasco installazione passerella accesso sedimentatore-Bobbio fi Levratti rifacimento tubazione scarico effluente-Piacenza sostituzione diffusori ossidazione linea 1-Ziano 2 installazione nuova fossa imhoff-Borgonovo acquisto e installazione nuovo floget-Piacenza rifacimento sistema di pompaggio scambiatore di calore digestore-s. Maria Bobbio installazione di n°2 biodischi nuovi.
2018PCIE0227	Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani, Via XXIV Maggio)	ACQUEDOTTO	Piacenza	1.500.000	0	0	0	79.473	0	79.473	79.473	100%	Proseguimento lavori elettrici, certificazioni e collaudi
2018PCIE0228	Trattamento Pozzo Marchesana	ACQUEDOTTO	Gossolengo	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0229	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Arelli - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	355.000	0	0	0	152.328	0	152.328	152.328	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0230	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Caione	ACQUEDOTTO	Bobbio	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0231	Acq Bobbio - Impianto di trattamento Serbatoio Piancasale	ACQUEDOTTO	Bobbio	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0232	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Roncoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0233	Acq Marsaglia - Impianto di trattamento presso località Fossoli	ACQUEDOTTO	Cortebrugnatella	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0234	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 18	ACQUEDOTTO	Cerignale	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0235	Acq Cerignale - Impianto di trattamento Serbatoio Cerignale 14 Le Piane	ACQUEDOTTO	Cerignale	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0236	Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di trattamento Serbatoio Camminata	ACQUEDOTTO	Cerignale	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0237	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio 16 Filippazzi	ACQUEDOTTO	Coli	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0238	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Forno di Sopra	ACQUEDOTTO	Coli	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0239	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Coste delle Guardie	ACQUEDOTTO	Coli	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0240	Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento Serbatoio Pellegrini (da realizzare)-FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	175.000	0	0	0	184.272	0	184.272	184.272	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0241	Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di trattamento Serbatoio Colletta	ACQUEDOTTO	Farini	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0242	Acq Val Nure - Impianto di trattamento Serbatoio Toni	ACQUEDOTTO	Ferriere	925.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0243	Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di trattamento Serbatoio Castel Canafurone	ACQUEDOTTO	Ferriere	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0244	Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di trattamento Serbatoio Nuovo Carbonaie	ACQUEDOTTO	Ferriere	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2018PCIE0245	Acq Ferriere - Impianto di trattamento Serbatoio Bardogna di Sopra	ACQUEDOTTO	Ferriere	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0246	Acq Morfasso - Impianto di trattamento Serbatoio Case Negri - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Morfasso	190.000	0	0	0	16.434	0	16.434	16.434	100%	Intervento finanziato anni precedenti. Scostamento temporale rispetto a 2020 dovuto a proroghe Cromo. Modificato progetto iniziale (intervento su reti in sostituzione dell'impianto) e completato nel 2022 per accedere a finanziamenti FSC.
2018PCIE0247	Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di trattamento Serbatoio Sermadasco	ACQUEDOTTO	Ferriere	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0248	Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di trattamento Serbatoio Mezzano o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	145.000	0	0	0	3.072	0	3.072	3.072	100%	Costi progettazione
2018PCIE0249	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto di trattamento Serbatoio Cassolo o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000	0	0	0	91.013	0	91.013	91.013	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0250	Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto di trattamento Serbatoio Cavarelli-Bertuzzi o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	185.000	0	0	0	162.208	0	162.208	162.208	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0251	Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento Serbatoio Case Trebbia o alimentazione da fonti alternative (pozzi Trebbia) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	135.000	0	0	0	52.889	0	52.889	52.889	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0252	Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti alternative tramite realizzazione di opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Coli	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0253	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Pastori o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	0	0	0	79.273	0	79.273	79.273	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in conclusione
2018PCIE0254	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Chiarabini o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0255	Acq Farini-Groppallo-Impianto di trattamento Serbatoio Montalto o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC	ACQUEDOTTO	Farini	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0256	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Grapazzuolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0257	Acq Farini-Groppallo- Impianto di trattamento Serbatoio Costiolo o alimentazione da fonti alternative (acq Val Nure) tramite opere di adduzione	ACQUEDOTTO	Farini	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0258	Intervento strutturale di ristrutturazione pozzi di alimentazione della rete idrica con installazione potabilizzatori per l'abbattimento dei nitrati	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Castel San Giovanni, Sarmato, Ziano Piacentino, Alseno		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0259	2° stralcio: interconnessione tra pozzo Barabasca e rete Fiorenzuola (attraversamento FFSS e torrente Arda) - con collegamento per Nuovo ospedale	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0260	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	550.000	0	0	0	1.193.253	0	1.193.253	1.193.253	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso. Intervento unico con ID 2018PCIE0262

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2018PCIE0261	2° stralcio - Interconnessione tra serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a beneficio di Pecorara (posa tubazione definitiva)	ACQUEDOTTO	Pecorara, Alta Val Tidone	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0262	2° stralcio - Interconnessione acquedotto Intercomunale Castel San Giovanni-Sarmato-Borgonovo-Ziano con l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione definitiva per collegamento degli acquedotti)	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	1.300.000	0	0	0	229	0	229	229	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso. Intervento unico con ID 2018PCIE0260
2018PCIE0263	Potenziamento ed estendimento acquedotto loc. Genepreto (con contributo privati)	ACQUEDOTTO	Nibbiano, Alta Val Tidone	200.000	165.000	25.000	190.000	191.619	0	191.619	1.619	0%	
2018PCIE0264	Progetto riassetto alta Val Nure: razionalizzazione pozzi e sorgenti con ristrutturazione serbatoi, automazione sistema, sostituzione tratti di rete	ACQUEDOTTO	Bettola, Farini, Ferriere, Ponte dell'Olio	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0265	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 1° stralcio: loc. Arelli di Bobbio per la sostituzione del sistema acquedottistico di carico dei serbatoi Casoni di Bobbio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Bobbio	380.000	0	0	0	4.079	0	4.079	4.079	100%	Costi di progettazione
2018PCIE0266	Rifacimento reti acquedotto a servizio di Bobbio capoluogo 2° stralcio: rifacimento sistema sorgenti (serbatoio Casoni di Bobbio).	ACQUEDOTTO	Bobbio	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0267	Rifacimento rete adduzione acquedotto intercomunale Val Tidone 1° stralcio - caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno soggetta a numerosi guasti che compromettono l'approvvigionamento di tutta l'Alta val Tidone	ACQUEDOTTO	Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino	540.000	95.000	95.000	190.000	0	0	0	-190.000	-100%	Intervento realizzato anni precedenti.
2018PCIE0268	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo zona nord	FOGNATURA	Caorso	310.000	300.000	0	300.000	8.368	0	8.368	-291.632	-97%	Completato progetto. L'intervento da cantiere risulta molto più oneroso del previsto per interventi anche su canali.
2018PCIE0269	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo via Perotti-via Malvicino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	225.000	215.000	0	215.000	9.990	0	9.990	-205.010	-95%	Progetto completato con integrazione del rifacimento rete acquedottistica. L'intervento ha subito pertanto un incremento dei costi previsti
2018PCIE0270	Collegamento acquedottistico Saliceto di Cadeo - Chiavenna Landi	ACQUEDOTTO	Cortemaggiore	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0271	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell' impianto di depurazione di Fiorenzuola.	DEPURAZIONE	Fiorenzuola	3.500.000	148.750	0	148.750	603.190	0	603.190	454.440	305%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione.
2018PCIE0272	Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e criticità acquedotto via San Rocco	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	2.300.000	415.000	0	415.000	41.822	0	41.822	-373.178	-89%	Completato il progetto esecutivo. Lavori iniziati nel 2023 con cronoprogramma concordato con Amministrazione Comunale
2018PCIE0273	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 1° stralcio - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gazzola	175.000	0	0	0	33.597	0	33.597	33.597	100%	Code intervento.
2018PCIE0274	Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo causa perdite (eternit -intervento da realizzare con rete fognaria + I.Soll. cod.2015PCIE0088) - FSC PERDITE	TUTTI	Gragnano Trebbiense	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0275	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello, 1° stralcio: collegamento tra serbatoi (Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	Gropparello	700.000	110.000	90.000	200.000	24.287	0	24.287	-175.713	-87%	Lavori iniziati nel 2021 coerentemente con la pianificazione. Nel 2022 si è proseguito con i lavori della parte impiantistica e a seguire inizieranno i lavori della parte a rete.
2018PCIE0276	Rifacimento reti di distribuzione e ed automazione acquedotto Gropparello capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto acquedottistico alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val d'Arda	ACQUEDOTTO	Gropparello	300.000	0	0	0	1.410	0	1.410	1.410	100%	Completato progetto esecutivo.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2018PCIE0277	Rifacimento rete loc. Case Magnani	ACQUEDOTTO	Gropparello	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0278	Rifacimento sottoservizi strada provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per rifacimento banchina	TUTTI	Lugagnano Val d'Arda	180.000	170.000	0	170.000	2.505	0	2.505	-167.495	-98%	Completato progetto esecutivo.
2018PCIE0279	Sostituzione tubazione loc. Campostrino	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda, Vernasca	150.000	140.000	0	140.000	1.495	0	1.495	-138.505	-98%	Completato progetto esecutivo.
2018PCIE0280	Estendimento rete fognaria da Via Bertè a Via Posta dei Cavalli	FOGNATURA	Piacenza	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0281	Rifacimento collettore via XXVI Aprile (sotto mura - lunghezza ca 1000 m)	FOGNATURA	Piacenza	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0282	Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza (contributo privati)	ACQUEDOTTO	Piacenza	360.000	0	0	0	256.160	0	256.160	256.160	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0283	Nuovo Serbatoio in località Rocca Pulzana con ricollegamenti e interconnessioni alla rete idrica esistente	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	175.000	0	0	0	6.880	0	6.880	6.880	100%	Costi di progettazione, progettazione elettrica e acquisto router.
2018PCIE0284	Ampliamento impianto di depurazione di Pieve Dugliara, 2° stralcio - studio fattibilità	DEPURAZIONE	Rivergaro	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0285	Approvvigionamento e gestione pressioni: distrettualizzazione permanente e controllo pressioni	ACQUEDOTTO	Rivergaro	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0286	Adeguamento ai parametri dell'azoto (tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping dell'impianto di depurazione di Rottofreno.	DEPURAZIONE	Rottofreno	2.500.000	106.250	0	106.250	925.849	0	925.849	819.599	771%	Intervento pianificato in annualità precedenti. Lavori in fase di ultimazione.
2018PCIE0287	Rifacimento reti acquedotto collinare loc. Ronco Centovera, tratti di tubazione Godi e Iustino - FSC PERDITE	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0288	Qualità della risorsa e valutazioni impiantistiche: nuovo pozzo Ronco, eventuale potabilizzazione/tratti di tubazione Godi e Iustino/ telecontrollo sistema	ACQUEDOTTO	San Giorgio Piacentino	231.000	0	0	0	36.550	0	36.550	36.550	100%	L'opera è in ritardo in quanto rappresenta il completamento del progetto "Rifacimento reti acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e Viustino" cod Arsi 2018PCIE0287 attualmente in corso di realizzazione. Costi di progettazione.
2018PCIE0289	Rifacimento acquedotto da Piazza Roma a loc. Bettola	ACQUEDOTTO	Sarmato	185.000	100.000	0	100.000	406.383	0	406.383	306.383	306%	Lavori in corso nel 2022. Maggiori costi per ulteriori interventi su Vie laterali non preventivati in quanto lavori concomitanti a lavori su rete gas.
2018PCIE0290	Potenziamento rete e serbatoio per loc. Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere	ACQUEDOTTO	Travo	1.000.000	50.000	0	50.000	30.696	0	30.696	-19.304	-38%	CAMB64 franchigia 20.000~ se scostamento < 100
2018PCIE0291	Riduzione pressioni e distrettualizzazione Vigolzone	ACQUEDOTTO	Vigolzone	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0292	CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove fonti di approvvigionamento, interconnessioni sorgenti/pozzi	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	300.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Sul 2022 sono stati utilizzati i codici specifici interventi già individuati.
2018PCIE0293	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		670.000	0	670.000	207.060	0	207.060	-462.940	-69%	La minor spesa è dovuta alla discontinuità delle forniture che ha condizionato la prima parte del 2022 e all'impossibilità di recuperare le sostituzioni non fatte nel I semestre nel corso del II semestre.
2018PCIE0294	Studi e attività relative a procedura accorpamenti concessioni derivazione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	200.000	50.000	0	50.000	31.965	0	31.965	-18.035	-36%	CAMB64 franchigia 20.000~ se scostamento < 100
2018PCIE0296	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Bobbio - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Bobbio	350.000	0	0	0	3.285	0	3.285	3.285	100%	Progettazione e autorizzazioni completate, scostamento temporale rispetto a 2020 dovuto a proroghe Cromo e a problemi ditta appaltatrice
2018PCIE0297	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cerignale	ACQUEDOTTO	Cerignale	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0298	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Coli - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Coli	175.000	0	0	0	6.143	0	6.143	6.143	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0299	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Cortebrugatella	ACQUEDOTTO	Cortebrugatella	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	



Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2018PCIE0300	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Farini - FSC CROMO	ACQUEDOTTO	Farini	170.000	0	0	0	19.055	0	19.055	19.055	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Lavori in corso.
2018PCIE0301	Adeguamento reti di alimentazione e distribuzione impianti di trattamento cromo nel comune di Ferriere	ACQUEDOTTO	Ferriere	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0304	Potenziamento sistema acquedottistico della località Merlera, La Costa, Cappiano e Bicchignano	ACQUEDOTTO	Vigolzone	1.010.000	0	0	0	127.415	0	127.415	127.415	100%	Lavori in corso. Rendicontazione in linea con l'avanzamento del cantiere. L'intervento è stato suddiviso in stralci funzionali.
2018PCIE0305	Sistema acquedottistico della località San Michele di Morfasso	ACQUEDOTTO	Morfasso	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PCIE0306	Nuovi allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		706.137	433.076	1.139.213	654.010	386.511	1.040.521	-98.692	-8%	
2018PCIE0307	Rifacimento e potenziamento della rete di distribuzione acquedotto a servizio della località Chiaravalle della Colomba	ACQUEDOTTO	Alseno	300.000	0	0	0	13.030	0	13.030	13.030	100%	Code intervento
2019PCIE0308	Rifacimento potabilizzatore di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	455.000	0	0	0	12.268	0	12.268	12.268	100%	Code intervento per collaudi e certificazioni
2020PCIE0309	Rifacimento fognatura in loc. San Bernardino	FOGNATURA	Castel San Giovanni	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0310	Potenziamento acquedotto Gabbiano Poggiolo	ACQUEDOTTO	Pianello Val Tidone	200.000	200.000	0	200.000	3.207	0	3.207	-196.793	-98%	Costi di progettazione
2020PCIE0311	Demolizione pensile e realizzazione nuovo serbatoio Niviano - collegamenti acquedottistici	ACQUEDOTTO	Rivergaro	500.000	200.000	0	200.000	41.837	0	41.837	-158.163	-79%	L'intervento è stato rallentato dalle tempistiche necessarie per l'acquisizione dei terreni. A breve si avvierà l'iter approvativo.
2020PCIE0312	Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva e La Fratta all'impianto di dep. del Capoluogo	FOGNATURA	Ponte dell'Olio	350.000	250.000	0	250.000	15.360	0	15.360	-234.640	-93%	Completato progetto esecutivo.
2020PCIE0313	Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da Cimitero a Franchini	ACQUEDOTTO	Vernasca	300.000	0	0	0	2.543	0	2.543	2.543	100%	Anticipati costi di progettazione.
2020PCIE0314	Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da Franchini a Bacedasco	ACQUEDOTTO	Vernasca		0	0	0	2.448	0	2.448	2.448	100%	Anticipati costi di progettazione.
2020PCIE0315	Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano e alimentazione serbatoio Boffalora	ACQUEDOTTO	Gazzola	600.000	0	0	0	10.595	0	10.595	10.595	100%	Costi di progettazione.
2020PCIE0316	Serbatoio Borgoforte	ACQUEDOTTO	Piacenza	2.400.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	Errore di imputazione.
2020PCIE0317	Collegamento Roncaglia - Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	2.100.000	0	0	0	621.974	0	621.974	621.974	100%	Lavori in corso. Spese rendicontate in base all'avanzamento del cantiere. L'intervento era inserito senza pianificazione in quanto sostituito di FSC Cromo.
2020PCIE0318	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	-100%	Non sono emerse necessità.
2020PCIE0319	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		300.000	0	300.000	425.339	0	425.339	125.339	41%	Interventi eseguiti secondo le necessità riscontrate. Oltre le code di alcuni interventi dell'anno precedente si evidenziano gli interventi di sostituzione della rete di distribuzione di Via Madonna Arda a Fiorenzuola e la sostituzione della rete di Via Borgonovo a Castel San Giovanni.
2020PCIE0320	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	FOGNATURA	Opere pluricomunali		100.000	0	100.000	44.345	0	44.345	-55.655	-55%	Realizzati interventi in base alle necessità.
2020PCIE0321	Rifacimento servizi in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni	TUTTI	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	34.680	6.364	41.044	-8.956	-17%	
2020PCIE0322	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		1.236.677	0	1.236.677	2.387.591	984	2.388.575	1.151.898	93%	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti per la gestione dell'utenza (progetto IREN WAY)
2020PCIE0323	Rifacimento collettore fognario Via Montebello a Piacenza	FOGNATURA	Piacenza	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0324	Razionalizzazione sistema fognario Castelnuovo Val Tidone	FOGNATURA	Borgonovo Val Tidone	300.000	300.000	0	300.000	4.153	0	4.153	-295.847	-98%	In corso progettazione esecutiva.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2020PCIE0325	Rifacimento e adeguamento reti acquedotto del capoluogo di Caorso	ACQUEDOTTO	Caorso	160.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Intervento temporaneamente sospeso in attesa di definire il progetto di distrettualizzazione della rete acquedottistica di Caorso.
2020PCIE0326	Adeguamento depuratore Monticelli d'Ognina	DEPURAZIONE	Monticelli d'Ognina	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0327	Potenziamento depuratore Carpaneto - 2° stralcio	DEPURAZIONE	Carpaneto	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0328	Rifacimento rete adduzione Boccine-Vergnano per approvvigionamento Gazzola Alta causa perdite, 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Gazzola	300.000	100.000	0	100.000	11.883	0	11.883	-88.117	-88%	Costi di progettazione
2020PCIE0329	Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Non sono emerse necessità.
2020PCIE0330	Completamento rete idrica in loc. Dorba	ACQUEDOTTO	Travo	90.000	0	0	0	177.387	0	177.387	177.387	100%	Intervento pianificato anni precedenti. Maggiori costi per attraversamento torrente Dorba secondo disposizioni STB.
2020PCIE0331	Potenziamento rete acquedotto a servizio loc. San Genesio	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	200.000	200.000	0	200.000	705	0	705	-199.295	-99%	Completato progetto esecutivo.
2020PCIE0332	Razionalizzazione sistema fognario e depurativo in loc. Fornello	DEPURAZIONE	Ziano Piacentino	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	-250.000	-100%	Progetto in fase di completamento.
2020PCIE0333	Interramento tubazione in ribalta in loc. Case Foschi e potenziamento condotta loc. Bettolarga	ACQUEDOTTO	Travo	100.000	100.000	0	100.000	3.979	0	3.979	-96.021	-96%	Costi di progettazione
2020PCIE0334	Rifacimento rete acquedotto via Polezzera	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0335	Razionalizzazione sistema fognario loc. Settima di Gossolengo	DEPURAZIONE	Gossolengo	120.000	120.000	0	120.000	7.801	0	7.801	-112.199	-93%	Progetto in corso, in attesa di autorizzazioni
2020PCIE0336	Rifacimento rete acquedotto Via dei Mille	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0337	Sostituzione rete idrica in loc. Vesimo	ACQUEDOTTO	Zerba		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PCIE0338	Adeguamento reticolo fognario zona Via King	FOGNATURA	Sarmato	200.000	0	0	0	1.933	0	1.933	1.933	100%	Anticipati costi di progettazione.
2020PCIE0339	Serbatoi Pensili - Demolizioni e Ricostruzioni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	1.638	0	1.638	-198.362	-99%	Lo studio è stato rallentato per dare spazio ad interventi più urgenti ed è in fase di chiusura.
2020PCIE0340	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	1.487	0	1.487	1.487	100%	In questa voce sono stati rendicontati i costi derivanti da code di interventi e i contributi ricevuti dalla Protezione Civile.
2020PCIE0341	Sostituzione rete idrica in Via Nespi	ACQUEDOTTO	Gragnano Trebbiense	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021PCIE0342	Rifacimento Collettore Fognario in Loc Capannette di Pej	FOGNATURA	Zerba	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2021PCIE0343	Rifacimento reti acquedotto e fognatura in Viale Amendola	FOGNATURA	Castel San Giovanni	1.000.000	215.000	0	215.000	847.529	0	847.529	632.529	294%	Lavori in corso di ultimazione.
2021PCIE0344	Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo Nord • Via Papa Giovanni XXIII	ACQUEDOTTO	Travo	130.000	65.000	0	65.000	150.179	0	150.179	85.179	131%	Lavori in corso.
2021PCIE0345	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Fiorenzuola-Castell'Arquato - Via Dieci, Fiorenzuola	ACQUEDOTTO	Fiorenzuola	190.000	0	160.000	160.000	136.821	0	136.821	-23.179	-14%	
2021PCIE0346	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Castell'Arquato - Lugagnano, Vernasca, Gropparello - Partitore di Castell'Arquato	ACQUEDOTTO	Castell'Arquato	160.000	0	130.000	130.000	50.838	0	50.838	-79.162	-60%	Lavori in corso.
2021PCIE0347	Completamento intervento sulla rete di distribuzione in Comune di Lugagnano - Impianto di rilancio Rustigazzo, Lugagnano	ACQUEDOTTO	Lugagnano Val d'Arda	70.000	0	50.000	50.000	60.940	0	60.940	10.940	21%	Lavori in corso.
2021PCIE0348	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Castel San Giovanni . Impianto di rilancio Moretta, Castel San Giovanni	ACQUEDOTTO	Castel San Giovanni	75.000	0	55.000	55.000	123.425	0	123.425	68.425	124%	Rispetto a quanto previsto ad inizio progetto, a causa dell'aggravarsi della siccità, per risolvere i problemi della zona collinare di Castel San Giovanni è stato necessario intervenire anche su altri impianti differenti da Moretta ma sempre appartenenti allo stesso comparto acquedottistico
2021PCIE0349	Completamento intervento sulla rete di distribuzione Ziano Piacentino - Tubazione di interconnessione tra rete di Ziano Piacentino e località Tassara (Alta Val Tidone)	ACQUEDOTTO	Ziano Piacentino	200.000	0	180.000	180.000	148.944	0	148.944	-31.056	-17%	
2021PCIE0350	Completamento intervento sulla rete di distribuzione di Pecorara - Tubazione di interconnessione tra Serb. Costalta e località Casa Rossa in Comune di Pecorara	ACQUEDOTTO	Pecorara	200.000	0	180.000	180.000	239.650	0	239.650	59.650	33%	Lavori terminati nel 2022. Maggiori costi per compensazioni caro materiali.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Piacenza

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PIACENZA n. 3 del 15/03/2018, modificato con Delibera n. 2 del 30/04/2020			Consuntivo rendicontato dal 01/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		Note giustificative
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo - pianificato lordo	% investimenti consuntivati - investimenti pianificati	
2022PCIE0351	Ottimizzazione delle sorgenti della Alta Val Tidone per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Alta Val Tidone	90.000	0	90.000	90.000	3.093	0	3.093	-86.907	-96%	L'intervento non è stato realizzato nei tempi previsti dal finanziamento a causa della contemporaneità per l'impresa con altri interventi dell'emergenza idrica. L'inizio lavori sarebbe slittato troppo avanti con conseguente mancato rispetto dei tempi di rendicontazione.
2022PCIE0352	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Bobbio per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Bobbio	300.000	0	300.000	300.000	254.307	0	254.307	-45.693	-15%	
2022PCIE0353	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Ferriere per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Ferriere	100.000	0	100.000	100.000	65.123	0	65.123	-34.877	-34%	Lavori in corso. I lavori saranno completati nel 2023
2022PCIE0354	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Morfasso per raggiungere la piena produttività e nuovo collegamento con le sorgenti Erpesina	ACQUEDOTTO	Morfasso	150.000	0	150.000	150.000	37.739	0	37.739	-112.261	-74%	Lavori in corso. I lavori saranno completati nel 2023
2023PCIE0355	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0	0%	
					<b>Importo netto pianificato 2022</b>	<b>Contributi pianificati 2022</b>	<b>Importo lordo pianificato 2022</b>	<b>Investimento gestore consuntivo 2022</b>	<b>Contributi consuntivo 2022</b>	<b>Importo lordo consuntivo 2022</b>	<b>Valore consuntivo lordo - pianificato lordo</b>	<b>PERCENTUALE INVESTIMENTI CONSUNTIVATI RIPETTO ALL'IMPORTO PIANIFICATO esclusi investimenti di struttura</b>	
<b>Importo Totale</b>					<b>17.700.514</b>	<b>2.038.076</b>	<b>19.738.590</b>	<b>31.898.873</b>	<b>582.750</b>	<b>32.481.624</b>	<b>12.743.034</b>		
<b>Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura</b>					<b>16.463.837</b>	<b>2.038.076</b>	<b>18.501.913</b>	<b>29.511.283</b>	<b>581.766</b>	<b>30.093.049</b>	<b>11.591.136</b>	<b>163%</b>	



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza

F.to Franco Albertini

Il segretario verbalizzante

F.to Marialuisa Campani

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 26 gennaio 2024

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna
