

CLPR/2024/02 del 28 marzo 2024

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022**

IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi

CLPR/2024/02

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2024** il giorno **28** del mese di **marzo** alle ore **14:00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato con lettera Prot. 18/03/2024.0002990.U, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA				10
ALBARETO	Davide Riccoboni	Sindaco	Sì	0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	Sindaco	Sì	0,7699
BERCETO				0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO				1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dellavalle	Assessore, delegato	Sì	2,8389
COLORNO				1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	Sindaco	Sì	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Del Sante	Sindaco	Sì	0,5175
FELINO				1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	Assessore, delegato	Sì	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	Consigliere, delegato	Sì	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Michela Zanetti	Sindaco	Sì	1,263
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557
MONTECHIARUGOLO				2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI				0,8188
NOCETO				2,5636
PALANZANO	Ermes Boraschi	Sindaco	Sì	0,3939

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PARMA	Gianluca Borghi	Assessore, delegato	Sì	35,599
PELLEGRINO PAR.SE	Enrico Ferraroni	Consigliere, delegato	Sì	0,377
POLESINE - ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA				0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	Assessore, delegato	Sì	1,2519
SALSOMAGGIORE TERME	Michela Bonini	Assessore, delegato	Sì	3,7795
S. SECONDO PAR.SE	Francesco Ilardo	Vicesindaco, delegato	Sì	1,247
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	Assessore, delegato	Sì	1,6113
SOLIGNANO	Thomas Villani	Assessore, delegato	Sì	0,5112
SORAGNA				1,0636
SORBOLO MEZZANI				2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA				0,2996
VARANO DE' MELEGARI				0,67
VARSI	Angelo Peracchi	Sindaco	Sì	0,4083

Presenti n. 17 quote 58,0679
Assenti n. 28 quote 41,9321

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.6 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Ireti S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;
- con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e l’aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;
- la deliberazione n. 64/2022, modificata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:
 - entro il mese di maggio dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2022 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2022, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;

rilevato inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2022;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli **palesi ed unanimi** resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore Ireti S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 28 marzo 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 28 marzo 2024

Il Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Marialuisa Campani

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale

Servizio Idrico Integrato
Gestore IRETI S.p.A.
Sotto Ambito Parma
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2022

Marzo 2024

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo per l'annualità 2022 del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022, che il gestore IRETI ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 84/2022.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
GESTORE	19.963.344	22.899.990	2.936.646	115%
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	1.105.281	542.038	-563.243	49%
TOTALE	21.068.625	23.442.028	2.373.403	111%

Tabella 1 - Confronto tra pianificato e rendicontato nel 2022 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura pianificati per l'anno 2022 ammontano ad €. 1.383.666, mentre a consuntivo ne sono stati contabilizzati €. 2.656.717, compresa una quota pari ad €. 1.284, relativa ad ecoincentivi per l'acquisto di mezzi. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

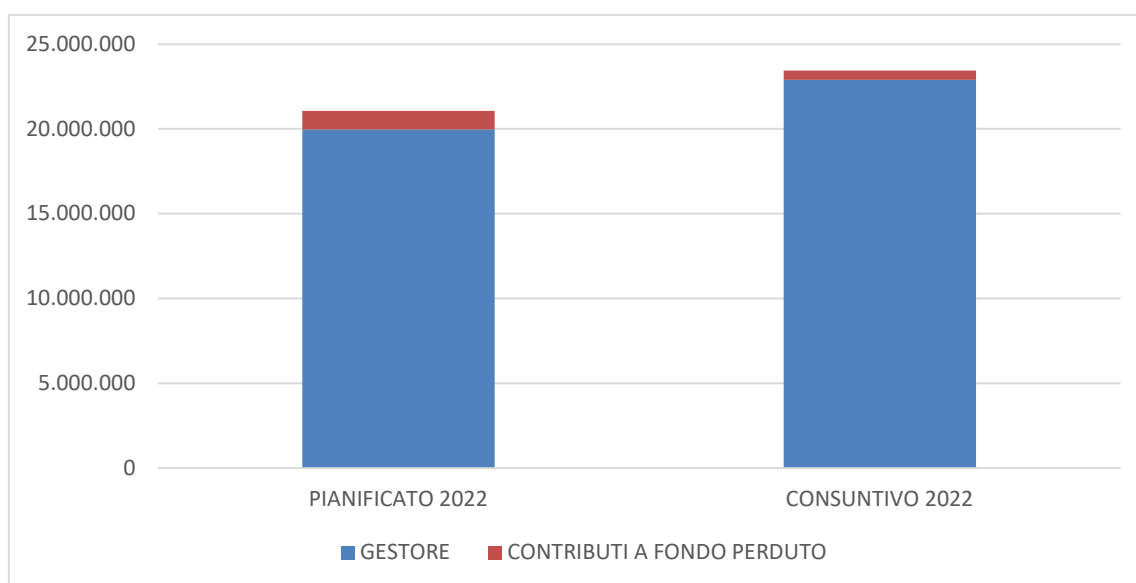


Figura 1 - Confronto tra pianificato e consuntivo 2022

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato e pari al 115% del pianificato, con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore all'importo pianificato e si attesta al 49%. Complessivamente la percentuale dell'importo degli investimenti realizzati rispetto all'importo pianificato è pari al 111%.

I minori contributi incassati sono riferiti ai lavori di seguito elencati:

CODICE	TITOLO	COMUNI	CONTRIBUTI NON INCASSATI
2022PRIA0229	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Calestano per raggiungere la piena produttività - Emergenza idrica 2022	Calestano	250.000
2022PRIA0230	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Langhirano per raggiungere la piena produttività- Emergenza idrica 2022	Langhirano	90.000
2022PRIA0231	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Palanzano per raggiungere la piena produttività- Emergenza idrica 2022	Palanzano	90.000
2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	Calestano	70.000
2019PRIA0166	Nuovi Allacci	Opere pluricomunali	86.749
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	Opere pluricomunali	5.500
2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	Collecchio	112.964
TOTALE			705.213

Tabella 2- Interventi con minor incasso del contributo

Al contrario, sul cod. 2014PRIA0104 143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati, sono stati incassati maggiori contributi per €. 141.970.

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
ACQUEDOTTO	14.118.625	15.191.284	1.072.659	108%
DEPURAZIONE	3.210.000	3.527.263	317.263	110%
FOGNATURA	3.560.000	4.537.492	977.492	127%
STRUTTURA	1.383.666	2.656.717	1.273.051	192%
TUTTI	180.000	185.989	5.989	103%
Totale complessivo	22.452.291	26.098.744	3.646.453	116%

Tabella 3 - Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

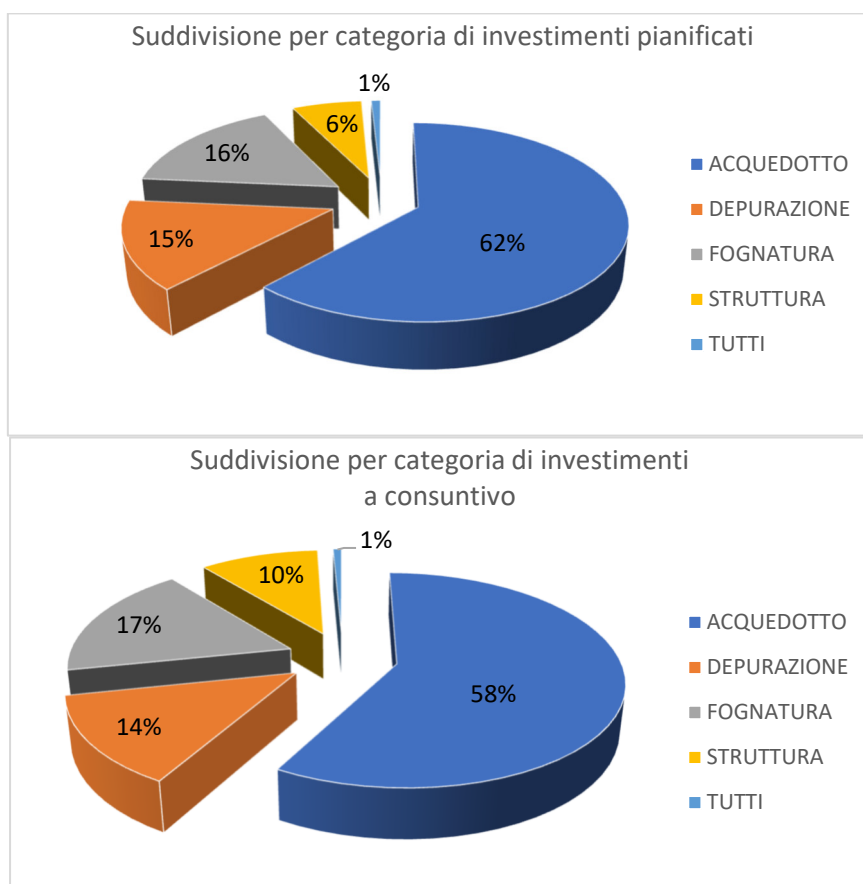


Figura 2-Suddivisione investimenti 2022 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
ACQUEDOTTO	4.000.000	6.818.659	2.818.659	170%
FOGNATURA	1.500.000	2.653.582	1.153.582	177%
DEPURAZIONE	1.200.000	2.196.731	996.731	183%
ACQUE METEORICHE	150.000	0	-150.000	0%
TOTALE	6.850.000	11.668.972	4.818.972	170%

Tabella 4- Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per queste ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2022 è legato al fatto che non sono emerse criticità.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

€.	N.	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	CONS. VS PIAN.
<i>Fino a 500.000</i>	102	3.415.000	1.828.478	-1.586.522	54%
<i>500.001-1.000.000</i>	19	1.135.000	1.010.629	-124.371	89%
<i>1.000.001-2.000.000</i>	14	1.035.000	1.531.334	496.334	148%
<i>2.000.001-5.000.000</i>	10	1.300.000	538.363	-761.637	41%
<i>Oltre 5.000.000</i>	4	1.000.000	1.047.977	47.977	105%
<i>Manutenzioni e titoli cumulativi</i>	23	13.183.625	17.485.247	4.301.622	133%
TOTALE	172	21.068.625	23.442.028	2.373.403	111%
<i>Investimenti di struttura</i>	1	1.383.666	2.656.717	1.151.898	192%
TOTALE	173	22.452.291	26.098.745	3.646.454	116%

Tabella 5– Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad altri già avviati;
- Interventi che non ricadono tra quelli in infrazione, ritenuti prioritari a causa dell'adeguamento degli scarichi previsto dalla normativa;
- Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche;
- Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione;
- Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative.

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir si è resa disponibile ad avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006 per l'approvazione dei progetti per i quali sono presenti procedimenti espropriativi o che comportino particolari difficoltà.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 86

Numero di interventi rendicontati (importo lordo a consuntivo diverso da zero) nel 2022: 99.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022
<i>Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)</i>	28	2.425.000	0
<i>Interventi con avvio anticipato nel 2022 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)</i>	41	0	1.871.558
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%</i>	55	16.577.291	20.697.642
<i>Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%</i>	3	3.450.000	3.529.544

Tabella 6-Scostamenti tra il rendicontato e il pianificato

Si può notare come molti degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI NON AVVIATI

Di seguito l'elenco degli interventi non avviati nell'annualità 2022:

Codice	TITOLO	COMUNI	IMPORTO PIANIFICATO 2022
2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	150.000
2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	Medesano	150.000
2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi	Monchio delle Corti	30.000
2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	Monchio delle Corti	20.000
2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	Parma	40.000
2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	Parma	10.000
2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	Palanzano	100.000
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	Parma	10.000
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	Parma	10.000
2020PRIA0173	Ampliamento campo pozzi Vignale	Traversetolo	50.000
2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	Opere pluricomunali	150.000
2020PRIA0180	Sistemazione fognatura e sollevamento Via Santi/Caselli Chiozzola	Sorbolo	20.000
2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di	Opere pluricomunali	100.000

	piena Parma e Provincia		
2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	Parma	180.000
2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	Noceto	125.000
2020PRIA0203	Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione del comune di Parma	Parma	50.000
2020PRIA0205	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Masdone con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico	Traversetolo	50.000
2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo	100.000
2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	Collecchio, Felino, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Traversetolo	70.000
2022PRIA0220	Opere di razionalizzazione sistema acquedottistico Lesignano De Bagni	Lesignano de Bagni	200.000
2022PRIA0221	Nuovo campo pozzi e centrale Parma Sud Ovest	Parma	100.000
2022PRIA0223	Rifacimento condotta idrica centrale di Masdone	Traversetolo	100.000
2022PRIA0224	Manutenzione straordinaria e sistemazione accessibilità al Serbatoio Sesta Superiore	Corniglio	50.000
2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	Calestano	320.000
2022PRIA0226	Nuovo serbatoio acqua potabile Madonnina di Castrignano	Langhirano	100.000
2022PRIA0227	Estendimento fognario Strada Cartiera a Vigatto - studio di fattibilità	Parma	25.000
2022PRIA0228	Estendimento fognario Via Setti - Via Rocchi - studio di fattibilità	Parma	25.000
2022PRIA0230	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Langhirano per raggiungere la piena produttività- Emergenza idrica 2022	Langhirano	90.000

Tabella 7-Interventi non avviati

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0001	153EN - Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini, Montechiarugolo, Traversetolo, Parma	1.000.000	100.000	0	100.000	8.310	0	8.310	-91.690	-91%	Si era prevista la realizzazione di un nuovo pozzo a Velago, ma si attende di avere maggiore consapevolezza a seguito dei lavori di sistemazione del campo pozzi di Vignale
2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000	75.000	0	75.000	38	0	38	-74.962	-99%	L'opera è susseguente alla definizione delle potenzialità di emungimento aggiuntive dai nuovi pozzi previsti dal titolo precedente. Si è sospesa la progettazione definitiva.
2014PRIA0003	11AG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	ACQUEDOTTO	Calestano	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	ACQUEDOTTO	Calestano, Felino, Sala Baganza	2.500.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	
2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	DEPURAZIONE	Collecchio	3.100.000	-112.964	112.964	0	222.578	0	222.578	222.578	100%	L'andamento costi ha seguito l'andamento del cantiere che è rimasto sospeso per un certo periodo ed è pertanto in ritardo sull'ultimazione. Cantiere attualmente in corso con previsione di ultimazione nel 2023
2014PRIA0007	31AG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	ACQUEDOTTO	Collecchio	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	ACQUEDOTTO	Corniglio	500.000	150.000	0	150.000	251.128	0	251.128	101.128	67%	Lo sviluppo del progetto ha subito ritardi per l'ottenimento dei permessi e per il periodo invernale non era accessibile l'area per poter fare rilievi e prove geologiche, il cantiere è iniziato e i costi sono in funzione dell'andamento effettivo dei lavori
2014PRIA0009	41AG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	ACQUEDOTTO	Corniglio	70.000	0	0	0	42.734	0	42.734	42.734	100%	Sviluppo nuovo progetto ed indagini geotecniche. Il QE cambierà notevolmente a circ a1M- per le opere geotecniche necessarie
2014PRIA0012	24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	
2014PRIA0013	61AG - Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa	DEPURAZIONE	Corniglio	140.000	80.000	0	80.000	6.503	0	6.503	-73.497	-91%	Avviata la progettazione definitiva
2014PRIA0014	71AG - Sistema depurativo in località Tre Rii e località Torre Tre Rii	DEPURAZIONE	Corniglio	100.000	10.000	0	10.000	1.800	0	1.800	-8.200	-81%	CAMB64 franchigia 20.000- se scostamento < 100
2014PRIA0015	81AG - Sistema depurativo in Località Signatico	DEPURAZIONE	Corniglio	150.000	0	0	0	429	0	429	429	100%	
2014PRIA0016	91AG - Sistema depurativo località Petrignacola	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	0	0	0	429	0	429	429	100%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0020	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	DEPURAZIONE	Fontevivo, Noceto	4.661.173	600.000	0	600.000	21.227	0	21.227	-578.773	-96%	Ritardo nell'affidamento lavori dovuti al ritrovamento di ordigni bellici a seguito di indagine. Rispetto all'esecuzione dell'opera si sta valutando slittamento temporale nel prossimo POI per altre priorità (depuratore Corcagnano, Collecchio)
2014PRIA0023	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli; località Strognano; località Cozzano con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Langhirano	260.000	0	0	0	476	0	476	476	100%	
2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	DEPURAZIONE	Langhirano	2.000.000	50.000	0	50.000	657	0	657	-49.343	-98%	Minori spese progettuali e di indagine rete fognaria
2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	-100%	l'attività è da ripianificare al seguito della realizzazione delle opere Gallerie Braia e Serbatoio Le Olive
2014PRIA0026	15IAG - Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	DEPURAZIONE	Lesignano de Bagni	614.359	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	ACQUEDOTTO	Medesano	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	-100%	Progetto defuito non più prioritario da operations, da ripianificare in futuro POI 24-27
2014PRIA0029	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	FOGNATURA	Medesano	550.000	0	0	0	279.015	0	279.015	279.015	100%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0030	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	FOGNATURA	Medesano	600.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	
2014PRIA0032	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Collecchio, Medesano, Noceto	1.901.943	250.000	0	250.000	557.791	0	557.791	307.791	123%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0033	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla-ATO-IREN	ACQUEDOTTO	Collecchio, Noceto, Medesano	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	ACQUEDOTTO	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	472.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	-100%	Progettazione definitiva conclusa. Ritardo nell'avvio del cantiere dovuta ai nuovi importi emersi e alla difficile soluzione progettuale. Opere da rivedere nel sua pianificazione/fattibilità

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	112.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	Progettazione definitiva in fase di conclusione (in revisione parte urbanistica). In ritardo l'avvio dell'iter autorizzativo
2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	520.000	60.000	0	60.000	2.407	0	2.407	-57.593	-95%	Progettazione definitiva in fase di conclusione (in revisione parte urbanistica). In ritardo l'avvio dell'iter autorizzativo
2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000	0	0	0	16.448	0	16.448	16.448	100%	Code lavori anno precedente
2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	ACQUEDOTTO	Monchio delle Corti	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto - 1° stralcio	DEPURAZIONE	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	15.988.000	500.000	0	500.000	178.604	0	178.604	-321.396	-64%	Costi relativi alla fine della fase progettuale e di verifica e per la predisposizione degli atti di Gara. Opera poi provata ad inserire nel finanziamento PNRR
2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	70.000	0	0	0	1.808	0	1.808	1.808	100%	costi progettazione, la definizione della posizione rimane complicata per i difficili rapporti con l'attuale proprietario del terreno.
2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	150.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	
2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	1.400.000	0	0	0	560.050	0	560.050	560.050	100%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0052	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	200.000	200.000	0	200.000	343	0	343	-199.657	-99%	Progetto della strada di accesso sviluppato, inviato al comune per loro valutazione, non ancora ricevuta. Sviluppo progetto serbatoio vincolato da problemi regolarizzazione proprietà e costi esecutivi.
2014PRIA0055	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio dei Comuni di Neviano; Traversetolo; Montechiarugolo - 1° stralcio (1° e 2° lotto)	FOGNATURA	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	9.000.000	400.000	0	400.000	865.938	0	865.938	465.938	116%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0056	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	DEPURAZIONE	Noceto	623.979	0	0	0	14.644	0	14.644	14.644	100%	Ultimazione attività su impianto Elettrico
2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	FOGNATURA	Noceto	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0059	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	5.350.000	100.000	0	100.000	3.435	0	3.435	-96.565	-96%	costi relativi al monitoraggio qualità acque. L'intervento è da rivedere completamente nella sua idea nella revisione del POI
2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	DEPURAZIONE	Parma	2.400.000	0	0	0	267.562	0	267.562	267.562	100%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0062	44IAG - Collettamento Baganzola e depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000	60.000	0	60.000	26.267	0	26.267	-33.733	-56%	Costi progettuali inferiori a quanto previsto.
2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151	0	0	0	476	0	476	476	100%	
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000	0	0	0	44.589	0	44.589	44.589	100%	code cantiere anno precedente
2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	425.138	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0068	49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio per risoluzione problema nitrati	ACQUEDOTTO	Parma	470.000	30.000	0	30.000	1.894	0	1.894	-28.106	-93%	Costi dovuti a sopralluoghi e revisione progettuale. Cantiere in ritardo nell'attuazione per pianificazione altri interventi. Realizzazione prevista nel 2024
2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	FOGNATURA	Parma	2.000.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	
2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicopò via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	96.850	0	96.850	96.850	100%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	470.000	0	0	0	488	0	488	488	100%	
2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura - opera comp. A7	FOGNATURA	Parma	1.000.000	100.000	0	100.000	21.756	0	21.756	-78.244	-78%	in corso sviluppo progettuale del secondo stralcio per arrivare alla località martorano

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0083	95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	ACQUEDOTTO	Parma	985.966	150.000	0	150.000	547.807	0	547.807	397.807	265%	Si è proseguito con notevole velocità in lavoro di distrettualizzazione che era stato fortemente sviluppato nel corso dei precedenti due anni. Sono stati creati nuovi distretti permettendo il raggiungimento della copertura di quasi totale della rete.
2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	110.000	0	0	0	3.818	0	3.818	3.818	100%	adeguamenti all'impianto elettrico
2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Parma	20.038	25.000	0	25.000	30.414	0	30.414	5.414	21%	CAMB64 franchigia 20.000- se scostamento < 100
2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	FOGNATURA	Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza, Calestano, Fonteviso, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto	120.000	30.000	0	30.000	1.153	0	1.153	-28.847	-96%	Sviluppo modelli limitato nell'annualità 2022
2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	ACQUEDOTTO	Parma, Fonteviso, Noceto	936.180	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.620	0	0	0	175.378	0	175.378	175.378	100%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2014PRIA0092	119EN - Ampliamento depuratore Sorbolo	DEPURAZIONE	Sorbolo	2.204.646	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	DEPURAZIONE	Traversetolo		0	0	0	0	0	0	0	0%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		4.000.000	0	4.000.000	6.818.659	0	6.818.659	2.818.659	70%	Maggiori costi dovuti, tra gli altri, a: _ interventi di rifacimento reti, tra cui le più onerose sul comune di Parma. _ Sono state eseguite diverse manutenzioni di impianti come sorgenti, impianti di trattamento, pompaggi e serbatoi _ Come l'anno precedente si sono svolte campagne massive di ricerca perdite che hanno dato luogo a numerosi rifacimenti di derivazioni d'utenza, principalmente nei comuni di SORBOLO-MEZZANI, PARMA, SALA BAGANZA, MEDESANO e NEVIANO. _ Sono stati sostituiti numerosi gruppi di manovra nei comuni di PARMA, MEDESANO e FELINO.
2014PRIA0096	72IAG - Manutenzioni straordinarie	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		1.500.000	0	1.500.000	2.653.582	0	2.653.582	1.153.582	76%	Maggiori costi dovuti a: rifacimento totale della copertura del digestore 1 del depuratore Parma Ovest: tale intervento ha comportato maggiori costi preventivati in quanto la copertura era più danneggiata del previsto e gli interventi di riparazione sono stati molteplici; causa problematiche odorigene si è reso necessario mantenere e rifare parte dei vecchi bioessicatori del depuratore Parma Ovest; maggiori costi dei preventivati per effettuare il completo revamping del depuratore di Cazzola Via Brizzi (Traversetolo); maggiori costi per rifare la rete di cavidotti del depuratore Parma Ovest afferente alla rete pozzi esistente; per intervento in emergenza si è reso necessario rifare l' impianto elettrico e quadro elettrico del decanter Perialisi del depuratore di Fontevivo; maggiori costi per il rifacimento del locale quadro elettrico del depuratore di Fontevivo, danneggiato in seguito a incendio; ingenti spese per la resinatura di alcune passerelle delle linee biologiche del depuratore Parma Ovest
2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	21.966.088	1.200.000	0	1.200.000	2.196.731	0	2.196.731	996.731	83%	Maggiori costi dovuti a: rifacimento di numerosi tratti fognari ammalorati che rischiavano il collassamento della struttura stradale, rifacimento di numerosi tratti fognari fessurati che causavano infiltrazioni, manutenzione straordinaria impianti di sollevamento, a seguito di ricerche programmate e ispezioni
2014PRIA0098	74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo	1.063.273	150.000	0	150.000	177.413	0	177.413	27.413	18%	
2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	928.507	0	928.507	728.507	364%	Importi conseguenti alle richieste pervenute.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	FOGNATURA	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	2.474	0	2.474	-197.526	-98%	Importi conseguenti alle richieste pervenute
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	330.000	50.000	0	50.000	118.855	0	118.855	68.855	137%	Realizzati interventi secondo necessità
2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	DEPURAZIONE	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	1.321.043	50.000	0	50.000	16.805	0	16.805	-33.195	-66%	Realizzati interventi secondo necessità
2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	505.078	50.000	0	50.000	5.402	0	5.402	-44.598	-89%	Realizzati interventi secondo necessità
2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		25.000	25.000	50.000	179.481	166.970	346.451	296.451	592%	Trattasi di opere a preventivo ricevute da privati e comuni/enti per la risoluzione di interferenze con loro opere. Gli importi sono conseguenti alle richieste pervenute

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		25.000	25.000	50.000	104.651	19.500	124.151	74.151	148%	Trattasi di opere a preventivo ricevute da privati e comuni/enti per la risoluzione di interferenze con loro opere. Gli importi sono conseguenti alle richieste pervenute
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua - Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		100.000	0	100.000	257.603	0	257.603	157.603	157%	Realizzati interventi secondo necessità
2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	114	0	114	-49.886	-99%	Realizzati interventi secondo necessità
2016PRIA0108	Complesso acquedottistico relativo all'impianto di trattamento acqua delle gallerie Braia e dei pozzi Fabiola	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino	3.250.000	600.000	0	600.000	26.500	0	26.500	-573.500	-95%	Costi relativi alla fine della fase autorizzativa (CDS) conclusasi in ritardo rispetto a quanto pianificato. L'opera è in ritardo rispetto ai tempi previsti sull'esecuzione. Ripianificazione prevista nel POI 24-27
2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0111	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0113	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	280.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000	-100%	Non sono state rilevate necessità di intervento nel corso del 2022
2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettore Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	attesa stralcio dello studio fatto dal Comune per capire cosa si deve verificare
2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	16.702	0	16.702	16.702	100%	Fine lavori impianto elettrico
2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		50.000	0	50.000	38	0	38	-49.962	-99%	Sono interventi che vengono realizzati in funzione delle necessità che si presentano durante l'anno, non è sistematica la spesa prevista a piano.
2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000	0	0	0	2.994	0	2.994	2.994	100%	
2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo	100.000	0	0	0	38	0	38	38	100%	errore imputazione su WBS non chiusa
2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	1.500.000	50.000	0	50.000	16.268	0	16.268	-33.732	-67%	Avviata procedura espropriativa da parte dell'amministrazione comunale. Tempi di realizzazione condizionati dalla contestuale esecuzione della pista ciclabile da parte del Comune
2016PRIA0130	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali		40.000	0	40.000	1.430	0	1.430	-38.570	-96%	Importo lavori in funzione delle richieste pervenute
2016PRIA0131	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST; PR EST; FELINO	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	100.000	0	0	0	18.287	0	18.287	18.287	100%	Coda lavori anni precedenti
2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0134	73IAG - Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0135	80IAG - RISTRUTTURAZIONE/manutenzione straordinaria ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb. Manzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	950.000	100.000	0	100.000	22.609	0	22.609	-77.391	-77%	Risolta la diatriba con i proprietari. L'opera dovrà però essere realizzata successivamente alla realizzazione del titolo Gallerie Braia per motivi legati alla nuova distrettualizzazione dell'abitato. Ripianificare in POI 24-27

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2016PRIA0139	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	ACQUEDOTTO	Palanzano	50.000	0	0	0	6	0	6	6	100%	errore imputazione
2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	20.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Attività non ritenuta più necessaria Variazione nel POI 24-27
2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogrosso	DEPURAZIONE	Palanzano	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	attesa stralcio dello studio fatto dal Comune per capire cosa si deve verificare
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	-100%	attesa stralcio dello studio fatto dal Comune per capire cosa si deve verificare
2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000	150.000	0	150.000	231.990	0	231.990	81.990	54%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2016PRIA0157	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto; Reno di TIZZANO; Caprioglio	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	500.000	0	0	0	922	0	922	922	100%	
2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2018PRIA0160	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		880.000	0	880.000	240.451	0	240.451	-639.549	-72%	Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa delle forniture intermittenti nella prima parte del 2022, anche per il contesto macroeconomico complesso; nel secondo semestre gli installatori non sono riusciti a riassorbire quindi il ritardo accumulato nel I semestre.
2018PRIA0161	Sostituzione reti idriche fuganti via Tommasicchio-Don Corchia	ACQUEDOTTO	Langhirano	150.000	0	0	0	496	0	496	496	100%	
2018PRIA0162	Sostituzione rete idrica fugante in strada Argini NORD	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	150.000	0	0	0	703	0	703	703	100%	
2018PRIA0163	Sostituzione reti idriche fuganti zona Passo del Bocco	ACQUEDOTTO	Parma	300.000	0	0	0	1.042	0	1.042	1.042	100%	
2018PRIA0164	Sostituzione reti idriche fuganti zona Strada Massese	ACQUEDOTTO	Tizzano Val Parma	200.000	0	0	0	278	0	278	278	100%	

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	DEPURAZIONE	Traversetolo	533.838	100.000	0	100.000	28.782	0	28.782	-71.218	-71%	Costi relativi a chiusura progettazione e ottenimento autorizzazioni
2019PRIA0166	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		771.308	442.317	1.213.625	198.781	355.568	554.349	-659.276	-54%	Interventi realizzati in funzione delle richieste ricevute
2019PRIA0167	Opere di difesa spondale per la protezione del Campo Pozzi di Velago	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0169	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		1.383.666	0	1.383.666	2.655.432	1.284	2.656.717	1.273.051	92%	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti per la gestione dell'utenza (progetto IREN WAY)
2020PRIA0170	Progettazione sistema acquedottistico Fragno (serb+pompaggio+reti)	ACQUEDOTTO	Calestano	1.000.000	25.000	0	25.000	552	0	552	-24.448	-97%	Progetto da rivedere negli onbiettivi con Operations. Costi imputati per ospralluoghi
2020PRIA0171	Adeguamento serbatoio Quinzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	200.000	200.000	0	200.000	38	0	38	-199.962	-99%	Gravi problemi geotecnici rilevati, bloccato progetto per aumento costi eccessivo, valutazione se possibile delocalizzare in area più stabile.
2020PRIA0172	Nuovo serbatoio Cardale loc. Beduzzo	ACQUEDOTTO	Corniglio	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0173	Ampliamento campo pozzi Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	125.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	NON AVVIATO iter autorizzativo a causa di mancata firma da parte del Comune dell'acquisizione bonaria del Terreno. La disputa si è protratta per tutto l'anno e risolta solo col cambio dirigente nel 2023
2020PRIA0174	Rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Medesano	2.500.000	0	0	0	457	0	457	457	100%	Costi personale interno coinvolto nelle progettazioni
2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali		150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	-100%	Realizzati interventi secondo necessità
2020PRIA0176	Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		3.000.000	0	3.000.000	3.092.462	0	3.092.462	92.462	3%	
2020PRIA0177	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	FOGNATURA	Opere pluricomunali		300.000	0	300.000	259.669	0	259.669	-40.331	-13%	
2020PRIA0178	Rifacimento fognatura camminabile Via Solari tra Piazzale Fiume e Piazzale Barbieri	FOGNATURA	Parma	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0179	Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per razionalizzare gli scarichi in sostituzione della fossa Imhoff esistente	FOGNATURA	Fontevivo	200.000	160.000	0	160.000	378.574	0	378.574	218.574	136%	Code lavori da anno precedente. L'andamento dei costi segue l'avanzamento del cantiere
2020PRIA0180	Sistemazione fognatura e sollevamento Via Santi/Caselli Chiozzola	FOGNATURA	Sorbolo	200.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	-100%	Nessun problema rilevato dalla gestione sul sollevamento. Da escludere in nuova pianificazione POI.

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di piena Parma e Provincia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	800.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Ancora in fase di sperimentazione con posa di Data Logger di vari fornitori in comodato d'uso gratuito. Avviata procedura di gara per forniture data logger definitivi.
2020PRIA0182	Adeguamento impianto di Vairo inferiore	DEPURAZIONE	Palanzano	100.000	0	0	0	819	0	819	819	100%	Sopralluoghi e ore interne per sviluppo progetto e risoluzione diatribe Privati/Amministrazione
2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	350.000	180.000	0	180.000	0	0	0	-180.000	-100%	Importo ridotto in quanto il progetto di riduzione fanghi in oggetto ha subito rallentamenti a causa di problematiche dovute al Covid e interruzioni da parte dello Studio di progettazione per revisioni degli elaborati.
2020PRIA0184	Rifacimento disinfezione depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	200.000	0	0	0	114	0	114	114	100%	
2020PRIA0185	Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0186	Nuovo accumulo fanghi biologici depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0188	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0189	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0190	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore di Felino	DEPURAZIONE	Felino	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0191	Installazione gruppo elettrogeno depuratore Traversetolo capoluogo e rifacimento quadro elettrico	DEPURAZIONE	Traversetolo	120.000	0	0	0	629	0	629	629	100%	
2020PRIA0192	Installazione gruppo elettrogeno al depuratore di Medesano capoluogo	DEPURAZIONE	Medesano	60.000	0	0	0	25.325	0	25.325	25.325	100%	code lavori anni precedenti
2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0194	Ristrutturazione/ delocalizzazione letto percolatore Reno Borghetto	DEPURAZIONE	Tizzano Val Parma	150.000	30.000	0	30.000	2.204	0	2.204	-27.796	-92%	L'intervento è iniziato nel 2021, nei tempi previsti dal POI, con l'esecuzione delle prove geotecniche per la valutazione della stabilità del versante, ha portato alcune spese nel 2022. Dai dati si è rispontrata la non necessità di delocalizzare l'impianto e l'avvio delle fasi di progetto della ristrutturazione. Sarà probabilmente necessaria ripianificazione nel POI 24 -25 la fase realizzativa
2020PRIA0195	Ristrutturazione/delocalizzazione fossa imhoff di Bosco	DEPURAZIONE	Corniglio	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0196	Pretrattamento fanghi biologici Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0197	Potenziamento Centrale Fornello, nuove captazioni, aumento stoccaggio, trattamento	ACQUEDOTTO	Felino	450.000	100.000	0	100.000	227.861	0	227.861	127.861	127%	L'importo speso è 0€. Sono stati caricati erroneamente sul codice atersir i costi dell'opera Sostituzione Rete distribuzione via Cimabue di Langhirano. Fatta fare correzione
2020PRIA0198	Messa fuori esercizio e abbattimento del serbatoio Pensile Ponte Taro sostituito da gruppo di rilancio a pressione	ACQUEDOTTO	Fontevivo	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0199	Adeguamento tecnico e funzionale del telecontrollo di Medesano	ACQUEDOTTO	Medesano	175.000	25.000	0	25.000	79.612	0	79.612	54.612	218%	L'intervento è stato eseguito tra l'annualità 2021 e inizio 2022, la maggior parte della contabilità è entrata nel 2022.
2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	ACQUEDOTTO	Noceto	225.000	125.000	0	125.000	0	0	0	-125.000	-100%	Attività sospesa per altre priorità di code di piano

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	ACQUEDOTTO	Parma	30.000	10.000	0	10.000	38	0	38	-9.962	-99%	CAMB64 franchigia 20.000- se scostamento < 100
2020PRIA0202	Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale Idrica di Marore con nuova impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio e interventi per la riduzione dei consumi energetici e sostituzione membrane	ACQUEDOTTO	Parma	450.000	200.000	0	200.000	138.996	0	138.996	-61.004	-30%	Code lavori anno precedente, sostituzione piping interno ed esterno e sostituzione macchine più efficienti energeticamente.
2020PRIA0203	Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione del comune di Parma	ACQUEDOTTO	Parma	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Realizzati interventi secondo necessità
2020PRIA0204	Interconnessione idraulica acquedotto Sala Baganza e acquedotto Collecchio (rete, impianto di rilancio e Telecontrollo)	ACQUEDOTTO	Sala Baganza, Collecchio	420.000	0	0	0	11.597	0	11.597	11.597	100%	Spese progettuali. Terminato iter per acquisizione bonaria servitù. Opera da ripianificare POI 24-27
2020PRIA0205	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Masdone con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico	ACQUEDOTTO	Traversetolo	450.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Ritardo inizio attività per valutazioni in merito alle priorità di intervento
2020PRIA0206	Manutenzione straordinaria idraulica ed edile della Centrale Idrica di Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	300.000	10.000	0	10.000	20.651	0	20.651	10.651	106%	CAMB64 franchigia 20.000- se scostamento < 100
2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Traversetolo		100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Realizzati interventi secondo necessità
2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Collecchio, Felino, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Traversetolo		70.000	0	70.000	0	0	0	-70.000	-100%	Realizzati interventi secondo necessità
2020PRIA0209	Potenziamento del sistema acquedottistico della località Bassa e della frazione Rivalta	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	900.000	0	0	0	57.003	0	57.003	57.003	100%	Costi dovuti all'adeguamento delle pompe della centrale di mulazzano per il corretto funzionamento dell'acquedotto posate nell'annualità precedente
2020PRIA0210	Adeguamento sistema fognario area urbana canale Galasso	FOGNATURA	Parma		0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0211	Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali		30.000	0	30.000	8.576	0	8.576	-21.424	-71%	costi in funzione delle richieste al di fuori di capitoli già stanziati
2020PRIA0212	Adeguamento sistema fognario zona via Figlie della Croce - via Matteotti - via Boudard	FOGNATURA	Sala Baganza	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0213	Completamento sistema fognario acque nere loc. Castelguelfo	FOGNATURA	Fontevivo	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0214	Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area urbana Via Verona	FOGNATURA	Parma	820.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0215	Completamento rete fognaria Via Ruffini	FOGNATURA	Parma	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0216	Razionalizzazione sistema fognario zona Case Vecchie e Ravadese - studio fattibilità	FOGNATURA	Parma	1.500.000	0	0	0	629	0	629	629	100%	
2020PRIA0217	Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest	FOGNATURA	Parma	60.000	60.000	0	60.000	11.007	0	11.007	-48.993	-81%	Cantiere iniziato a fine anno, contabilizzazioni conseguenti
2020PRIA0218	Razionalizzazione ed estensione sistema fognario e verifica sistema depurativo loc. Quinzano di Sopra	FOGNATURA	Langhirano	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2020PRIA0219	Alimentazione nuova zona industriale Lesignano De Bagni	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	550.000	350.000	0	350.000	22.304	0	22.304	-327.696	-93%	Code lavori anni precedenti
2020PRIA0220	Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker	ACQUEDOTTO	Langhirano	250.000	0	0	0	5.554	0	5.554	5.554	100%	Adeguamenti strutture copertura pozzi
2022PRIA0220	Opere di razionalizzazione sistema acquedottistico Lesignano De Bagni	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	2.000.000	200.000	0	200.000	0	0	0	-200.000	-100%	In attesa di CDS per nuova viabilità del Comune di Lesignano

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

					Programma Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 6 del 15/01/2020, revisionato con Delibera di C.L. N. 12 del 03/05/2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			Scostamento		
Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Investimenti gestore pianificati 2022	Contributi a fondo perduto pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Contributi a fondo perduto consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo	% investimenti consuntivati-investimenti pianificati	Note giustificative
2022PRIA0221	Nuovo campo pozzi e centrale Parma Sud Ovest	ACQUEDOTTO	Parma	2.500.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Opera da ripianificare nel POI 24-27 alla luce delle analisi e alte concentrazioni di manganese rilevate
2022PRIA0222	Reti collegamento pozzi Parma Sud Ovest verso la città	ACQUEDOTTO	Parma	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2022PRIA0223	Rifacimento condotta idrica centrale di Masdone	ACQUEDOTTO	Traversetolo	300.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Importo lievitato a 770'000 rimandato a nuovo POI
2022PRIA0224	Manutenzione straordinaria e sistemazione accessibilità al Serbatoio Sesta Superiore	ACQUEDOTTO	Corniglio	200.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	-100%	Le attività di progettazione sono in corso ma non sono ancora stati emessi SAL e pagamenti.
2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	FOGNATURA	Calestano	320.000	250.000	70.000	320.000	0	0	0	-320.000	-100%	Le attività di progettazione sono in corso ma non sono ancora stati emessi SAL e pagamenti.
2022PRIA0226	Nuovo serbatoio acqua potabile Madonna di Castrignano	ACQUEDOTTO	Langhirano	500.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100.000	-100%	Ritardo dovuto alla trattativa per accordo bonario per cessione area boschiva della parrocchia
2022PRIA0227	Estensione fognario Strada Cartiera a Vigatto - studio di fattibilità	FOGNATURA	Parma	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-25.000	-100%	in ritardo, iniziato nel corso del 2023
2022PRIA0228	Estensione fognario Via Setti - Via Rocchi - studio di fattibilità	FOGNATURA	Parma	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	-25.000	-100%	in ritardo, iniziato nel corso del 2023
2022PRIA0229	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Calestano per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Calestano	250.000	0	250.000	250.000	26.151	0	26.151	-223.849	-89%	Realizzati interventi secondo necessità
2022PRIA0230	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Langhirano per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Langhirano	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0	-90.000	-100%	Realizzati interventi secondo necessità
2022PRIA0231	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Palanzano per raggiungere la piena produttività	ACQUEDOTTO	Palanzano	90.000	0	90.000	90.000	5.137	0	5.137	-84.863	-94%	Realizzati interventi secondo necessità
2023PRIA0232	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore di case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		0	0	0	0	0	0	0	0%	
					Investimenti gestore pianificati 2022	Finanziamenti pubblici pianificati 2022	Importo totale pianificato 2022	Investimenti gestore consuntivo 2022	Finanziamenti pubblici consuntivo 2022	Importo totale consuntivo 2022	Valore consuntivo lordo -pianificato lordo		
Importo Totale					21.347.010	1.105.281	22.452.291	25.555.422	543.323	26.098.744	3.646.453	111%	
Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura					19.963.344	1.105.281	21.068.625	22.899.990	542.038	23.442.028	2.373.403		

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2024

Il Direttore
F.to Vito Belladonna
