

CLPR/2022/25 del 16 novembre 2022

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021**

IL COORDINATORE
F.to Gianluca Borghi

CLPR/2022/25

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2022** il giorno **16** del mese di **novembre** alle ore **14.00** si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011315 del 10/11/2022, in modalità telematica.

Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO				0,5758
BARDI				0,5692
BEDONIA	Gianpaolo Serpagli	SINDACO	SI	0,7699
BERCETO	Luigi Lucchi	SINDACO	SI	0,5593
BORE				0,3246
BORGO VAL DI TARO				1,4068
BUSSETO	Nicolas Passera	ASSESSORE	SI	1,4245
CALESTANO				0,5742
COLLECCHIO	Roberto Dallavalle	ASSESSORE	SI	2,8389
COLORNO	Christian Stocchi	SINDACO	SI	1,8179
COMPIANO	Francesco Mariani	SINDACO	SI	0,3942
CORNIGLIO	Giuseppe Delsante	SINDACO	SI	0,5175
FELINO	Flavio Marchesi	ASSESSORE	SI	1,8579
FIDENZA	Franco Amigoni	ASSESSORE	SI	5,0655
FONTANELLATO	Corrado Modernelli	ASSESSORE	SI	1,4639
FONTEVIVO				1,2124
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	ASSESSORE	SI	1,2630
LANGHIRANO				2,1329
LESIGNANO DE' BAGNI				1,1117
MEDESANO				2,1257
MONCHIO DELLE CORTI				0,3557

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MONTECHIARUGOLO	Daniele Friggeri	SINDACO	SI	2,2112
NEVIANO DEGLI ARDUINI	Raffaella Devincenzi	SINDACO	SI	0,8188
NOCETO	Giovanna Maini	ASSESSORE	SI	2,5636
PALANZANO	Marinella Vicini	ASSESSORE	SI	0,3939
PARMA	Gianluca Borghi	ASSESSORE	SI	35,5990
PELLEGRINO P.SE				0,3770
POLESINE ZIBELLO				0,7607
ROCCABIANCA	Alessandro Gattara	SINDACO	SI	0,7224
SALA BAGANZA	Norberto Vignali	ASSESSORE	SI	1,2519
SALSOMAGGIORE T.	Trevisan Marco	ASSESSORE	SI	3,7795
SAN SECONDO PARMENSE				1,2470
SISSA TRECASALI	Sara Tonini	ASSESSORE	SI	1,6113
SOLIGNANO				0,5112
SORAGNA	Maria Pia Piroli	ASSESSORE	SI	1,0636
SORBOLO MEZZANI	Marco Comelli	ASSESSORE	SI	2,4909
TERENZO				0,4124
TIZZANO VAL PARMA				0,5857
TORNOLO				0,3665
TORRILE				1,5884
TRAVERSETOLO				1,9056
VALMOZZOLA	Claudio Alzapiedi	SINDACO	SI	0,2996
VARANO DE' MELEGARI	Giuseppe Restiani	SINDACO	SI	0,6700
VARSÌ				0,4083
PROVINCIA DI PARMA				10,0000

Presenti n. 24, quote 71,45

Assenti n. 21, quote 28,55

Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione n.41 del Consiglio d'Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di Parma, gestito da Emiliambiente S.p.A.;
- con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d'Ambito è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito del bacino territoriale di Parma;
- con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato": modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017";
- la deliberazione n. 64 del 27 giugno 2022 inoltre dispone che:
 - entro il mese di maggio dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Emiliambiente S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale;

rilevato che i dati presentati relativi all'annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

rilevato che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l'annualità 2021;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/- 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021, come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, **palesi ed unanimi**

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 25 del 16 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2021.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Bologna, 16 novembre 2022

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO
2021**

**GESTORE: Emiliambiente S.p.a.
BACINO PROVINCIALE DI PARMA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 05 del 15/01/2020, che il gestore Emiliambiente ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
GESTORE	3.600.000	3.879.821,11	279.821,11	108%
SOCIETÀTERZE	//	//	//	//
FINANZIAMENTI PUBBLICI	665.000	335.976,39	-329.023,61	51%
TOTALE	4.265.000	4.215.797,50	-49.202,50	99%

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 (esclusi gli investimenti di struttura)

Gli investimenti di struttura per l'anno 2021 ammontano ad €. 217.271,11. Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2022.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente, abbia effettuato nel corso del 2021 investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 108% con riferimento a quelli direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato e pari al 51%. Complessivamente la percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 99%.

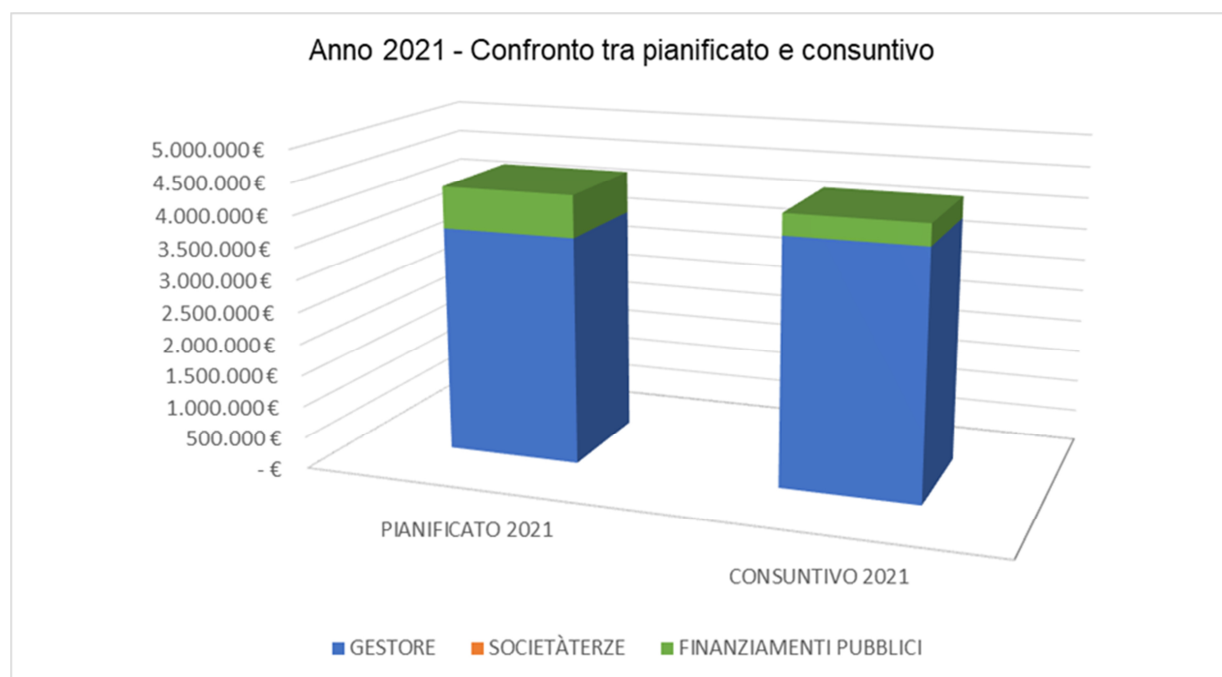


FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	3.625.000,00	3.281.974,75	-343.025,25	91%
DEPURAZIONE	200.000,00	474.454,51	274.454,51	237%
FOGNATURA	370.000,00	459.368,24	89.368,24	89%
ACQUE METEORICHE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0%
TUTTI	20.000,00	0,00	-20.000,00	0%
TOTALE	4.265.000	4.215.797,50	-49.202,50	99%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:

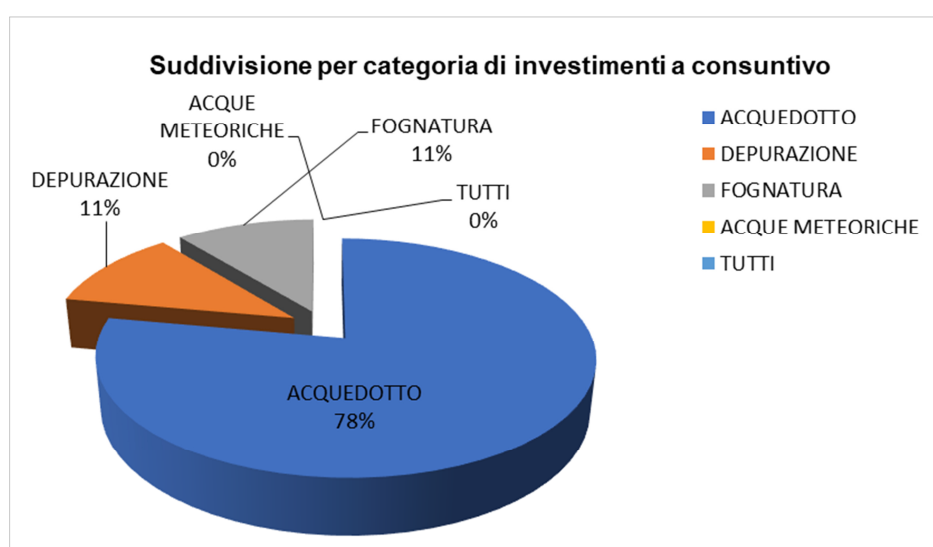
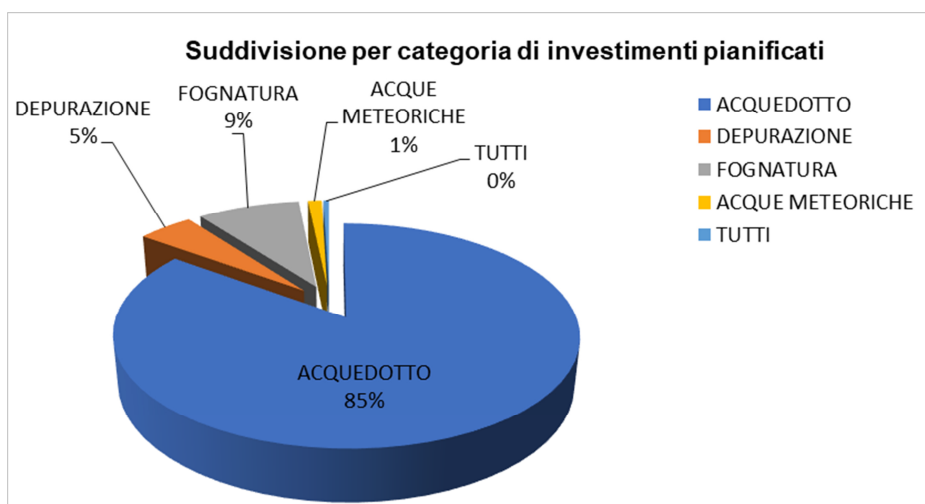


FIG.2 – Suddivisione investimenti 2021 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
ACQUEDOTTO	975.000	2.075.405,60	+1.100.405,60	213%
DEPURAZIONE	200.000	367.745,66	+167.745,66	184%
FOGNATURA	370.000	458.206,64	+88.206,64	124%
ACQUE METEORICHE	50.000	0	-50.000,00	0%
TOTALE	1.595.000	2.901.357,90	1.306.357,90	182%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l'anno.

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia "acque meteoriche" ovvero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non si sono resi necessari interventi relativi alle acque bianche, in quanto nel corso del 2021 solamente tre comuni hanno ceduto la gestione completa delle reti di acque bianche.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	N.	PIANIFICATO 2021	CONSUNTIVO 2021	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	5	0,00	283.953,85	-283.953,85	//
500.001-1.000.000 €	2	450.000	105.766,32	-344.233,68	24%
1.000.001-2.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00	//
2.000.001-5.000.000 €	2	100.000	10.729,72	-89.270,28	11%
Oltre 5.000.000 €	0	0,00	0,00	0,00	//
Manutenzioni e titoli cumulativi	20	3.715.000	3.815.347,61	100.347,61	103%
TOTALE	29	4.265.000	4.215.797,50	-49.202,50	99%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- Ritardi dovuti alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il procedimento espropriativo;
- Ritardi dovuti alle difficoltà di acquisizione di autorizzazioni da altri Enti e nelle fasi di affidamento;
- Ritardi dovuti alla realizzazione di Interventi che presentavano maggiore urgenza;
- Non si sono resi necessari interventi relativi alle acque bianche;
- Necessità di revisione delle progettazioni.

Per quanto concerne gli interventi per i quali vi sono difficoltà legate all'acquisizione di aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell'art. 158 bis del D.lgs 152/2006.

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 15

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 19.

	N. INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2021	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2021
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%)	2	70.000	0,00
Interventi con avvio anticipato nel 2021 e chiusure di interventi già avviati contenuti nel programma degli interventi o nel piano d'ambito (+100%)	6	0,00	387.474,26
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	10	3.525.000	3.164.928,24
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	2	670.000	663.395

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o - 20 %. Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

3. INTERVENTI NON AVVIATI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021
1	2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	295.000,00	20.000,00
2	2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	F	Opere pluricomunali	Gestore	//	50.000,00

Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 5 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
1	2014PREA0011	037-EA - Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	A	Opere pluricomunali	1.567.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	295.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	- 20.000,00	-100	Non si sono resi necessari investimenti hardware e software
3	2014PREA0016	054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	D	Colorno	720.000,00	-	-	-	102.315,45	-	102.315,45	102.315,45	100	I lavori non sono terminati nel 2020 come previsto, a causa della pandemia e dalla successiva rescissione contrattuale con l'appaltatore per "Gravi inadempienze e per ritardi esecutivi". Gli stessi verranno completati nel 2022 con l'affidamento ad una nuova impresa
4	2014PREA0020	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	A	Fontanellato, Fidenza	2.410.000,00	-	-	-	43,36	-	43,36	43,36	100	
5	2018PREA0032	Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC	A	Fidenza	600.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	3.450,87	30.000,00	- 26.549,13	- 446.549,13	-99	I tempi per ottenere le autorizzazioni e la procedura di affidamento, hanno comportato un ritardo nell'avvio dei lavori che avverrà a febbraio 2022. E' stato emesso il 1° Sal che corrisponde a circa il 47% dell'importo di contratto.
6	2018PREA0033	Ricerca perdite acquedotto, contatori, pressioni e sostituzione contatori - FSC	A	Opere pluricomunali	400.000,00	310.000,00	155.000,00	155.000,00	86.213,34	20.000,00	66.213,34	- 223.786,66	-72	I lavori sono stati consegnati nel mese di luglio 2020 e conclusi nel 2021. Il lavoro è stato completato con economie derivanti dal ribasso offerto dalla ditta esecutrice.
7	2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato	A	Opere pluricomunali	2.852.900,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	10.686,36	-	10.686,36	- 89.313,64	-89	L'iter di approvazione del progetto ha richiesto tempi molto lunghi e pertanto non si è potuto procedere con l'affidamento dei lavori.
8	2018PREA0035	Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei comuni in gestione - FSC	A	Opere pluricomunali	600.000,00	470.000,00	235.000,00	235.000,00	489.919,35	30.000,00	459.919,35	19.919,35	4	
9	2019PREA0036	Nuovi allacciamenti	A	Opere pluricomunali		200.000,00	-	200.000,00	173.475,65	196.405,50	- 22.929,85	- 26.524,35	-13	
10	2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	A	Opere pluricomunali		400.000,00	-	400.000,00	1.006,76	-	1.006,76	- 398.993,24	-99	Intervento rinviato, causa altre priorità di investimento (man. straordinaria acquedotto) e in quanto è stato approvato un nuovo importante progetto finanziato con fondi FSC, che verrà avviato nel 2023 per un importo complessivo pari a € 2.852.000.
11	2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	F	Opere pluricomunali		50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	- 50.000,00	-100	Nel corso del 2021 solamente tre comuni hanno ceduto la gestione completa delle reti di acque bianche. Nei restanti comuni EA effettua solamente la manutenzione programmata delle caditoie. Pertanto non si è reso necessario nessun intervento
12	2019PREA0039	Cartografia	F	Opere pluricomunali	325.000,00	-	-	-	1.161,60	-	1.161,60	1.161,60	100	Effettuati aggiornamenti cartografici di piccola entità

Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 5 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
13	2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti	A	Opere pluricomunali		200.000,00	-	200.000,00	46.771,35	-	46.771,35	- 153.228,65	-76	Alcuni interventi di sostituzione reti sono stati posticipati al 2022.
14	2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	F	Opere pluricomunali		370.000,00	-	370.000,00	458.206,64	20.550,00	437.656,64	88.206,64	23	
15	2019PREA0042	Manutenzione straordinaria depurazione	D	Opere pluricomunali		200.000,00	-	200.000,00	367.745,66	-	367.745,66	167.745,66	83	Eseguiti diversi interventi urgenti per l'adeguamento degli impianti
16	2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	A	Opere pluricomunali		975.000,00	-	975.000,00	2.075.405,60	-	2.075.405,60	1.100.405,60	112	Eseguiti molteplici interventi per la riparazione di reti e di allacci e per la manutenzione degli impianti.
17	2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	A	Opere pluricomunali	1.400.000,00	500.000,00	-	500.000,00	113.716,09	-	113.716,09	- 386.283,91	-77	I lavori sono stati affidati nel luglio 2020 e a causa della pandemia e dei ritardi dovuti ai fornitori e all'ottenimento delle autorizzazioni vi sono ritardi nell'esecuzione delle opere. Il termine stimato per la conclusione è gennaio 2023.
18	2019PREA0045	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali		400.289,00	-	400.289,00	217.271,11	-	217.271,11	- 183.017,89	-45	Causa interventi urgenti di manutenzione delle reti fognarie e acquedottistiche è stato previsto di ridurre gli investimenti in questo capitolo
19	2019PREA0046	Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	D	Fidenza	180.000,00	-	-	-	4.393,40	39.020,89	- 34.627,49	4.393,40	100	Liquidate una parte delle spese progettuali
20	2019PREA0047	Rifacimento pozzo 3 di San Donato	A	Opere pluricomunali	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	2019PREA0048	Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e demolizione pensile	A	Sissa Trecasali	330.000,00	-	-	-	271.968,45	-	271.968,45	271.968,45	100	Intervento posticipato dal 2020 al 2021 come richiesto dal comune (per evitare di sovrapporsi ai lavori di ristrutturazione della Rocca che sorge a fianco)
22	2019PREA0049	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	A	Opere pluricomunali		-	-	-	-	-	-	-	-	
23	2020PREA0050	Demolizione e ripristino pensile San Polo	A	Torrile		-	-	-	7.592,00	-	7.592,00	7.592,00	100	A seguito dello studio del 2020 si è reso necessario effettuare una progettazione di un adeguamento della rete che possa poi supplire alla demolizione del serbatoio
24	2020PREA0051	WSP	A	Opere pluricomunali		20.000,00	-	20.000,00	1.725,57	-	1.725,57	- 18.274,43	-91	Il progetto è iniziato a fine 2021 e verrà completato nel 2022
25	2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	A	Opere pluricomunali	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	2020PREA0053	Adeguamento sismico e messa in sicurezza serbatoi pensili	A	Opere pluricomunali	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Gestore Emiliambiente S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di PARMA N. 5 del 15/01/2020			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 31/12/2021			Scostamento		
	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	Valore	%	Note giustificative
27	2020PREA0054	Rifacimento pozzi c/o c.li idriche	A	Opere pluricomunali	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	2020PREA0055	Realizzazione vasche/trattamenti per riduzione carico inquinante "prima pioggia"	A	Opere pluricomunali	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	2020PREA0056	Realizzazione impianto ad osmosi presso Centrale idrica di San Donato	A	Opere pluricomunali	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	2022PREA0057	Sostituzione e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci) - FSC	A	Opere pluricomunali	2.852.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Importo lordo pianificato 2021	Contributi pianificati 2021	Importo netto pianificato 2021	Importo lordo consuntivo 2021	Contributi consuntivo 2021	Investimento gestore consuntivo 2021	PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura		
Importo totale						4.665.289 €	665.000 €	4.000.289 €	4.433.068,61 €	335.976,39 €	4.097.092,22 €	99%		
Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura						4.265.000 €	665.000 €	3.600.000 €	4.215.797,50 €	335.976,39 €	3.879.821,11 €			

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
