

CLFC/2021/7 del 18 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 del Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2021/7

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno **2021** il giorno 18 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010238 del 10/11/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena	Cristina Nicoletti	Consigliere	sì	10,0000
Bagno di Romagna	Enrico Spighi	Assessore	sì	1,5724
Bertinoro	Elisa Leoni	Assessore	sì	2,5384
Borghi				0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole				1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	sì	20,1987
Cesenatico	Jacopo Agostini	Assessore	sì	5,5679
Civitella di Romagna				1,0861
Dovadola				0,6443
Forlì	Giuseppe Petetta	Assessore	sì	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	sì	2,9912
Galeata				0,8216
Gambettola	Maria Letizia Bisacchi	Sindaco	sì	2,4223
Gatteo				2,1470
Longiano				1,7173
Meldola				2,3730
Mercato Saraceno	Ignazio Palazzi	Assessore	sì	1,7505
Modigliana	Sefania Fabbri	Assessore	sì	1,2797
Montiano				0,6526
Portico San Benedetto				0,4594
Predappio	Roberto Canali	Sindaco	sì	1,6514
Premilcuore				0,4665
Rocca San Casciano				0,7146
Roncofreddo				1,0038
San Mauro Pascoli	Luciana Garbuglia	Sindaco	sì	2,5990
Santa Sofia				1,1692
Sarsina				1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	sì	3,9321
Sogliano al Rubicone	Marco Briigliadori	Assessore	sì	0,9739
Tredozio				0,5610
Verghereto	Enrico Salvi	Sindaco	sì	0,7092

Presenti n. 15 quote 82,6235

Assenti n. 16 quote 17,3864

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 del Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- i Consigli locali rispettivamente di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con deliberazioni n. CLFC/2019/10 del 28 novembre 2019, CLRA/2019/5 del 9 dicembre 2019 e CLRN/2020/4 del 28 settembre 2020, hanno approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-23 del Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti Spa, proponendo al Consiglio d'Ambito di integrare il Piano d'ambito delle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica dei rispettivi territori provinciali;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 di approvazione delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. si è dato atto che, per il fornitore di acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti Spa, il PdI - cronoprogramma degli investimenti è stato predisposto modificando il POI precedentemente approvato nei rispettivi Consigli Locali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e che pertanto l'approvazione di tale atto ha costituito modifica ed integrazione del previgente POI 2020-23;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il Gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi Gestore del servizio idrico all'ingrosso, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti Spa ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 925.374,00€ rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-23 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -8%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore del servizio idrico all'ingrosso e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico all'ingrosso;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.15**, quote **82,6235**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 7 del 18 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 del Gestore del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 18 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE del servizio idrico all'ingrosso:
ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE
FONTI S.P.A.**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con le Delibere dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020, che il gestore ROMAGNA ACQUE ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE	11.227.466,00 €	10.302.092,00 €	- 925.374,00 €	-8%
TERZI	- €	- €	- €	0%
TOTALE	11.227.466,00 €	10.302.092,00 €	- 925.374,00 €	-8%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore ROMAGNA ACQUE, abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un -8 %.

Si comunica infine che dal calcolo degli investimenti consuntivati sono esclusi gli investimenti di struttura.

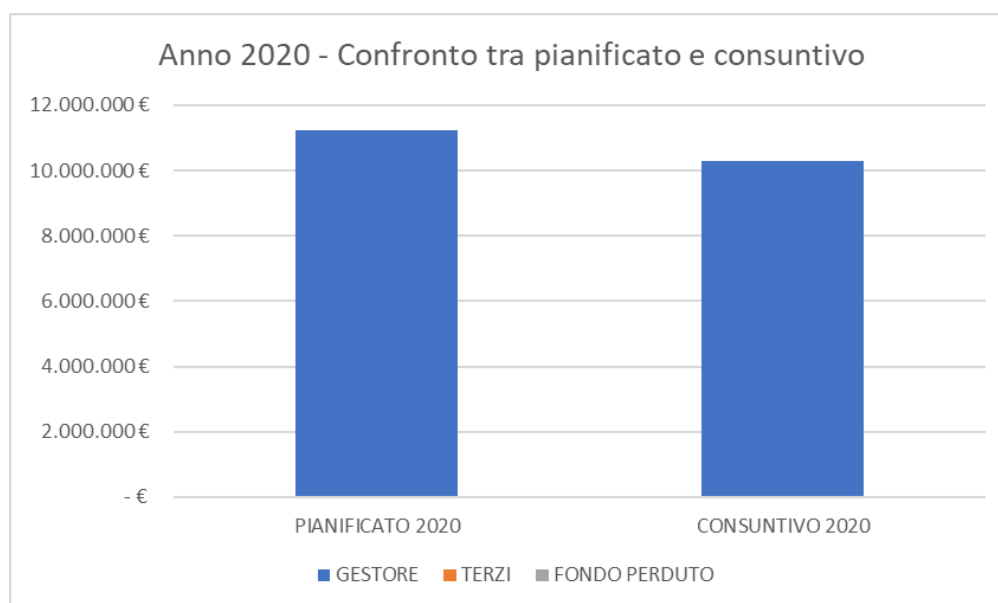


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle successive nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella successiva dà una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	4.009.769,00 €	3.292.538,00 €
Totale complessivo	4.009.769,00 €	3.292.538,00 €

TAB.2 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Questi importi per interventi manutentivi fanno capo a n.ro 5 interventi, di cui solo uno è costituito da un titolo cumulativo, i cui importi sono riportati in tabella 3.

	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	3.000.000,00 €	2.252.155,00 €
Totale complessivo	3.000.000,00 €	2.252.155,00 €

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie (intervento cumulativo)

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	0	- €	- €	- €	0%
500.000-1.000.000 €	5	650.000 €	171.219 €	- 478.781 €	-74%
1.000.000-2.000.000 €	9	2.495.697 €	2.105.013 €	- 390.684 €	-16%
2.000.000-5.000.000 €	5	2.087.000 €	2.082.305 €	- 4.695 €	0%
Oltre 5.000.000 €	4	1.985.000 €	2.651.017 €	666.017 €	34%
Manutenzioni	5	4.009.769 €	3.292.538 €	- 717.231 €	-18%
TOTALE	28	11.227.466 €	10.302.092 €	- 925.374 €	-8%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Gli interventi “non avviati”, che pertanto hanno scostamento pari a - 100% (cioè aventi nell'anno 2020 un importo pianificato diverso da 0 e un importo consuntivato pari a 0), sono **3** e sono elencati in tabella 5.

L'importo totale delle somme non realizzate per questa categoria di interventi è limitato a 55.000,00 euro

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUAL	PIANO ATERSIR INV.LORDI	% SCOSTAMENTO
2014RAAC0002	Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	3000000	5.000,00	-100,00
2017RAAC0010	Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-Zaganti (ex pot. Macerone)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	950000	40.000,00	-100,00
2020RAAC0003	Struttura: studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (n	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	900000	10.000,00	-100,00

TAB.5 – Tabella degli interventi “non avviati”

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2018RAAC0002	Impianto di potabilizzazione Basette NIP1. Automazione, efficientamento energetico e del processo di potabilizzazione.	ACQUEDOTTO	9.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020RAAC0005	Attrezzature di laboratorio e acquedotto	ACQUEDOTTO	1.725.000	Gestore	Opere Pluricomunali	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	52.809,00	0,00	0,00	52.809,00	-352.191,00	-86%	La gara per l'acquisizione del gascromatografo con rilevatore di massa a singolo quadrupolo è stata rallentata causa emergenza Covid e la fornitura relativa, pur aggiudicata nell'anno 2020, è slittata all'anno 2021, così come altre forniture minori accessorie
2014RAAC0002	Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini	ACQUEDOTTO	3.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100%	0
2017RAAC0004	Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento alla canaletta ANIC	ACQUEDOTTO	3.400.000	Gestore	Opere Pluricomunali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	251.764,00	0,00	0,00	251.764,00	-148.236,00	-37%	Ritardi registrati nell'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione dell'intervento
2020RAAC0007	Case dell'acqua	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAAC0003	Condotta Casone-Torre Pedrera	ACQUEDOTTO	23.210.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.015,00	0,00	0,00	35.015,00	25.015,00	250%	Avvio attività propedeutiche alla progettazione
2014RAAC0005	Condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone	ACQUEDOTTO	56.690.000	Gestore	Opere Pluricomunali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	82.342,00	0,00	0,00	82.342,00	57.342,00	229%	Avvio attività propedeutiche alla progettazione
2018RAAC0007	Condotta San Clemente-Santa Maria del Piano	ACQUEDOTTO	4.800.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAAC0009	Condotta serbatoio Morciano - cabina Casarola	ACQUEDOTTO	4.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	-3.306,00	-66%	
2014RAAC0010	Consolidamento strada di accesso alla diga di Ridracoli	ACQUEDOTTO	1.945.536	Gestore	Opere Pluricomunali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	619.815,00	0,00	0,00	619.815,00	119.815,00	23%	Maggior produzione annua
2017RAAC0002	Dismissione beni A non produttivi (serb. Palmiria e centrale TP - Centrale Misano)	ACQUEDOTTO	1.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento non più previsto nel Pdl 20/23
2017RAAC0001	Efficientamento energetico	ACQUEDOTTO	2.400.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento non più previsto nel Pdl 20/23
2017RAAC0008	Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli - Imp	ACQUEDOTTO	700.000	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	-17.304,00	-86%	
2014RAAC0001	Impianto potabilizzazione NIP 2 - Standiana	ACQUEDOTTO	1.166.603	Gestore	Opere Pluricomunali	1.116.697,00	0,00	0,00	1.116.697,00	1.083.084,00	0,00	0,00	1.083.084,00	-33.613,00	-3%	Intervento concluso, Economie riscontrate nell'esecuzione
2014RAAC0007	Impianto trattamento fanghi NIP 1	ACQUEDOTTO	1.650.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento concluso
2020RAAC0001	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Bagno di Romagna-Pie di Comero	ACQUEDOTTO	1.900.000	Gestore	Opere Pluricomunali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00	-9.138,00	-65%	
2020RAAC0002	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto	ACQUEDOTTO	1.100.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	1.454,00	100%	
2018RAAC0005	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana	ACQUEDOTTO	1.500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.548,00	0,00	0,00	13.548,00	13.548,00	100%	Avvio attività propedeutiche alla progettazione
2014RAAC0012	Lavori sede Forlì	ACQUEDOTTO	6.546.945	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento concluso
2017RAAC0006	Magazzino Forlimpopoli	ACQUEDOTTO	1.500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	262.177,00	0,00	0,00	262.177,00	-137.823,00	-34%	Ritardi registrati nell'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione dell'intervento e minor produzione dovuta all'emergenza COVID-19
2018RAAC0001	Manutenzione straordinaria condotta principale	ACQUEDOTTO	15.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	-10.456,00	-69%	
2018RAAC0006	Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico vasche potabile NIP1 (Basette)	ACQUEDOTTO	2.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	553.125,00	0,00	0,00	553.125,00	529.243,00	0,00	0,00	529.243,00	-23.882,00	-4%	Intervento concluso, Economie riscontrate nell'esecuzione
2018RAAC0003	Manutenzione Straordinaria Serbatoio pensile Diaz	ACQUEDOTTO	850.000	Gestore	Opere Pluricomunali	441.644,00	0,00	0,00	441.644,00	506.596,00	0,00	0,00	506.596,00	64.952,00	14%	Intervento concluso
2014RAAC0013	Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna	ACQUEDOTTO	21.265.678	Gestore	Opere Pluricomunali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.252.155,00	0,00	0,00	2.252.155,00	-747.845,00	-24%	Minor produzione dovuta all'emergenza COVID-19
2014RAAC0006	Migliorie potabilizzatore di Capaccio e bypass S.Sofia	ACQUEDOTTO	4.200.000	Gestore	Opere Pluricomunali	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	-12.960,00	-48%	
2017RAAC0011	Modifica opere di presa diga di Ridracoli	ACQUEDOTTO	596.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2017RAAC0012	Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino-Torriana	ACQUEDOTTO	2.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.113,00	0,00	0,00	60.113,00	113,00	0%	
2014RAAC0004	Raddoppio rete Russi-Lugo-Cotignola	ACQUEDOTTO	9.420.000	Gestore	Opere Pluricomunali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	451.822,00	0,00	0,00	451.822,00	51.822,00	12%	Maggior produzione annua
2017RAAC0010	Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-Zaganti (ex pot. Macerone)	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100%	Ritardi registrati nell'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione dell'intervento
2014RAAC0003	Rete di interconnessione Ravenna - 3sub24	ACQUEDOTTO	37.450.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento concluso
2014RAAC0009	Rete idrica Conca - 4sub22	ACQUEDOTTO	1.373.251	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00	0,00	0,00	7.151,00	7.151,00	100%	
2014RAAC0008	Rete S.Giovanni in Marignano - Morciano - 4sub23	ACQUEDOTTO	6.860.000	Gestore	Opere Pluricomunali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2.081.838,00	0,00	0,00	2.081.838,00	531.838,00	34%	Maggior produzione annua
2014RAAC0011	Rete Santarcangelo di Romagna (gestione grossista)	ACQUEDOTTO	1.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	43.170,00	0,00	0,00	43.170,00	-206.830,00	-82%	Ritardi nell'iter autorizzativo e nella gara d'appalto per la parte di adduzione realizzata da HERA SpA
2017RAAC0007	Revamping impianto di trattamento Alberazzo S.Mauro	ACQUEDOTTO	800.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento concluso
2017RAAC0005	Revamping impianto di trattamento centrale Bellaria	ACQUEDOTTO	2.350.000	Gestore	Opere Pluricomunali	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.814.807,00	0,00	0,00	1.814.807,00	164.807,00	9%	
2018RAAC0004	Rifacimento spondale Canale Carrarino 1° tratto (realizzato e in funzione al 31/12/16) nel gruppo manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	387.395	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Intervento concluso
2020RAAC0003	Struttura: studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	ACQUEDOTTO	900.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	
2020RAAC0006	Telecontrollo	ACQUEDOTTO	585.000	Gestore	Opere Pluricomunali	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	125.353,00	0,00	0,00	125.353,00	-204.647,00	-62%	La gara per la fornitura e installazione dei nuovi apparati per la rete IP di telecontrollo è stata rallentata causa emergenza Covid e la fornitura relativa, pur aggiudicata nell'anno 2020, è slittata all'anno 2021
Totale						11.227.466,00	0,00	0,00	11.227.466,00	10.302.092,00	0,00	0,00	10.302.092,00	-925.374,00		
