

CLFE/2019/9 del 19 novembre 2019

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018**

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2019/9

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2019** il giorno 19 del mese di novembre alle ore 14.30 presso la Sala Torre S. Paolo, della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo AT/2019/7186 del 08/11/2019.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI FERRARA				10,0000
COMUNE DI ARGENTA	Borea Sauro	Assessore	SI'	5,5003
COMUNE DI BONDENO	Vincenzi Marco	Assessore	SI'	3,8924
COMUNE DI CENTO				8,3853
COMUNE DI CODIGORO				3,2675
COMUNE DI COMACCHIO	Bellotti Robert	Assessore	SI'	5,6183
COMUNE DI COPPARO	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	SI'	4,3280
COMUNE DI FERRARA	Balboni Alessandro	Assessore	SI'	30,8012
COMUNE DI FISCAGLIA	Tosi Fabio	Sindaco	SI'	2,6098
COMUNE DI GORO				1,3211
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA				1,1167
COMUNE DI LAGOSANTO				1,5633
COMUNE DI MASI TORELLO				0,9712
COMUNE DI MESOLA				2,0647
COMUNE DI OSTELLATO	Rossi Elena	Sindaco	SI'	1,9073
COMUNE DI POGGIO RENATICO	Garuti Daniele	Sindaco	SI'	2,6454
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Vacchi Alessandro	Assessore	SI'	3,2208
COMUNE DI RIVA DEL PO	Nalli Raffaella	Assessore	SI'	2,3782
COMUNE DI TERRE DEL RENO				2,8509
COMUNE DI TRESIGNANA	Barbirati Maurizio	Assessore	SI'	2,1160
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA				2,1314
COMUNE DI VOGHIERA	Bandiera Dante	Assessore	SI'	1,3101

Presenti n 12, quote 66.33

Assenti n 10, quote 33.67

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;

premesse che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.6 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.6 del 14 giugno 2017 del Consiglio locale di Ferrara è stata approvata la revisione, per gli anni 2016-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2018 sono stati proposti due nuovi interventi che necessitano di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2018 dal Gestore risultano essere superiori di 765.362 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 12 (quote 66,33), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Ferrara**

14 novembre 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 16 Dicembre 2015, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Ferrara n. 6 del 14 Giugno 2017, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

		PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 11.358.000	€ 765.362	€ 12.123.362	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 0	-€ 6.768	-€ 6.768	Importo Contributo a Consuntivo [B]	
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 11.358.000	€ 772.150	€ 12.130.150	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]	
CONTO TERZI	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA	
TOTALE	Totale netto pianificato	€ 11.358.000	€ 772.150	€ 12.130.150	Totale netto consuntivato	

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2018 investimenti superiori per un importo complessivo pari a € 765.362 rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, come si vede anche dalla tabella 2, nonostante il gestore non abbia avviato, nel 2018, 9 interventi per un importo complessivo pari a € 517.000, ha speso mediamente più del preventivato per tutti gli altri interventi presenti nel piano ed ha inoltre avviato anticipatamente alcuni interventi già previsti nel piano in annualità successive.

Gli interventi che hanno subito uno scostamento superiore al 20% sono stati 35 (65% circa degli interventi programmati).

Per avere comunque un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

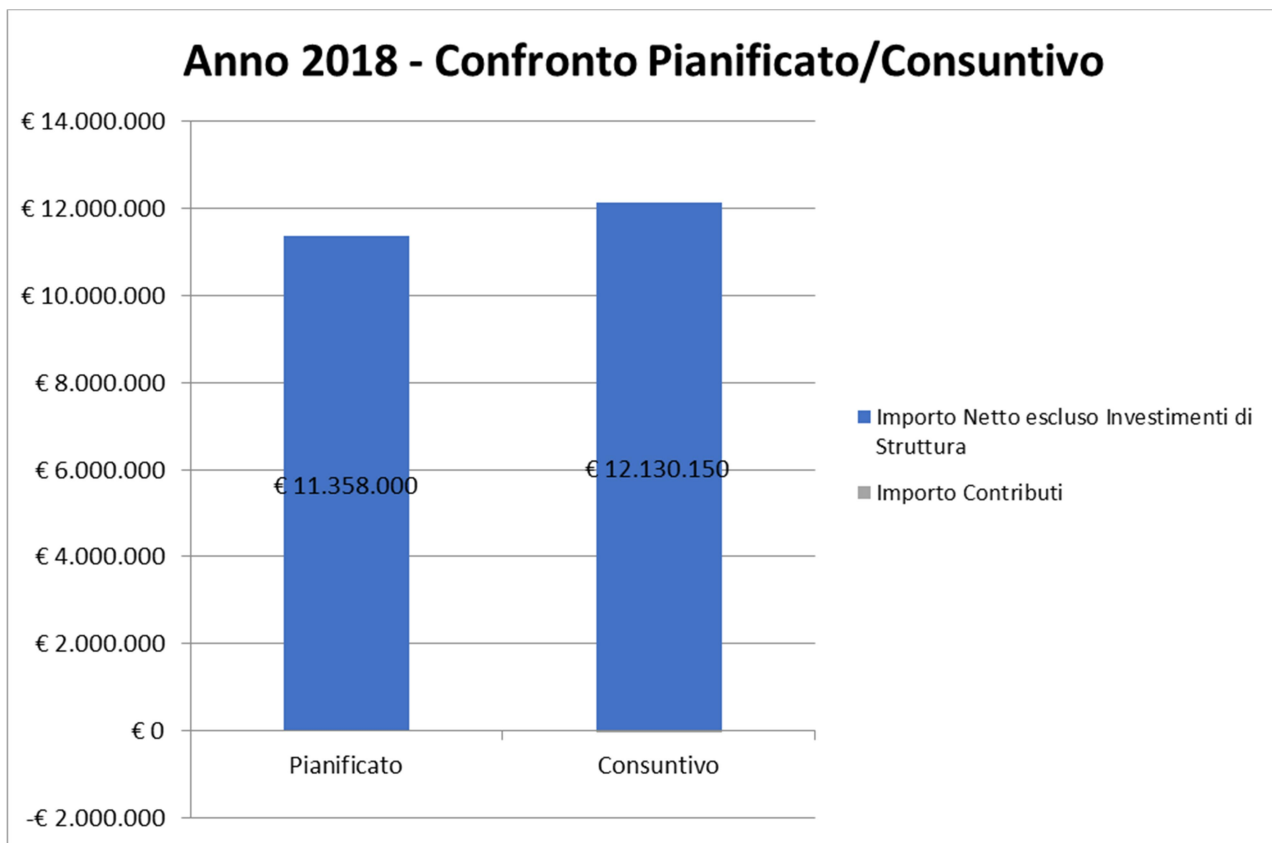


Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2018

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2018: 52

Numero di voci rendicontate nel 2018: 64

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	9	€ 0	€ 517.000	0		
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	3	€ 0	€ 170.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	21	€ 1.990.666	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	35	€ 6.428.933	€ 6.996.000	0		
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 75/2017</i>	4	€ 72.910	€ 90.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	8	€ 3.703.763	€ 3.845.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia nel complessivo rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia comunque avviato 9 interventi dei 52 programmati, di cui 3 che in realtà si sono conclusi contabilmente nell'anno precedente (per l'elenco si veda la Tabella 3), le verifiche

effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore hanno ritenuto esaustive tutte le motivazioni che il gestore ha fornito.

Per il 65% delle voci previste in programma (35) gli importi previsti hanno registrato uno scostamento oltre il $\pm 20\%$, mentre per 8 interventi gli importi previsti dalla programmazione sono stati in linea di massima rispettati, con uno scostamento tra quanto programmato e quanto rendicontato al di sotto del 20%.

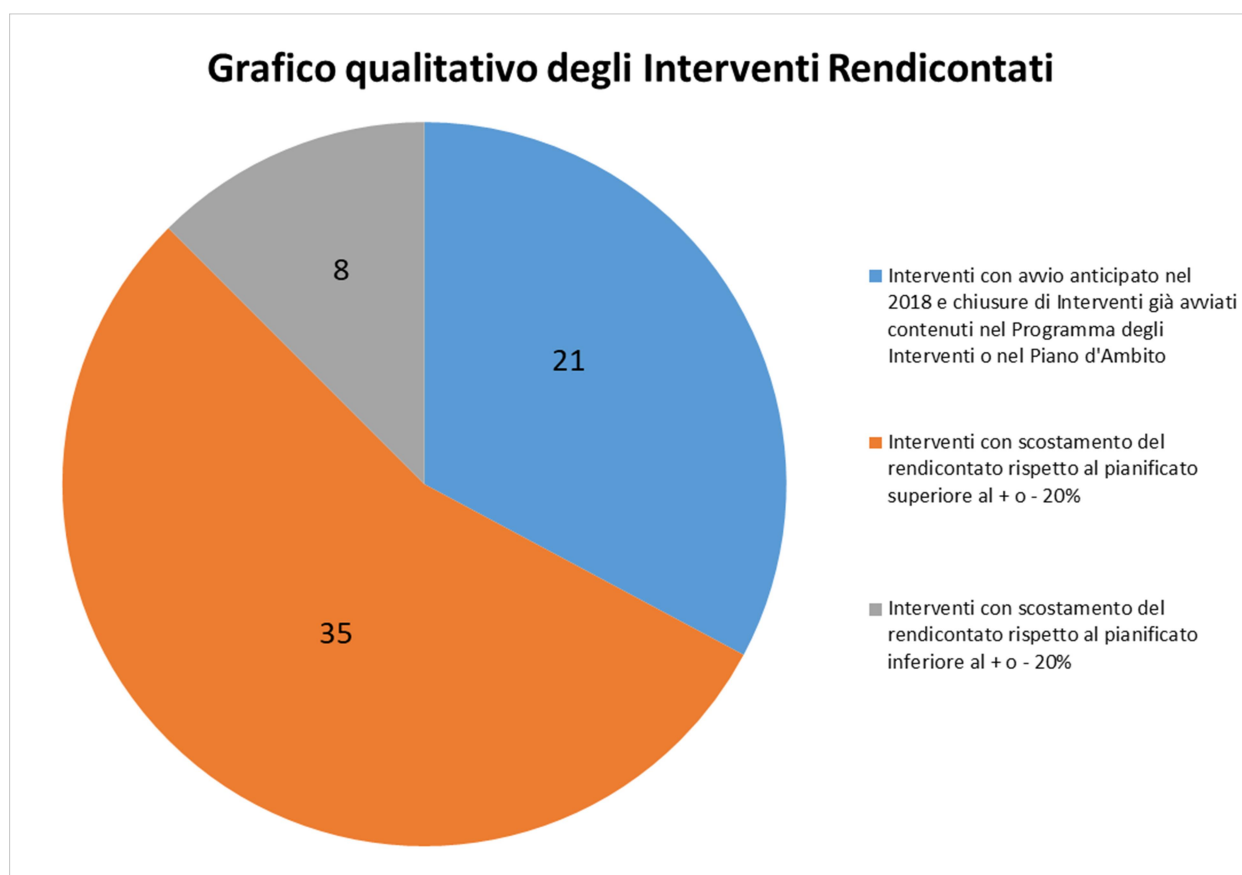


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2018 da Piano approvato
2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	175.000,00
2014FEHA0024*	MANUT.GIUNTI BACINI LAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara	10.000,00
2014FEHA0026*	IMPLEMENTAZIONE AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	50.000,00
2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	32.000,00
2015FEHA0002*	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta	110.000,00
2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	50.000,00
2017FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	20.000,00
2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	FOGNATURA	Bondeno	10.000,00
2017FEHA0016	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PIAZZA ARIOSTEA	FOGNATURA	Ferrara	60.000,00
			TOTALE	517.000

**Interventi conclusi contabilmente nell'anno precedente*

TAB.3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati o terminati contabilmente nell'anno 2017 (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0001	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	897,82	0	897,82	100%	INTERVENTO REALIZZATO E TERMINATO NEL 2017. SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' CONTABILI
2014FEHA0002	BONIFICA VIA ANIME A SAN NICOL?-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0003	POTENZIAMENTO IN VIA ROSSINI-ASSE3	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0004	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 2 (via Parata)	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1ø STRALCIO	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0008	NUOVO ATTRAV FERROV FOG AD ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	-6.787,98	6.787,98	100%	SCOSTAMENTO DELL'IMPORTO NETTO LEGATO ALLA RESTITUZIONE DI UNA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO INCASSATO NEL 2014. RIFERIMENTO PAA 2011/2013 FE/B/11/8
2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	32.974,18	0	32.974,18	100%	PROLUNGAMENTO TEMPORANEE PER ACCORDI BONARI E RIPIANIFICAZIONE COERENTE CON OBIETTIVI FISSATI DA DGR 201/2016
2014FEHA0010	DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	8.730,03	0	8.730,03	100%	PROLUNGAMENTO TEMPORANEE PER ACCORDI BONARI (VEDI NOTA 2017-RIPROGRAMMAZIONE PARZIALE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER OVVIARE AD UN NUMERO ELEVATO DI PROPRIETA' DISSENZIENTI CHE AVREBBE GENERATO UN PROLUNGATO ITER ESPROPRIATIVO).
2014FEHA0011	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	FOGNATURA	Argenta	Gestore		75.000,00	0	75.000,00	43.425,85	0	43.425,85	-42%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE IN ATTESA DEGLI ACCORDI PER LA SOLUZIONE PROGETTUALE CON CONSORZIO DELLA BONIFICA
2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore		0	0	0	2.524,66	0	2.524,66	100%	RITARDI CAUSATI DA LUNGO ITER AUTORIZZATIVO (PRIMA RICHIESTA DEL 25/11/2015 PROT. 138582, FATTI INCONTRI E INVIATI VARI SOLLECITI DA HERA AD ATERSIR (TITOLARE DELLA CONCESSIONE POZZI) E DA ATERSIR AD ARPAE. ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA DA ARPAE)
2014FEHA0013	COLLET SCARICHI V.PIRONI ALFIERI RENO	DEPURAZIONE	Bondeno	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0014	SCARICHI NON DEP L.152-VIA MATTEOTTI	FOGNATURA	Bondeno	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	DEPURAZIONE	Cento	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	59.967,68	0	59.967,68	-40%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE AI RITARDI DELLE ANNUALITA' 2016-2017 CAUSATI DAL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO, VEDI DETTAGLIO MOTIVAZIONI ADDOTTE NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PASSATE.
2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	DEPURAZIONE	Cento	Gestore		0	0	0	335.089,68	0	335.089,68	100%	INTERVENTO IN REALIZZAZIONE. COSTI 2018 COERENTI CON L'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL RECUPERO DELLE RIPIANIFICAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI, GIA' MOTIVATA NELLE NOTE 2016
2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	Gestore		175.000,00	0	175.000,00	0	0	0	-100%	SI CONFERMA CHE E' STATA COMPLETATA L'ATTIVITA' DI MODELLAZIONE IDRAULICA, METTENDO IN LUCE CHE, SEBBENE AL MOMENTO NON VI SIANO COGENTI SITUAZIONI DI CRITICITA', L'INTERVENTO RISULTA NECESSARIO. I RISULTATI DELLA MODELLAZIONE IDRAULICA SONO STATI POSTI ALL'ATTENZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER VERIFICARE SE LA PORTATA RISULTA CONGRUENTE CON L'ASSETTO IDRAULICO DEI LORO CANALI IRRIGUI. A VALLE DI QUESTE VERIFICHE SI PROCEDERA' ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE INDICATIVAMENTE PREVISTO NEL 2020
2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	22.699,05	0	22.699,05	100%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER SEGUIRE LE TEMPORANEE DEL DEPURATORE BUONACOMPRA ID 2014FEHA0015 (VEDI RELATIVA NOTA DI SCOSTAMENTO LEGATO AD UN ITER APPROVATIVO LUNGO). RIPIANIFICAZIONE COERENTE CON OBIETTIVI FISSATI DA DGR 201/2016
2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	3.737,29	0	3.737,29	-96%	MINORI ONERI IN QUANTO L' INTERVENTO E' STATO OGGETTO DI RIVISITAZIONE PROGETTUALE E CONSEGUENTEMENTE SUDDIVISO IN 2 STRALCI CHE FANNO RIFERIMENTO AD ADEGUAMENTI DI 2 AGGLOMERATI DI DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA (DIVERSAMENTE PRIORITARI SECONDO LE NUOVE TEMPORANEE DETTATE DA DGR 201/2016). IN QUESTO ID SI REALIZZA L'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA. IL SECONDO STRALCIO SI REALIZZA CON ID 2017FEHA0008. RIPIANIFICAZIONE COERENTE CON OBIETTIVI FISSATI DA DGR 201/2016
2014FEHA0021	COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	113.186,00	0	113.186,00	100%	INTERVENTO IN FASE GARA. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA', LEGATE AL FATTO CHE QUESTO INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN COERENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO (ID 2014FEHA0016), A CUI STRETTAMENTE FUNZIONALE, IL CUI CANTIERE E' STATO AVVIATO NEL 2017
2014FEHA0022	COLL. FOG DI VIA ROSSINI AD ALBERONE	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	1.415,58	0	1.415,58	100%	IN ATTESA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL COMUNE DI CENTO SU CARATTERIZZAZIONE E CONSISTENZA UTENZE NECESSARIE PER PROCEDERE CON LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0024	MANUT.GIUNTI BACINI LAGUNAGGIO E DRENAGGI	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	ID CONCLUSO E CHIUSO IN ARSI. SI TRATTAVA SOSTANZIALMENTE DI UN ID PER LE ANNUALI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NATO MOLTI ANNI FA. ULTERIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GIUNTI VERRANNO RENDICONTATE NEL CONTO CUMULATIVO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO (2014FEHA0058), IN ANALOGIA A TUTTI GLI ALTRI INTERVENTI DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA
2014FEHA0025	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0026	IMPLEMENTAZIONE AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. NEL 2017 SONO STATI ANTICIPATI GLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2018.
2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		135.000,00	0	135.000,00	3.702,16	0	3.702,16	-97%	IN ATTESA DELLA REVISIONE DEL PROGETTO DELLA SUB-URBANA DA PARTE DI FER NECESSARIO PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DEL SII
2014FEHA0028	DEMOLIZIONE PENSILE S.MARTINO, FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	3.895,70	0	3.895,70	-81%	
2014FEHA0030	RINN.RETE IDRICA V. SALINGUERRA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0031	RINN.RETE DN250-VIA VIAZZA BOARA FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0032	MAGLIATURA RETE - VIA LADINO-VIA FONDO RENO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0033	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	5.208,77	0	5.208,77	100%	NEI PRIMI ANNI DEL 2000 LA PROVINCIA HA COSTRUITO LA NUOVA ROTONDA DI VIA PALMIRANO ANGOLO ALDO MORO; PER PERMETTERE LE LAVORAZIONI HERA HA PROVVEDUTO AL SEZIONAMENTO DELLA CONDOTTA. PER POTER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO A LAVORI ULTIMATI SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE LAVORAZIONI PER NO DIG FUORI DALLA SEDE STRADALE. DALLE INDAGINI PRELIMINARI EFFETTUATE NEL 2016 È EMERSO CHE LA TITOLARITÀ DELLE AREE NON RISULTAVA DEFINITA IN QUANTO È IN CORSO LA CESSIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA ALLE FERROVIE EMILIA ROMAGNA. PERTANTO PER LA MANCANZA DI UN ENTE CERTO DI COMPETENZA NON È STATO POSSIBILE AVVIARE L'ITER AUTORIZZATIVO. NEL CORSO DEL 2018 SI È APPURATO L'IMPOSSIBILITÀ DI OPERARE SU QUESTA AREA. IN VIRTU' DI QUESTA EVIDENZA E DELLA COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO HERA HA AVVIATO NEL 2018 UNA NUOVA FASE PROGETTUALE PER CERCARE DI INDIVIDUARE UNA POSSIBILE NUOVA SOLUZIONE TECNICA ALTERNATIVA
2014FEHA0034	RINN.RETE DN400 E DN250 VIVALDI FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		32.000,00	0	32.000,00	0	0	0	-100%	TRATTASI DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPIANIFICATO IN FUNZIONE DELLE EFFETTIVE NECESSITÀ IMPIANTISTICHE DELLA GESTIONE E DELLA TEMPORALITÀ UTILI PER INTERVENIRE. ATTUALMENTE L'IMPIANTO È IN REGOLARE ESERCIZIO. È IN ESSERE L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE NEL 2019
2014FEHA0036	POTENZIAMENTO RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0037	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		0	0	0	23.933,17	0	23.933,17	100%	NEL 2018 SI SONO RESI NECESSARI RILIEVI INTEGRATIVI SULLA RETE FOGNARIA PER CORRETTA DEFINIZIONE DELLO STATO DI FATTO, DATA LA COMPLESSITÀ DELL'INTERVENTO
2014FEHA0039	MANUTENZIONE A DUE SEDIMENTATORI SECONDARI DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore		1.451.000,00	0	1.451.000,00	118.250,55	0	118.250,55	-92%	PROGETTO COMPLESSO CHE HA RICHIESTO MOLTO TEMPO IN FASE PROGETTUALE, SIA PER LE VALUTAZIONI INIZIALI (TIPOLOGIA DI INTERVENTO) CHE PER LA PROGETTAZIONE VERA E PROPRIA
2014FEHA0041	COLLEG A DEP DI V. VESCOVO E FORNO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0042	DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FERRARA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	30.298,88	0	30.298,88	100%	MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI A RIPROGETTAZIONE OPERE NON CONCLUSE DA DITTA FALLITA. SLITTAMENTO ITER PER ATTESA PARERI SU OPERE DI VARIANTE
2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP.CONTRAPO'-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		8.000,00	0	8.000,00	63.352,03	0	63.352,03	692%	ANTICIPO ATTIVITÀ PROGETTUALI LEGATO ALLA DGR 201/2016
2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		8.000,00	0	8.000,00	58.502,33	0	58.502,33	631%	ANTICIPO ATTIVITÀ PROGETTUALI LEGATO ALLA DGR 201/2016
2014FEHA0045	COLLETTORE DI VIA CERVELLA VIA CAVO DUCALE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0046	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0047	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (S6)	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		656.000,00	0	656.000,00	55.590,87	0	55.590,87	-92%	SLITTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A CAUSA DELLA COMPLESSITÀ DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETÀ INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO (CIRCA 100 PROPRIETÀ INTERESSATE)
2014FEHA0049	REVAMPING SOLLEVAMENTO VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0050	ADEGUAMENTO SIST FOG IN VIA POLLINA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.370.000,00	43.000,00	0	43.000,00	5.512,66	0	5.512,66	-87%	CONFERMATE TEMPISTICHE COME DA NOTA SCOSTAMENTO 2017 (COME DA ACCORDI CON ARPAE (INCONTRO 29.08.2017), LA PROGETTAZIONE RIMANE SOSPESA IN ATTESA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEP. GUALDO. SI PREVEDE AVVIO ITER AUTORIZZATIVO NEL 2019-2020, PROGETTO ESECUTIVO NEL 2020 ED ESECUZIONE NEL 2021). TEMPISTICHE COERENTI CON DGR 201/2016
2014FEHA0053	RINNOVO RETE VIA VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0054	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0055	Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche dal bacino di drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0056	RINNOVO CONDOTTA - VADRIATICO- MASI TORELLO	ACQUEDOTTO	Masi Torello	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0057	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.400.000,00	0	1.400.000,00	1.559.646,21	0	1.559.646,21	11%	
2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		670.000,00	0	670.000,00	1.534.337,16	0	1.534.337,16	129%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		180.000,00	0	180.000,00	365.355,41	0	365.355,41	103%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		80.000,00	0	80.000,00	95.481,26	0	95.481,26	19%	
2014FEHA0061	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		1.790.000,00	0	1.790.000,00	1.555.924,33	0	1.555.924,33	-13%	
2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	27.914,06	0	27.914,06	-72%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO CON IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA E INDICATIVI. L'ID RIGUARDA LA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI ATTRAVERSAMENTI. SONO INTERVENTI CHE IN GENERE HANNO ASSOCIATO ANCHE UN ITER AUTORIZZATIVO LUNGO CON LE FS. NEL 2018 INTERVENTI REGOLARMENTE IN CORSO
2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		270.000,00	0	270.000,00	4.630,11	0	4.630,11	-98%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. IN CORSO LA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE DI ARGENTA
2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	20.580,73	0	20.580,73	106%	
2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		733.000,00	0	733.000,00	1.656.966,31	0	1.656.966,31	126%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	61.320,48	0	61.320,48	-39%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0067	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALLACCI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		350.000,00	0	350.000,00	527.981,98	0	527.981,98	51%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		328.000,00	0	328.000,00	259.945,11	0	259.945,11	-21%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO ID 2015FEHA0015
2014FEHA0069	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	35.684,32	0	35.684,32	-29%	
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	62.448,28	0	62.448,28	212%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITÀ STESSA.
2014FEHA0072	POTENZIAMENTO IN VIA PONTE ROSSO-ASSE3	ACQUEDOTTO	Poggio Renatico	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore		250.000,00	0	250.000,00	15.344,70	0	15.344,70	-94%	CONFERMATE TEMPISTICHE COME DA NOTA SCOSTAMENTO 2017. TEMPISTICHE COERENTI CON DGR 201/2016
2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBU	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0075	RIN.RETE IDRICA V.MATTEOTTI-S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		0	0	0	193.095,11	0	193.095,11	100%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEGUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE, DELL'ITER AUTORIZZATIVO E POI DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL II STRALCIO
2014FEHA0077	ESTENSIONE IN VIA MANTOVA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0078	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.

Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014FEHA0079	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	ACQUEDOTTO	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0080	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA I STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0081	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore		0	0	0	399.871,39	0	399.871,39	100%	INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2018 E' CONSEQUENZIALE ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE GIA' MOTIVATA NEGLI ANNI PRECEDENTI. SI EVIDENZIA INOLTRE UN INCREMENTO DELL'IMPORTO CONSUNTIVATO PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA NON PREVISTE
2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		320.000,00	0	320.000,00	259.657,26	0	259.657,26	-19%	
2014FEHA0083	SUBURBANA-INTERFERENZE RETE FOGNARIA MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0084	SOSTITUZIONE POZZO 21 CON NUOVO POZZO 21A	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0086	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		250.000,00	0	250.000,00	509.557,54	0	509.557,54	104%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEQUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		50.000,00	0	50.000,00	128.919,87	0	128.919,87	158%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0088	POTENZIAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO S10 VIA FABBRI-VIA EVA E ADAMO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0089	POTENZIAMENTO RETE IDRICA S.AGOSTINO	ACQUEDOTTO	Sant'Agostino	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BANDO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0002	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA S.MARIA CODIFIUME	FOGNATURA	Argenta	Gestore		110.000,00	0	110.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANTICIPATI LAVORI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER IL 2018.
2015FEHA0003	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE BANDO	FOGNATURA	Argenta	Gestore		110.000,00	0	110.000,00	33.677,63	0	33.677,63	-69%	INTERVENTO CONCLUSO. IN ACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO STATI ANTICIPATI NEL 2017 LAVORI ORIGINARIAMENTE PREVISTI PER IL 2018.
2015FEHA0004	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.BIAGIO ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore		0	0	0	988,06	0	988,06	100%	NEL 2016 E' STATA COMPLETATA LA SOSTITUZIONE DI UN POZZO CROLLATO. NEL 2017 SONO STATE ESEGUITE LE ATTIVITA' DI MESSA IN ESERCIZIO. SONO PREVISTE PER GLI ANNI PROSSIMI INTERVENTI DI RECUPERO SU ULTERIORI POZZI, NON INIZIALMENTE INSERITI NELLA PIANIFICAZIONE, IN QUANTO TRATTASI SOSTANZIALMENTE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE. I COSTI 2018 SONO LEGATI A VALUTAZIONI PRELIMINARI SUI PROSSIMI INTERVENTI.
2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	116.284,76	0	116.284,76	100%	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE MOTIVAZIONI GIA' FORNITE NEL 2017. SI È PROCEDUTO ALLA PERFORAZIONE DI N.2 NUOVI POZZI.
2015FEHA0008	REALIZZAZIONE NUOVA FOGNATURA VIA PENAVARA - SAN MARTINO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		0	0	0	23.575,21	0	23.575,21	100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' SUGLI ASFALTI E SULLA SEGNALETICA, COME GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE. INTERVENTO TECNICAMENTE TERMINATO NEL 2017.
2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		90.000,00	0	90.000,00	31.513,19	0	31.513,19	-65%	RITARDO DOVUTO ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA PER L'INTERVENTO DI POSA DELLA CONDOTTA IN PROSSIMITA' DELLA SEDE STRADALE. RICHIESTA HERA DEL 17/10/2018 PROT. N. 94812. AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA ARRIVATA IL 09/11/2018 CON ATTO N. 1866 CON RICHIESTA DI ALTRE INFORMAZIONI. NULLA OSTA TEMPORANEO PER PROCEDERE AI LAVORI ARRIVATO IL 20/05/2019 CON ATTO N. 761.
2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0011	NUOVA ADDUTTRICE SUD - FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		15.000,00	0	15.000,00	16.839,88	0	16.839,88	12%	
2015FEHA0013	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO MASI TORELLO	FOGNATURA	Masi Torello	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore		27.000,00	0	27.000,00	70.770,86	0	70.770,86	162%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.FOGNARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore		72.000,00	0	72.000,00	124.006,95	0	124.006,95	72%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO COMPENSATO DA MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE ID 2014FEHA0068

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		100.000,00	0	100.000,00	292.807,69	0	292.807,69	193%	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2018 SONO STATI COMPLETATI I LAVORI PREVISTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE QUARTESANA, AVVIATI I LAVORI PER L'AREA PENSILE CASAGLIA E AVVIATE LA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE FILO.
2015FEHA0017	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA VIA MAZZINI-PONTE TUBO CER	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore		60.000,00	0	60.000,00	21.238,30	0	21.238,30	-65%	INTERVENTO CONCLUSO. MAGGIORI ONERI DOVUTI ALLE PRESCRIZIONI DI ARPAE, CHE HA IMPOSTO LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI BY-PASS DELLE ACQUE REFLUE ATTIVO H24.
2015FEHA0018	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO GUALDO COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Voghiera	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0001	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	12.748,85	0	12.748,85	27%	
2017FEHA0002	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	400.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	120.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	250.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0005	REVAMPING LINEA OSSIDAZIONE 1 DEP.GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	450.000,00	0	0	0	591.578,80	0	591.578,80	100%	IMPORTANTE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVAMPING DELLA LINEA DI OSSIDAZIONE. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI SORTI IN FASE DI INSTALLAZIONE DEI NUOVI COMPRESSORI CHE HANNO COMPORTATO LAVORI EDILI E PARZIALE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, INIZIALMENTE NON PREVISTI NEGLI IMPORTI IPOTIZZATI A PIANO
2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	200.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	-100%	RIPROGRAMMAZIONE PER ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' CHE HANNO PORTATO ALL' INDIVIDUAZIONE DELL' INTERVENTO
2017FEHA0007	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	50.000,00	0	0	0	10.959,71	0	10.959,71	100%	INTERVENTO ANTICIPATO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN QUANTO RITENUTO PRIORITARIO
2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore		0	0	0	455,31	0	455,31	100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO A RIDEFINIZIONE CONSISTENZA AGGLOMERATO
2017FEHA0009	INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	290.000,00	0	0	0	0	0	0		
2017FEHA0010	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	100.000,00	90.000,00	0	90.000,00	7.483,02	0	7.483,02	-92%	NON È STATO POSSIBILE FIRMARE LE SERVITÙ CON DUE PROPRIETARI DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO. E' STATO NECESSARIO MODIFICARE IL PROGETTO.
2017FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	-100%	LIEVE RITARDO NELL'AVVIO LAVORI LEGATO ALLA NECESSITA' DI APPROFONDIRE CON IL COMUNE DI VIGARANO LA SOLUZIONE PROGETTALE PIÙ ADEGUATA PER PER COPRIRE LA VASCA. INTERVENTO AVVIATO NEL 2019
2017FEHA0012	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO	FOGNATURA	Argenta	Gestore	210.000,00	50.000,00	0	50.000,00	171.256,09	0	171.256,09	243%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. ANTICIPATE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2019 LEGATE ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE.
2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	FOGNATURA	Bondeno	Gestore	120.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	-100%	INTERVENTO COMPLETATO NEL 2019 COME DA PIANO ATERSIR. LO SCOSTAMENTO DEL 2018 E' LEGATO UNICAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CONSUNTIVAZIONE. GLI IMPORTI A PIANO 2018 ERANO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE CHE È STATA CONSUNTIVATA NEL 2019.
2017FEHA0014	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	350.000,00	340.000,00	0	340.000,00	4.347,01	0	4.347,01	-99%	SCOSTAMENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI PROGETTAZIONE LEGGERMENTE DILATATE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE DI PIANO, OVVERO HANNO INTERESSATO OLTRE AL 2017 ANCHE PARTE DEL 2018. L'INTERVENTO È STATO AVVIATO A FINE 2018 E CONCLUSO GIÀ NEL PRIMO SEMESTRE 2019.
2017FEHA0015	COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. DIANA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	75.000,00	0	0	0	76.899,84	0	76.899,84	100%	SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO ATTIVITA' PREVISTE NEL 2017 PER LE MOTIVAZIONI GIÀ FORNITE L'ANNO PRECEDENTE
2017FEHA0016	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA PIAZZA ARIOSTEA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	60.000,00	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	-100%	SCOSTAMENTO 2018 DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO DA VERIFICHE SUL CAMPO RIGUARDA LE ACQUE BIANCHE.
2017FEHA0017	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA PORTA SAN PIETRO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0		SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO ANNULLATO CON RICHIESTA DI NULLA OSTA (PROTOCOLLO ATERSIR PG.AT/2018/0002445) TALE INTERVENTO, SU RICHIESTA DEL COMUNE E' STATO SOSTITUITO DAL NUOVO ID 2018FEHA0002, RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA
2017FEHA0018	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA PORTA SAN PIETRO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	100.000,00	0	0	0	0	0	0		SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'ID E' STATO ANNULLATO CON RICHIESTA DI NULLA OSTA (PROTOCOLLO ATERSIR PG.AT/2018/0002445). TALE INTERVENTO, SU RICHIESTA DEL COMUNE, E' STATO SOSTITUITO DAL NUOVO ID 2018FEHA0001, RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA
2018FEHA0001	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	90.000,00	90.000,00	0	90.000,00	32.160,47	0	32.160,47	-64%	INTERVENTO CONGIUNTO AL RINNOVO FOGNATURA ID 2018FEHA0002. ENTRAMBI GLI INTERVENTI SONO IN REGOLARE ESECUZIONE, AVVIATI NEI TEMPI CONCORDATI CON IL COMUNE. LO SCOSTAMENTO E' SEMPLICEMENTE LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE CHE, INTERESSANDO UNA VIA STRETTA DEL CENTRO STORICO, HA COMPORTATO MAGGIORE COMPLESSITA' ESECUTIVA, COME AD ESEMPIO L'ESECUZIONE DI SCAVI A MANO. I LAVORI SARANNO REGOLARMENTE CONCLUSI NEL 2019.

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2018 bacino tariffario di Ferrara

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2018 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2018 al 31-12-2018				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2018 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2018FEHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00	130.631,87	0	130.631,87	-13%	
2018FEHA0003	Rinnovo condotta idrica Via Foro Boario DN 150. 2° stralcio - FSC scheda 18	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0		
2018FEHA0004	Rinnovo condotta idrica Via Calzolai - DE160 - da Via Acquedotto a via Fossa - FSC scheda 19	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	150.000,00	0	0	0	0	0	0		
2018FEHA0005	Rinnovo condotta idrica di adduzione DN 550 in ghisa da Pontelagoscuro a Ferrara. 1° stralcio - FSC scheda 20	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	500.000,00	0	0	0	0	0	0		
2018FEHA0007	CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore		52.500,00	0	52.500,00	53.398,95	0	53.398,95	2%	
2018FEHA0008	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore		37.500,00	0	37.500,00	32.182,91	0	32.182,91	-14%	
					11.358.000	0	0	11.358.000	12.123.362	-6.788	12.130.150		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 9 del 19 novembre 2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 19 novembre 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Daniele Cristofori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 17 febbraio 2020
