



CLMO/2017/3 del 21 luglio 2017.

**CONSIGLIO LOCALE di MODENA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE  
F.to Caterina Bagni

CLMO/2017/3

## CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo AT/2017/4298 del 14/07/2017

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Marcello Mandrioli	Vice-Sindaco	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Chiara Pederzini	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO				0,5660
CARPI	Alberto Bellelli	Sindaco	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Massimiliano Vigarani	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE				1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Fabio Franceschini	Sindaco	SI	1,4922
CAVEZZO	Flavio Lodi	Vice-Sindaco	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA				1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Riccardo Amici	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Giorgia Bartoli	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA				0,6638
LAMA MOCOONO				0,5274
MARANELLO	Mariaelena Mililli	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Giulio Guerzoni	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE				0,5880
NONANTOLA	Enrico Piccinini	Assessore	SI	1,9843
NOVI DI MODENA				1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO				2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Gian Domenico Tomei	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA				0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO				0,2811
S.CESARIO SUL PANARO				0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Alberto Silvestri	Sindaco	SI	1,4938
S.POSSIDONIO				0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Sonia Pistoni	Assessore	SI	4,9025

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SAVIGNANO SUL PANARO	Germano Caroli	Sindaco	SI	1,2871
SERRAMAZZONI				1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Caterina Bagni	Vice-Sindaco	SI	1,9704
SPILAMBERTO				1,6242
VIGNOLA				3,0669
ZOCCA				0,7682
PROVINCIA DI MODENA				10,0000

Presenti n. 29 pari a quote 71,2229

Assenti n. 19 pari a quote 28,7771

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
  - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto** che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che:

- durante il 2015 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d'ambito n.70/2014;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti a favore n. 29 (quote 71,2229), astenuti n.0., contrari n. 0;

resi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 per il gestore HERA s.p.a. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare la struttura tecnica di ATERSIR di verificare con il gestore gli interventi per i quali non sono stati adeguatamente motivati gli scostamenti rilevati nel consuntivo 2015 oggetto della presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA  
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

---

**Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2015  
Gestore: HERA s.p.a.  
Sottoambito: Modena**

**9 febbraio 2017**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.11 del 3 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2015		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 11.892.000	€ 43.955	€ 11.935.955	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	-€ 5.000	-€ 1.928	-€ 6.928	Importo Contributo a Consuntivo [B]
<b>Importo Netto Pianificato [A]-[B]</b>	<b>€ 11.897.000</b>	<b>€ 45.883</b>	<b>€ 11.942.883</b>	<b>Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti di poco superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 45.883; nel caso specifico, dal momento che quanto incassato dai contributi corrisponde grosso modo a quanto pianificato per gli stessi, si nota come ad incrementare sia stato l'importo lordo degli investimenti effettuati e quindi l'impegno di spesa da parte del gestore.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

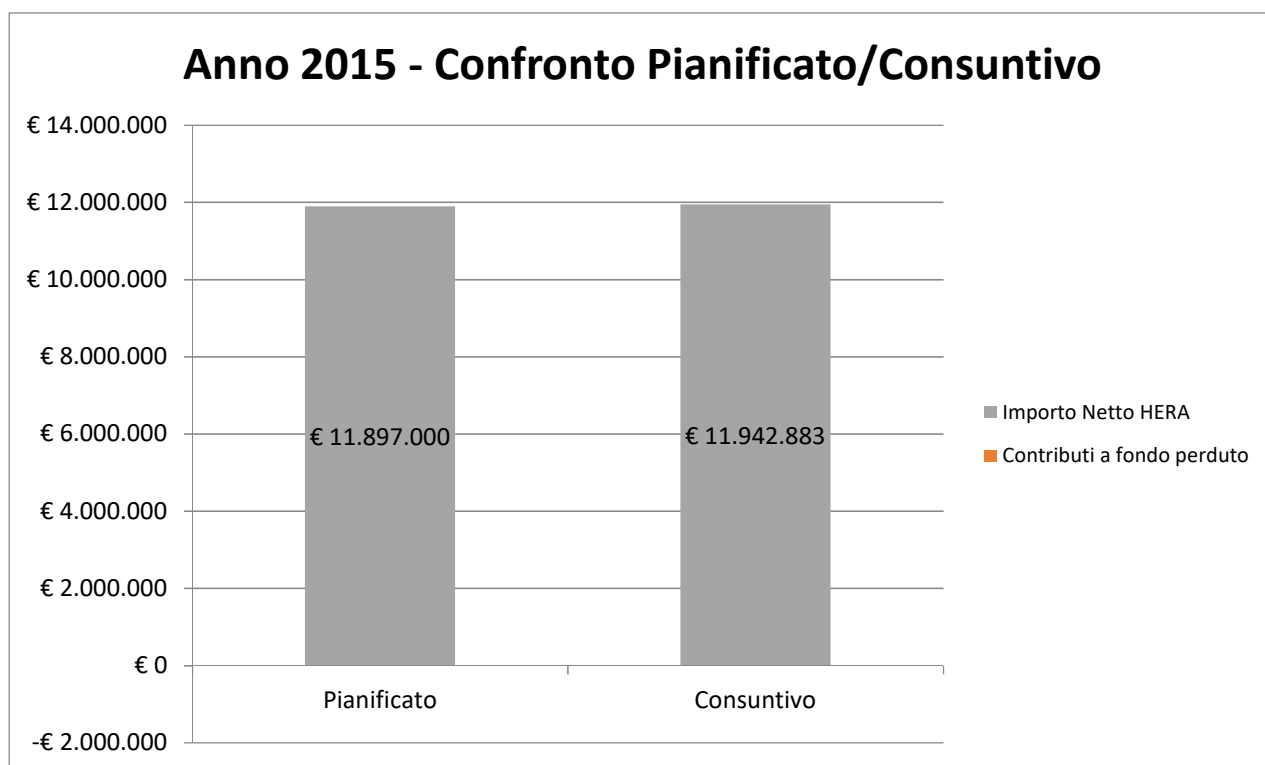


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2015: 77

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 70

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	8	€ 0	€ 96.000	2	2014MOHA0040; 2014MOHA0121	
Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	1	€ 18.250	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	33	€ 1.883.523	€ 2.125.000	4	2014MOHA0014, 2014MOHA0050, 2014MOHA0022, 2014MOHA0062	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	36	€ 10.034.182	€ 9.671.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo di poco superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2015, 8 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 96.000 euro; per due soltanto di questi la giustificazione,



che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento del progetto, non è stata ritenuta esaustiva. In compenso però il gestore ha avviato anticipatamente un intervento rispetto a quanto programmato. Inoltre si può notare come rispetto ai 70 interventi che il gestore ha rendicontato il 47% di questi (33 interventi) hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per 4 di tali interventi le giustificazioni del gestore non sono state ritenute esaustive.

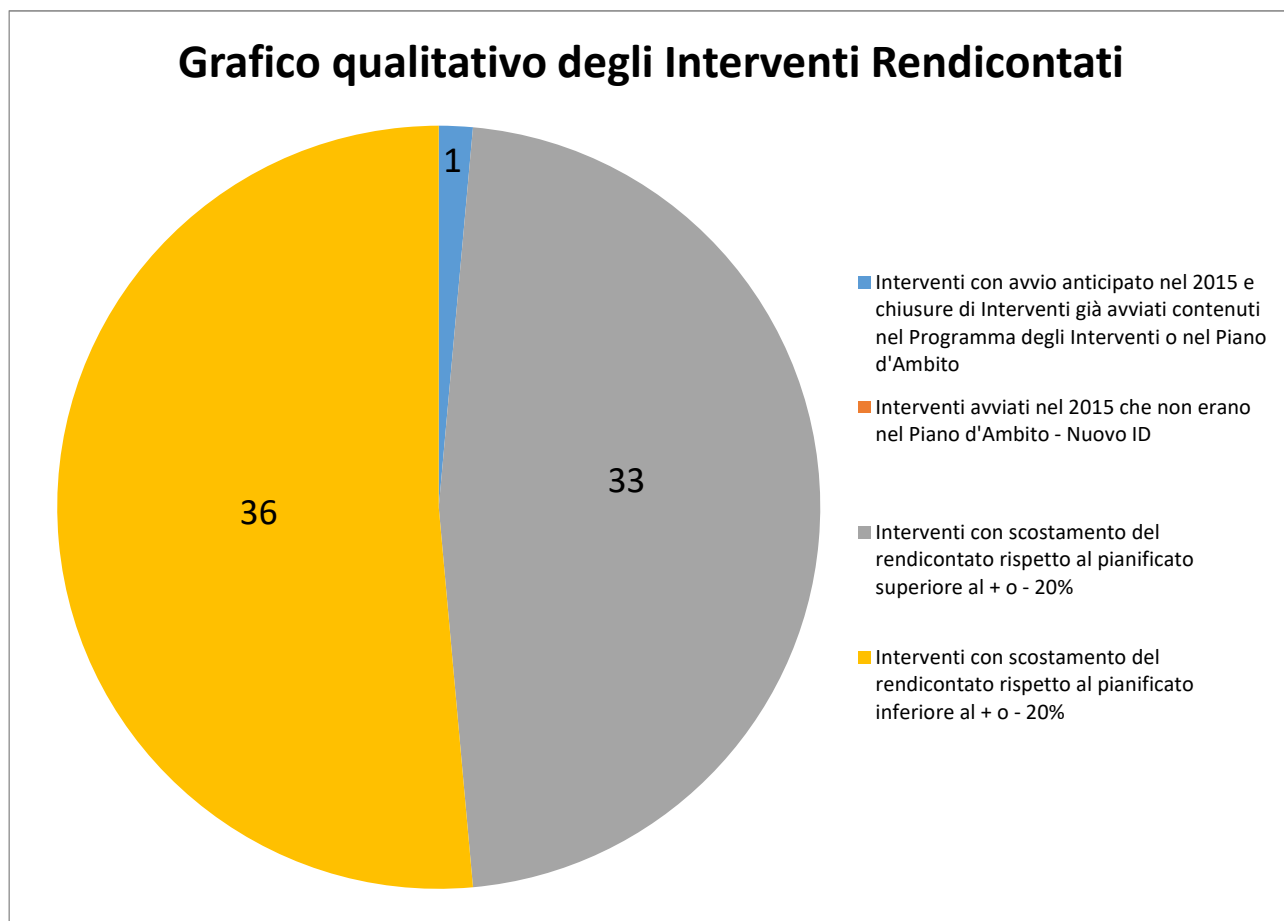


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2015 da Piano approvato
2014MOHA0180	Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia	ACQUEDOTTO	Sassuolo	10.000
2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	20.000
2014MOHA0121	Rilievo reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	10.000
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano	5.000
2014MOHA0032	Realizzazione impianto di depurazione frazione Monte Orsello	DEPURAZIONE	Guiglia	5.000
2014MOHA0030	Dismissione del Depuratore esistente e collettamento dei reflui a Marano su Panaro	FOGNATURA	Guiglia	11.000
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola	5.000
2014MOHA0040	Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga	FOGNATURA	Maranello	30.000
			<b>TOTALE</b>	<b>96.000</b>

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0004	Revamping campo pozzi Via Muzza Corona	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	350.000	11.000		11.000	1.080		1.080	-90%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DELLA SOLUZIONE TECNICA DA ADOTTARE.
2014MOHA0008	Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	135.000	0		0					
2014MOHA0010	Potenziamento del depuratore centralizzato	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	1.000.000	0		0					
2014MOHA0001	manutenzione straordinaria serbatoio via Loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	200.000	95.000		95.000	97.376		97.376	3%	
2014MOHA0002	Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di Via Guido Reni Est, Via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via Ligabue	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0227	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - I Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA									
2014MOHA0009	Studio e collettamento a idoneo trattamento delle frazioni di Riolo, Recovato, Rastellino	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	600.000								
2014MOHA0007	Risanamento e potenziamento dell'assetto fognario del capoluogo comprensivo della sistemazione degli scarichi/scolmatori e sollevamenti	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	2.500.000								
2014MOHA0005	Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica campo pozzi di via Loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	160.000	0		0					
2014MOHA0011	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA		43.000		43.000	64.320		64.320	50%	MAGGIORI ONERI DOVUTI A UN PERIODO DI MONITORAGGIO MAGGIORE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO PER MANCANZA DI PRECIPITAZIONI
2014MOHA0229	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - II Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA		160.000		160.000	181.731		181.731	14%	
2014MOHA0012	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA		3.000		3.000	1.799		1.799	-40%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2015MOHA0001	POTENZIAMENTO DORSALE V. MUZZA CORONA	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA									
2014MOHA0003	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	300.000	23.000		23.000	9.042		9.042	-61%	RITARDO PER DIVERSA SOLUZIONE PROGETTUALE IN CORSO DI ACCORDO CON IL COMUNE
2014MOHA0006	Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del Capoluogo.	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	100.000	0		0					
2014MOHA0014	RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA		50.000		50.000	24.018		24.018	-52%	INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPSTICHE AUTORIZZATIVE. CONCLUSIONE LAVORI PREVISTA NEL 2016.
2014MOHA0013	Collettamento alla rete di San Vito di Spilamberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	150.000	0		0					
2014MOHA0222	Estensione rete acqua via Case Bruciate	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	115.000								
2014MOHA0015	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	45.000	15.000		15.000	9.703		9.703	-35%	ATTIVITA' ANNUALE DI DISTRETTUALIZZAZIONE IN LINEA COL COMPLESSIVO AVANZAMENTO DEL PROGETTO. POSTICIPATI ALCUNI INTERVENTI AL 2016.
2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE - V. VIAZZA	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA									
2014MOHA0017	Collegamento condotta Cavidole con San Donnino Setteciani	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	300.000	200.000		200.000	141.200		141.200	-29%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2015. COMPLETAMENTO LAVORI NEL 2016.
2014MOHA0016	Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di Castelnuovo	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	100.000	120.000		120.000	120.710		120.710	1%	
2014MOHA0018	Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati C? Montanari e Gatta	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	85.000								
2014MOHA0019	RINN RETE H2O V.X MODENA	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA		0		0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA - CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA										
2014MOHA0022	Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della zona comparto ceramiche Rio Maldello a Solignano	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA		100.000		100.000	20.967		20.967	-79%	RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	
2014MOHA0023	Nuovo pozzo Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	100.000	0		0						
2015MOHA0004	NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA										
2014MOHA0021	Nuovo serbatoio Bergognina	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2014MOHA0020	RINN.RETE-SOLIGNANO N.	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA		40.000		40.000	27.634		27.634	-31%	INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 CON COMPLESSITA' LEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU'). COMPLETAMENTO LAVORI PREVISTO NEL 2016.	
2014MOHA0228	Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	150.000									
2014MOHA0230	Revamping impianto Ponte Fossa	ACQUEDOTTO	Fiorano Modenese;	Gestore HERA		30.000	16.000	14.000	32.393	16.393	16.000	8%		
2015MOHA0005	POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA										
2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA										
2014MOHA0025	Risanamento canale di Formigine sotto C? Longa di Casinalbo	FOGNATURA	Formigine;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2014MOHA0024	RINN. RETE AC - VSPEZZANI	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA	150.000	0		0						
2014MOHA0029	Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA										
2015MOHA0007	INTERCON.FRAZ. RICCOVOLTO A SIST.DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro;	Gestore HERA										
2014MOHA0028	Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA	510.000	15.000		15.000	11.249		11.249	-25%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014MOHA0027	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di Venano)	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA	50.000	0		0						
2014MOHA0033	Magliature con Rosola	ACQUEDOTTO	Guiglia;	Gestore HERA	200.000	0		0						
2014MOHA0032	Realizzazione impianto di depurazione frazione Monte Orsello	DEPURAZIONE	Guiglia;	Gestore HERA	300.000	5.000		5.000					-100%	RITARDI NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI PER RILIEVI A PROFESSIONISTI ESTERNI.
2014MOHA0030	Dismissione del Depuratore esistente e collettamento dei reflui a Marano su Panaro	FOGNATURA	Guiglia;	Gestore HERA		11.000		11.000					-100%	RITARDO PER APPROFONDIMENTI LEGATI ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE DA ADOTTARE.
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento localit? C? Baldini e collegamento Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.	DEPURAZIONE	Guiglia;	Gestore HERA	60.000									
2014MOHA0034	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma, Mocogno - v. Rosario)	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	400.000	0		0						
2015MOHA0008	RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA CAPOLUOGO A C.MONTESE	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno;	Gestore HERA										
2014MOHA0037	Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di Borra	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	110.000	0		0						
2014MOHA0035	Realizzazione trattamento appropriato localit? Barigazzo	DEPURAZIONE	Lama Mocogno;	Gestore HERA	712.000				0		0			
2014MOHA0036	Montecenero Nord: realizzazione di collettore fognario e di un depuratore biologico	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	470.000	0		0						
2014MOHA0040	Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	30.000	30.000		30.000	0		0		-100%	INTERVENTO SOSPESO PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI SULL'EFFETTIVO BENEFICIO DELL'OPERA
2014MOHA0039	Raccolta e trattamento reflui in localit? Fogliano (versante Ovest)	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	100.000	30.000		30.000	20.538		20.538		-32%	MINORI ONERI GRAZIE A OTTIMIZZAZIONI NEL TRACCIATO DI PROGETTO.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014MOHA0038	Collegamento rete fognaria della località? La Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo impianto di trattamento	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	55.000	0		0						
2014MOHA0041	Rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola	FOGNATURA	Marano sul Panaro;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2014MOHA0042	sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro;	Gestore HERA	100.000									
2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro;	Gestore HERA										
2014MOHA0055	Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	150.000	0		0						
2014MOHA0046	RINN. RETE AC - VIA SASSI	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0220	Contatori multibusiness	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA		578.000		578.000	657.943		657.943	14%		
2014MOHA0050	Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine al depuratore di Modena	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	200.000	50.000		50.000	12.014		12.014	-76%	RITARDI NELLA DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE E NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI	
2014MOHA0058	Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, ispessitori)	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	1.000.000	150.000		150.000	134.723		134.723	-10%		
2015MOHA0010	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA										
2014MOHA0052	Adeguamento rete di drenaggio Modena Est	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	2.000.000	17.000		17.000	13.153		13.153	-23%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014MOHA0045	RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0225	Risanamento collettore di levante	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA										
2014MOHA0226	Nuovo collettore al sollevamento del depuratore di Modena	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	450.000									
2014MOHA0047	Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID PREGRESSO	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	333.700	0	-120.000	120.000	0	-122.725	122.725	2%		
2014MOHA0062	Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA		40.000		40.000	6.762		6.762	-83%	RITARDI LEGATI ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE.	
2014MOHA0059	Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	1.000.000	0		0						
2014MOHA0057	Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	270.000	0		0						
2014MOHA0049	Modena Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di trattamento liquami da fosse Imhoff	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	1.000.000	90.000		90.000	93.084		93.084	3%		
2014MOHA0044	RINN.RETE AC - CORSO DUOMO	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0054	Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di Modena	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	230.000	20.000		20.000	14.817		14.817	-26%	IMPORTO 2015 PARZIALMENTE IMPIEGATO CAUSA RITARDI CONSEGNA MACCHINE DA SUPERVIONARE	
2014MOHA0063	Estendimento fognatura alle aree Cargill, eotron, Monter?	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA		43.000		43.000	48.386		48.386	13%		
2014MOHA0061	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0056	Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quarzetta dal Cavo Soratore	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	3.000.000	10.000		10.000	68.393		68.393	584%	ANTICIPATO INTERVENTO PER PRESCRIZIONI TEMPORALI DEGLI ENTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLA VIABILITA'	
2014MOHA0053	Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	350.000	40.000		40.000	10.925		10.925	-73%	RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI RILIEVI SULLA RETE ESISTENTE CAUSA PROBLEMATICHE OPERATIVE	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014MOHA0060	Adeguamento al D.Lgs.152 della sedimentazione finale del Depuratore	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	800.000	0		0						
2014MOHA0043	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	1.170.000									
2014MOHA0048	Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia a servizio delle centrali AIMAG e HERA	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0051	Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di TAV.	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	1.072.000	87.000		87.000	83.659		83.659	-4%		
2014MOHA0064	Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montecreto - Il Ciocco o collettamento al depuratore di Montecreto	FOGNATURA	Montecreto;	Gestore HERA	80.000	0		0						
2014MOHA0065	Rinnove reti acqua e fognatura via Fontana, Via Marconi, via Vaccari	FOGNATURA	Montecreto;	Gestore HERA	130.000	0		0						
2014MOHA0066	Realizzazione sistema di trattamento appropriato agglomerati vari a Montefiorino	FOGNATURA	Montefiorino;	Gestore HERA	1.350.000	0		0						
2014MOHA0067	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in località: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)	FOGNATURA	Montefiorino;	Gestore HERA	260.000	16.000		16.000	13.153		13.153	-18%		
2014MOHA0133	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0124	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0074	Sostituzione pompe sorgente Nadia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	150.000	0		0						
2014MOHA0117	modello matematico acquiferi modenesi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	40.000									
2014MOHA0075	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0218	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		220.000		220.000	188.967		188.967	-14%		
2014MOHA0102	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0080	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0089	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0095	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 2	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0085	Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2014MOHA0125	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0136	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0140	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	1.946.800	2.994.000		2.994.000	3.151.586		3.151.586	5%		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2014MOHA0093	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0131	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0147	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	710.000	80.000		80.000	98.591		98.591	23%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2015. COMPLETAMENTO LAVORI NEL 2016.	
2014MOHA0122	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0107	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0123	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2015MOHA0013	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.DEP.-MO-ATO4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA					18.250		18.250	#DIV/0!	CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO DEPURATORI, ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU SOLLEVAMENTI FOGNARI. COMPENSAZIONE SU ID 2015MOHA0014.	
2014MOHA0128	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0110	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0126	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0106	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0109	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0120	Adeguamento attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		30.000		30.000	11.868		11.868	-60%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. INTERVENTI IN CORSO COME DA PROGRAMMAZIONE.	
2014MOHA0142	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	7.718.000	1.006.000		1.006.000	1.069.718		1.069.718	6%		
2014MOHA0134	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0069	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0223	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		540.000		540.000	845.741		845.741	57%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0068	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						
2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-MO-ATO4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		20.000		20.000				-100%	CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO DEPURATORI, ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU SOLLEVAMENTI FOGNARI. COMPENSAZIONE SU ID 2015MOHA0013.	
2014MOHA0115	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 9	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2015MOHA0012	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI MO-ATO4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA										
2014MOHA0116	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0139	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0072	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0121	Rilievo reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		10.000			10.000				-100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. AVVIO ATTIVITA' POSTICIPATO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014MOHA0146	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	4.589.999	565.000		565.000	561.245		561.245		-1%	
2014MOHA0113	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0094	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0091	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0132	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0135	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0103	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0070	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0137	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0112	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0144	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	6.030.000	875.000		875.000	920.959		920.959		5%	
2014MOHA0081	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0088	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0130	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0118	Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della pressione in rete in aree di montagna	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	900.000	80.000		80.000	66.615		66.615		-17%	



ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014MOHA0082	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0084	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0096	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0119	Ripristino asfalti per opere di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		60.000			60.000	36.117		36.117	-40%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0083	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0105	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0111	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0108	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0090	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0079	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0077	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0098	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorit? di intervento per il mantenimento della qualit? dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0076	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0221	Potenziamento sistema idrico Dragone	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	350.000									
2014MOHA0086	Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi manutentivi reti idriche.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	2.100.000	130.000			130.000	132.576		132.576	2%	
2014MOHA0099	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0104	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0143	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		133.000			133.000	122.726		122.726	-8%	
2014MOHA0127	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					
2014MOHA0087	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0			0					

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0141	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	8.300.000	1.200.000		1.200.000	1.232.329		1.232.329	3%	
2014MOHA0114	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0097	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0138	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0092	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0078	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 7	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0129	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0100	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 3	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0073	Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e telecontrollo SII	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	1.220.000	297.000		297.000	296.128		296.128	0%	
2014MOHA0145	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP.	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		100.000		100.000	115.811		115.811	16%	
2014MOHA0071	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2014MOHA0101	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA		0		0					
2015MOHA0011	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI.ACQUEDOTTO MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA									
2014MOHA0149	Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Palagano;	Gestore HERA	65.000	40.000		40.000	33.861		33.861	-15%	
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano;	Gestore HERA	150.000	5.000		5.000				-100%	INTERVENTO SOSPESO PER RIDEFINIZIONE DEGLI AGGLOMERATI DA PARTE DI RER
2014MOHA0150	Revamping potabilizzatore Montespino	ACQUEDOTTO	Palagano;	Gestore HERA	170.000	60.000		60.000	70.214		70.214	17%	
2014MOHA0157	Interconnessione dell'acquedotto rurale "Il Sorbo" in località Frassinetti	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	165.000	0		0					
2014MOHA0159	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a Coscogno	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	563.000	0		0	0		0		
2014MOHA0156	Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di Acquabuona	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	110.000	0		0					
2014MOHA0151	Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e realizzazione di interconnessioni varie con le condotte principali in zona Montecuccolo.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	40.000	30.000		30.000	30.695		30.695	2%	
2014MOHA0155	Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	367.000	25.000		25.000	13.231		13.231	-47%	RITARDO NELLA PROGETTAZIONE PER NECESSITÀ DI INDAGINI GEOLOGICHE SUPPLEMENTARI
2014MOHA0152	Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto Scoltenna - Intervento suddiviso in due stralci funzionali.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	730.000	15.000		15.000	17.661		17.661	18%	
2014MOHA0158	Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al serbatoio Il Poggio	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	60.000	0		0					
2015MOHA0017	NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA									
2014MOHA0162	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV SRALCIO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA		6.000		6.000	11.662		11.662	94%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014MOHA0160	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato in Agglomerati > 200 a.e. (Renno Piantacroce, Gaiato-Pianelli) TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II SRALCIO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA		25.000		25.000	12.091		12.091	-52%	RITARDO PER NECESSITÀ DI INTEGRARE VALUTAZIONE DI UNA DIVERSA SCELTA PROGETTUALE

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2015MOHA0016	POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO (II STR)	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA										
2014MOHA0163	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO III SRALCIO	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0154	Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, C? Bosi - polo produttivo, Olina, C? d'Olina, Scarella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Bellei)	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	3.300.000	0		0						
2014MOHA0153	Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	400.000	0		0						
2014MOHA0161	Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione Scoltenna	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	190.000	0		0						
2015MOHA0015	POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA										
2014MOHA0166	Rilievo, Pianificazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria sulle sorgenti	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA		5.000		5.000	5.642		5.642	13%		
2014MOHA0164	Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago	FOGNATURA	Pievepelago;	Gestore HERA	650.000	20.000		20.000	21.315		21.315	7%		
2014MOHA0165	Installazione impianto di disinfezione	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA	50.000	5.000		5.000	4.874		4.874	-3%		
2014MOHA0167	Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di Pievepelago-località Fontanini	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA	40.000	0		0						
2014MOHA0169	Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa Nogato	FOGNATURA	Polinago;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0168	Collettamento della località Casale a Casa Marini	FOGNATURA	Polinago;	Gestore HERA	90.000	0		0						
2015MOHA0019	POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA										
2014MOHA0170	La Fredda e Casa Azzoni: realizzazione sistema di trattamento appropriato ovvero collettamento all'agglomerato di Sassuolo	FOGNATURA	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA	210.000	0		0						
2015MOHA0018	NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA										
2015MOHA0020	NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA										
2014MOHA0171	Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta problemi di nitrati.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	200.000	15.000		15.000	21.361		21.361	42%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE	
2014MOHA0172	Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area del Comune di San Cesario.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	2.350.000	2.000	99.000	-97.000	3.072	99.404	-96.332	54%		
2014MOHA0173	Collettamento S. Cesario a Castelfranco	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	250.000									
2014MOHA0174	Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano, via Bosco, via Molza, via Monchio, via Benedello, via Bosco, via Castelleone, via Ghiarelle, via Parolaro, via De Giacomini, Via Modenese, Via Fossoli	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	80.000	0		0						
2015MOHA0021	STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA		55.000		55.000	51.688		51.688	-6%		
2014MOHA0180	Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	180.000	10.000		10.000				-100%	AVVIO INTERVENTO MANUTENTIVO POSTICIPATO AL 2016 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELL' IMPIANTO.	
2014MOHA0177	RINN.RETE - V.MONTEGIBBIO - IØST	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA		200.000		200.000	123.408		123.408	-38%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.	

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015					
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
2014MOHA0175	Estensione rete in via Ancora a nord della Pedemontana	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	40.000	0		0						
2014MOHA0176	Estensione rete tra via Umbria e via dell'Artigianato	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	50.000	0		0	0		0			
2014MOHA0178	classificazione potabile acqua Secchia	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	25.000	0		0						
2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA										
2015MOHA0023	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SASSUOLO	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA										
2014MOHA0179	Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	926.000	0		0						
2014MOHA0182	Riassetto campo pozzi Bocchirolo	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	200.000	20.000		20.000	18.766		18.766	-6%		
2014MOHA0185	Potenziamento campo pozzi Magazzino	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	100.000	20.000		20.000	21.139		21.139	6%		
2014MOHA0184	Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	50.000	0		0						
2014MOHA0183	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA		210.000		210.000	95.559		95.559	-54%	RITARDI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	
2014MOHA0181	Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2 <sup>o</sup> stralcio).	DEPURAZIONE	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	420.000	170.000		170.000	171.446		171.446	1%		
2014MOHA0192	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Casellette	FOGNATURA	Serramazzoni;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0187	Lavori di raccolta e collettamento fognature al servizio di Ricc? e San Dalmazio e realizzazione nuovo impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni;	Gestore HERA	630.000	5.000		5.000	7.985		7.985	60%	MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'ESECUZIONE DEI RILIEVI SULLE RETI ESISTENTI	
2014MOHA0188	Risanamento fognario localit? Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni;	Gestore HERA	250.000	0		0						
2014MOHA0191	Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni;	Gestore HERA	150.000	0		0						
2014MOHA0193	Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli	DEPURAZIONE	Serramazzoni;	Gestore HERA	80.000	50.000		50.000	51.314		51.314	3%		
2014MOHA0190	Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Barbona	FOGNATURA	Serramazzoni;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0189	Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff	FOGNATURA	Serramazzoni;	Gestore HERA		0		0						

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2015 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2015 al 31-12-2015				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2015 ma per i quali sono stati effettuati investimenti	
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento		
2014MOHA0194	Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in seguito a frana	DEPURAZIONE	Serramazzoni;	Gestore HERA	100.000	0		0						
2014MOHA0186	Collegamento fognario C7 d'Oirina - Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni;	Gestore HERA	115.000	0		0						
2014MOHA0195	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati di Rovinaccia	FOGNATURA	Sestola;	Gestore HERA	240.000	0		0						
2014MOHA0196	Estensione rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di Vesale estensione alla borgata La Serlina	FOGNATURA	Sestola;	Gestore HERA		10.000		10.000	5.991		5.991	-40%	ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA	
2014MOHA0201	Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via Pontemarianna	FOGNATURA	Spilamberto;	Gestore HERA	95.000	0		0	0		0			
2014MOHA0199	Manutenzione straordinaria serbatoio Coccia	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2014MOHA0202	Nuova condotta Coccia - Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	225.000	0		0						
2014MOHA0206	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Spilamberto;	Gestore HERA		5.000		5.000	5.167		5.167	3%		
2014MOHA0200	Potenziamento sistema areazione depuratore centrale	DEPURAZIONE	Spilamberto;	Gestore HERA	400.000	207.000		207.000	208.581		208.581	1%		
2014MOHA0197	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	200.000	0		0						
2014MOHA0204	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Spilamberto;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0198	sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	400.000	0		0						
2014MOHA0205	Realizzazione nuovo pompaggio Coccia per Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	50.000	0		0						
2014MOHA0203	Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	110.000	150.000		150.000	116.414		116.414	-22%	AVANZAMENTO LAVORI IN COERENZA ALLA PIANIFICAZIONE.	
2014MOHA0215	Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore	DEPURAZIONE	Vignola;	Gestore HERA		50.000		50.000	17.384		17.384	-65%	RITARDI LEGATI A PROCEDURE AUTORIZZATIVE (COMUNE DI VIGNOLA).	
2014MOHA0213	Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0212	Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	150.000	0		0						
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola;	Gestore HERA	150.000	5.000		5.000				-100%	MINORI ONERI PER RIPROGRAMMAZIONE DEL II STRALCIO DEI LAVORI	
2014MOHA0224	Potenziamento elettrico depuratore di Vignola	DEPURAZIONE	Vignola;	Gestore HERA	300.000									
2014MOHA0211	Adduttrice Savignano - Vignola (Gessiere)	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	300.000	0		0						
2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA										
2014MOHA0208	Adduttrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. Il tratto	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	850.000	0		0						
2014MOHA0210	RINN RETE AC - VIA DOCCIA	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA		0		0						
2014MOHA0209	RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1Ø5	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	60.000	0		0						
2014MOHA0207	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	200.000	0		0						
2014MOHA0217	Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monteombraro Campazzo	FOGNATURA	Zocca;	Gestore HERA	160.000	10.000		10.000	5.433		5.433	-46%	MINORI ONERI LEGATI A RILIEVI E SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	Zocca;	Gestore HERA	850.000	0		0						

11.892.000	-5.000	11.897.000	11.935.955	-6.928	11.942.883
------------	--------	------------	------------	--------	------------

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 3 del 21 luglio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d'atto del consuntivo 2015.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 21 luglio 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena

F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante

F.to Pier Luigi Maschietto

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 luglio 2017
