

CLPR/2020/2 del 15 gennaio 2020

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2020/2

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2020**, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 14,00, presso Sala Consiglio del Comune di Parma, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera PG/AT/2020/63 dell'8.01.2020.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Dodi Gian Carlo	Vice Sindaco	SI'	2,8284
COLORNO	Grassi Mirka	Assessore	SI'	1,8860
COMPIANO	Mariani Francesco	Sindaco	SI'	0,4083
CORNIGLIO			NO	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Amigoni Franco	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Cardi Lucia	Assessore	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI	Bruzzone Gianni	Vice Sindaco	SI'	1,0975

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
MEDESANO	Cantoni Gianpaolo	Vice Sindaco	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Taccagni Marco	Presidente Consiglio com.le	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Bernardi Nicola	Sindaco	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI	Comelli Marco	Assessore	SI'	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI	Restiani Giuseppe	Sindaco	SI'	0,7052
VARSÌ			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA	Rossi Diego	Presidente	SI'	10,000



Presenti n. 19 quote 77,50 Assenti n. 26 quote 22,50

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

- con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2018 del Consiglio d'ambito è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per i bacini tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata IRETI S.p.A.;

dato atto che il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2018 che:

- non sono stati introdotti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-2019, approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio Locale di Parma ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017, fatto salvo le revisioni ordinarie introdotte in conformità alla Deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 di Consiglio d'Ambito "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato";
- non sono stati avviati n.23 interventi per un importo complessivo lordo di €. 4.206.825;
- sono stati anticipati/conclusi n.19 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di €. 735.952;
- per n.35 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2018;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- il Gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018 una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile – atto DPGR n.158/2017 e DPGR 178/2017, attualmente ancora in corso di rendicontazione;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;



dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 19 (quote 77,50), voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti per l'annualità 2018 del gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2018
Gestore: IREN S.p.A. (PR)**

15 gennaio 2020

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016 e Delibera del Consiglio d'Ambito n.51 del 28 giugno 2018 che il gestore IREN S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 20.105.825	€ 1.292.020	€ 21.397.845	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.078.317	-€ 522.169	€ 556.148	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 19.027.508	€ 1.814.189	€ 20.841.697	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IREN S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti rispetto alla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a + € 1.292.020, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di + € 1.814.189 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 522.169.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

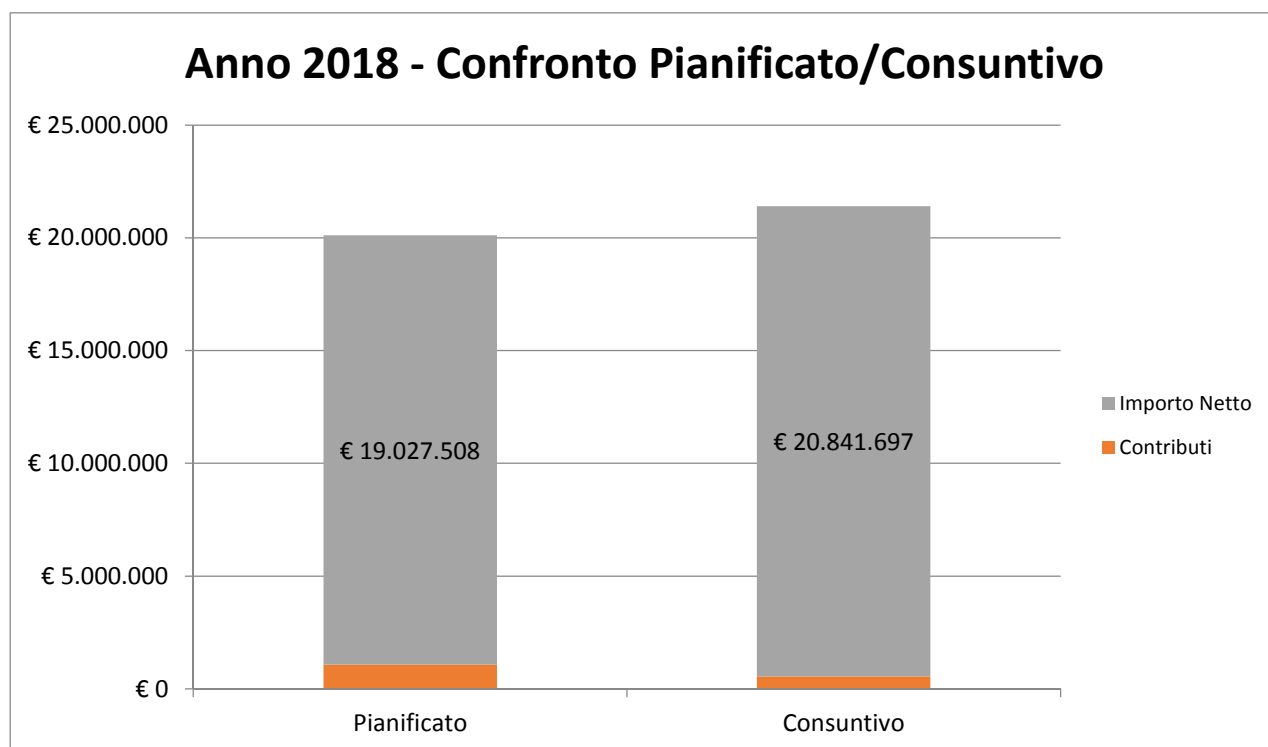


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018

ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE**INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018**

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017 e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017 e DPGR 178/2017 – per un importo di circa €. 868.500 attualmente in corso di rendicontazione. Sono stati rilasciati 10 visti per un importo di circa €. 913.611, il contributo ammesso per tali interventi è circa €. 538.708 mentre l'importo effettivamente speso è circa €. 983.672 comprensivo dei costi industriali indiretti e della manodopera.

Alcuni di tali interventi sono stati in parte rendicontati all'interno del Consuntivo 2017 e del 2018 e precisamente all'interno dei seguenti codici Arsi:

CODICE INTERVENTO Protezione Civile	Descrizione Protezione Civile	contributo OCDPC 468/2017	Speso 2017	Speso 2018	CODICE ATERSIR	Descrizione Codice ATERSIR	consuntivo complessivo dell'intervento rendicontabile
12879	Interventi per realizzare nuove captazioni e recupero di portata delle sorgente Roccaferara e Sauna in comune di Corniglio.	€.11.000	€.13.758,91	€.5.900,09	2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna	€ 36.698,32
			€.15.237,88	€.1.801,44	2014PRIA0095	Manutenzioni straordinarie ACQ	
12880	Interventi di ottimizzazione delle opere di presa delle sorgenti che alimentano la rete acquedottistica in comune di Corniglio.	€.75.000	-	€.120.277,23	2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	€ 120.277,23
12882	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Baganza in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica in comune di Felino	€.25.000	€.656,36	€.31.320,01	2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	€ 31.976,37
12886	Interventi di movimentazione nell'alveo del torrente Ceno in prossimità dei pozzi di sub-alveo che alimentano la rete idrica in comune di Medesano	€.20.000	€.66.339,08	€.199.457,67	2016PRIA0125	Interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	€ 265.796,75
12890	Interconnessione idraulica dell'acquedotto di Gabbiano a quello di Medesano	€.130.000,00	€.110.578,51	-	2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione, potenziamento condotte idriche al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	€.110.578,51

€.358.756,44

L'importo di €. 358.756,44 è compreso all'interno dell'importo lordo €. 21.397.847 consuntivato nel 2018.

Per l'intervento cod. 12890 (protezione civile OCDPC 468/2017) rendicontato all'interno del codice Ater-sir 2014PRIA0099 nell'annualità 2017, l'importo ammissibile a contributo della protezione civile è pari a €.99.322,76. La restante parte (€.11.255,75) è rappresentata dai costi del personale non operativo e costi industriali indiretti, spese non rendicontabili ai fini dell'ottenimento del contributo.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018: 61

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2018: 57

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	23	€ 0	€ 4.206.825	NO	2016PRIA0116 2016PRIA0151 2016PRIA0130 2016PRIA0141 2018PRIA0160 2014PRIA0002 2014PRIA0060 2016PRIA0124 2014PRIA0105 2016PRIA0150 2016PRIA0136 2014PRIA0024 2014PRIA0030 2016PRIA0158 2016PRIA0108 2016PRIA0153 2016PRIA0133 2014PRIA0034 2016PRIA0114 2014PRIA0005 2016PRIA0126 2014PRIA0025 2019PRIA0166	
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	19	€ 735.952	€ 0	NO	2014PRIA0023 2014PRIA0018 2014PRIA0056 2014PRIA0084 2016PRIA0111 2016PRIA0112 2016PRIA0127 2014PRIA0052 2014PRIA0041 2014PRIA0092 2014PRIA0067 2016PRIA0131 2014PRIA0061 2016PRIA0129 2014PRIA0058 2016PRIA0110 2014PRIA0007 2014PRIA0031 2014PRIA0049	

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	35	€ 19.901.673	€ 15.229.000	NO	2014PRIA0101 2014PRIA0096 2014PRIA0107 2014PRIA0042 2014PRIA0086 2014PRIA0106 2014PRIA0065 2014PRIA0077 2016PRIA0157 2014PRIA0029 2014PRIA0095 2016PRIA0149 2014PRIA0026 2014PRIA0074 2014PRIA0055 2014PRIA0098 2016PRIA0135 2014PRIA0001 2016PRIA0125 2014PRIA0063 2014PRIA0083 2014PRIA0102 2014PRIA0059 2014PRIA0103 2014PRIA0097 2014PRIA0006 2014PRIA0051 2014PRIA0062 2014PRIA0020 2016PRIA0122 2014PRIA0033 2014PRIA0071 2014PRIA0032 2014PRIA0091 2014PRIA0099	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	3	€ 760.220	€ 670.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, nel 2018, non ha avviato n.23 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso rispetto a quanto programmato n.19 interventi e n.35 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i quali

la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.3 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

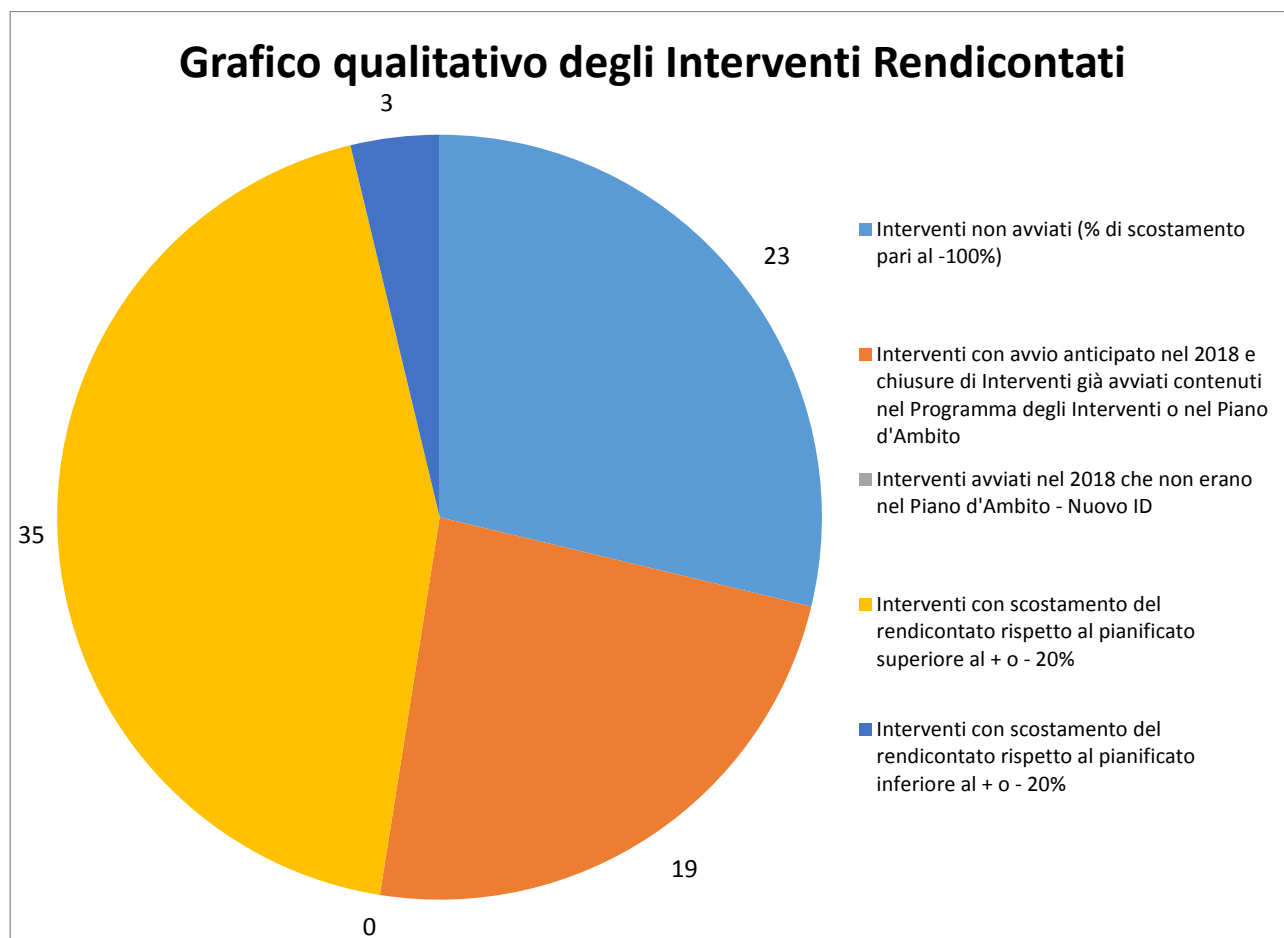


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2018
Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	2.000.000	500.000
Calestano, Felino, Sala Baganza	2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	2.500.000	20.000
Langhirano	2014PRIA0024	141AG - Adeguamento depuratore di Langhirano	2.000.000	50.000
Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	1.450.000	50.000
Medesano	2014PRIA0030	181AG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	300.000	30.000
Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	5.480.000	30.000
Parma	2014PRIA0060	421AG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	2.330.000	50.000
Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	2014PRIA0105	144EN - Estensione reti fognarie con contributo comuni/privati.	720.000	50.000
Langhirano, Felino	2016PRIA0108	Impianto trattamento acqua gallerie Braia/pozzi Fabiola	500.000	150.000
Parma	2016PRIA0114	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	280.000	60.000
Parma	2016PRIA0116	Interventi di sistemazione strutturale rete fognaria Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	100.000	40.000
Montechiarugolo	2016PRIA0124	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	200.000	150.000
Sorbolo, Parma	2016PRIA0126	751AG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	400.000	100.000
Opere pluricomunali	2016PRIA0130	731AG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	1.360.000	80.000
Mezzani	2016PRIA0133	731AG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	150.000	100.000
Palanzano	2016PRIA0136	Realizzazione nuovi impianti di clorazione per consolidare corretto mantenimento dei parametri allegato 1 parte A D.Lgs 31/01	195.000	60.000
Palanzano	2016PRIA0141	Messa a norma serbatoio Caneto	80.000	70.000
Parma	2016PRIA0150	via Torrente Gotra realizzazione nuova fognatura mista Vs. collettore via Manubiola. (opera compensativa A7)	40.000	40.000

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2018
Parma	2016PRIA0151	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cinghio tominato (opera comp.A7)	50.000	50.000
Parma	2016PRIA0153	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cava via Ferrarini- via Valera di sopra (opera comp.A7)	50.000	50.000
Sorbolo	2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	120.000	20.000
Opere pluricomunali	2018PRIA0160	Sostituzione contatori adempimento D.M. 93/2017	12.490.800	1.243.200
Opere pluricomunali	2019PRIA0166	Nuovi Allacci		1.213.625

TAB 3. Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0054	37IAG - Interventi cofinanziati con Asse 3, serbatoi montagna	ACQUEDOTTO	Calestano, Neviano degli Arduini, Langhirano, Felino	36.223	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0055	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio dei Comuni di Neviano; Traversetolo; Montechiarugolo	FOGNATURA	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	7.548.448	900.000	0	900.000	14.060	0	14.060	-98%	Eseguita GARA. Ritardo dovuto ad annualità precedenti con tempistiche programmate
2014PRIA0056	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	DEPURAZIONE	Noceto	623.979	0	0	0	39.010	0	39.010	100%	Gli interventi edili e meccanici sono terminati. Manca l'impianto elettrico e la fornitura dell'Enel. Ritardo dovuto ai tempi di appalto.
2014PRIA0057	39IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Gatto Gambarone	ACQUEDOTTO	Noceto	40.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	FOGNATURA	Noceto	30.000	0	0	0	6.679	0	6.679	100%	In seguito all'esito delle verifiche l'intervento è stato risolto con spesa inferiore a quella di progetto.
2014PRIA0059	41IAG - Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	5.350.000	20.000	0	20.000	7.350	0	7.350	-63%	Minori spese per studio in corso. Oggetto di ripianificazione nel nuovo POI
2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	Attività dipendenti dal punto precedente 2014PRIA0059. Oggetto di ripianificazione nel nuovo POI
2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	DEPURAZIONE	Parma	800.000	0	0	0	28.615	0	28.615	100%	Eseguita progettazione. In ritardo per allineamento tempi progettuali rete fognaria connessa. Oggetto di ripianificazione nel nuovo POI
2014PRIA0062	44IAG - Ampliamento depuratore di Baganzola (o.c.A7)	DEPURAZIONE	Parma	300.000	100.000	0	100.000	129.897	0	129.897	29%	Impianto obsoleto che ha subito il guasto irreparabile di due biodischi su tre che sono stati sostituiti. Si stanno valutando soluzioni alternative all'ampliamento dell'impianto esistente.
2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000	250.000	0	250.000	4.248	0	4.248	-98%	In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto
2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000	200.000	0	200.000	86.395	0	86.395	-56%	E' stata fatta solo la sistemazione delle griglie grossolane, nel 2020 sarà ristrutturato il sollevamento.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0088	67IAG - Raddoppio impianto denitrificazione Centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma, Montechiarugolo, Noceto	179.541	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0089	68IAG - Rifacimento impianto elettrico e telecontrollo centrale idrica Marore	ACQUEDOTTO	Parma	734.142	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.620	100.000	0	100.000	77.449	0	77.449	-22%	Lavori in corso. Spese in funzione dell'avanzamento lavori.
2014PRIA0092	119EN - Ampliamento depuratore Sorbolo	DEPURAZIONE	Sorbolo	2.204.646	0	0	0	189.516	0	189.516	100%	Contenzioso con l'impresa esecutrice in corso per l'ultimazione lavori.
2014PRIA0093	118EN - Opere per realizzazione distretti idrici	ACQUEDOTTO	Sorbolo	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	DEPURAZIONE	Traversetolo		0	0	0	0	0	0	0%	
2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		2.200.000	0	2.200.000	8.523.126	0	8.523.126	287%	Di cui 2.584.980 di rifacimento reti idriche in quanto manca capitolo specifico. Alcuni interventi sulla manutenzione IMPIANTI ACQUA hanno riguardato la messa a norma per la sicurezza o per il rispetto di adempimenti normativi ovvero interventi per superare criticità impiantistiche di emergenza. Per quanto riguarda le RETI ACQUA l'aumento dei costi rispetto al pianificato è dovuto a interventi massivi di sostituzioni brevi tratti di rete in seguito a rottura, principalmente nei comuni di Montechiarugolo, Traversetolo, Medesano, Noceto, Sala Baganza e Parma e maggiori rifacimenti derivazioni d'utenza in seguito a rottura o ricerca perdite, principalmente nei comuni di Medesano, Sorbolo e Parma
2014PRIA0096	72IAG - Manutenzioni starordinarie	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali		980.000	0	980.000	2.916.110	0	2.916.110	197%	Maggiori costi dovuti a guasti non prevedibili sia Parma Est che Parma Ovest e sostituzione/manutenzioni. Inoltre: Acquisto analizzatori per realizzare i cicli alternati su una linea del Parma Ovest e alcuni lavori accessori. Acquisto secondo decanter Parma ovest e manutenzione di quello presente. Sostituzione pompe di ricircolo fanghi parma ovest con pompe più piccole ed efficienti. Adeguamento normativo cabine MT di 3 depuratori

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	
2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	21.966.088	650.000	0	650.000	2.347.102	0	2.347.102	261%	Sono stati eseguiti interventi non prorogabili per evitare problemi alla sicurezza delle strutture, delle persone e garantire le normali condizioni igienico sanitarie in particolare sul reticolo fognario di Parma. Sono inoltre stati adeguati e potenziati diversi impianti di sollevamento e realizzati alcuni importanti collegamenti fognari.
2014PRIA0098	74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo	1.063.273	100.000	0	100.000	164.953	0	164.953	64%	Attività di riallineamento DB aziendali, attività di rilievo (Palanzano)
2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione, potenziamento condotte idriche al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		400.000	0	400.000	491.778	0	491.778	22%	Maggiori necessità di sostituzione verificatesi nell'esercizio delle condotte.
2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione, potenziamento condotte fognarie al momento non meglio definite ovvero sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	FOGNATURA	Opere pluricomunali		200.000	0	200.000	213.521	0	213.521	6%	
2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali, Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Tizzano Val Parma, Traversetolo, Palanzano	330.000	30.000	0	30.000	1.885	0	1.885	-93%	Parte dei lavori anticipata negli anni precedenti

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del \pm 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	DEPURAZIONE	Fontevivo, Calestano, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	1.321.043	110.000	0	110.000	197.566	0	197.566	79%	All'interno della cifra c'è il rifacimento del TLC del Parma Ovest, molto complesso con la raccolta di tutti i segnali provenienti dal campo.
2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	505.078	50.000	0	50.000	20.157	0	20.157	-59%	Problemi con appalto impresa esecutrice
2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza		150.000	150.000	0	171.220	146.949	24.271	14%	
2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Calestano, Fontevivo, Lesignano de Bagni, Felino, Mezzani, Collecchio, Langhirano, Monchio delle Corti, Traversetolo, Montechiarugolo, Noceto, Sorbolo, Parma, Tizzano Val Parma, Corniglio, Medesano, Neviano degli Arduini, Sala Baganza	720.000	50.000	50.000	0	0	0	0	-100%	Non presenti richieste opere cofinanziate
2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.249.845	310.000	0	310.000	18.427	0	18.427	-94%	Errore di rendicontazione. Alcune manutenzioni straordinarie che hanno riguardato parte dei serbatoi sono state inserite come manutenzione straordinarie

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016PRIA0118	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0119	Interventi di manutenzione straordinaria fognatura pensile all'interno del Canale Maggiore area urbana Cittadella (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0120	interventi di manutenzione straordinaria collettore di scarico caditoie via Varese (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0122	80IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio pensile Ponte Taro	ACQUEDOTTO	Fontevivo	200.000	180.000	0	180.000	7.038	0	7.038	-96%	La fase di studio ha messo in evidenza la possibilità della messa fuori esercizio e della relativa demolizione. Non era possibile procedere prima della raccolta delle informazioni funzionali del sistema determinate dal periodo di messa fuori esercizio. L'importo progettuale previsto è sufficiente a coprire i costi per la demolizione.
2016PRIA0123	Sistemazione rete fognaria FONTEVIVO capoluogo area Rio Scagno e Canale Vecchio. Collettamento fognatura con sostituzione canalette con adeguate tubazioni	FOGNATURA	Fontevivo	200.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0%	
2016PRIA0124	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo	200.000	150.000	0	150.000	0	0	0	-100%	Intervento terminato nel 2017
2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.180.000	50.000	0	50.000	726.224	0	726.224	1352%	Errore di rendicontazione. Il susseguirsi di eventi di piena ha reso necessari interventi per la messa in sicurezza degli impianti a ridosso delle sponde e degli alvei dei fiumi per garantirne la funzionalità. Inoltre su questo capitolo sono stati erroneamente scaricati gli interventi sui collettori fognari di Vestola e Chiastrone per un importo pari a 518.843,46 che verranno spostati sul codice 2016PRIA0130.
2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000	100.000	20.000	80.000	0	0	0	-100%	In ritardo inizio progettazione per definizione oggetto con amministrazione. Richiesta allaccio ulteriore zona.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0141	Messa a norma serbatoio Caneto	ACQUEDOTTO	Palanzano	80.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	Lavoro terminato 2017 e finito in manut. Straord. 2014PRIA0095
2016PRIA0142	Opere di protezione prese Lalatta	ACQUEDOTTO	Palanzano	100.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0143	Rifacimento imhoff Vaestano	DEPURAZIONE	Palanzano	30.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0144	Rifacimento imhoff Selvanizza A	DEPURAZIONE	Palanzano	80.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogrosso	DEPURAZIONE	Palanzano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0147	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0148	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	480.000	480.000	0	480.000	772.049	0	772.049	60%	L'importo progettuale derivante dal Progetto definitivo era pari a 560.000- ma essendo < 200.000- non è stata fatta richiesta di nulla osta. Le tempistiche di intervento sono state concordate con Amministrazione Comunale e sono risultate differenti da quanto pianificato. Il lavoro è stato infatti anticipato rispetto ai tempi previsti a Piano. I costi sono ulteriormente aumentati in fase esecutiva in quanto si sono incontrate più interferenze di quante previste a progetto. Il diametro del tubo era un 1200 in una strada molto trafficata e affollata di sotto servizi. Si sono trovate posizioni differenti nell'esecuzione lavori e si è dovuto procedere alla risoluzione delle interferenze.
2016PRIA0150	via Torrente Gotra realizzazione nuova fognatura mista Vs. collettore via Manubiola. (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Parma	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100%	In attesa di definizione del progetto con il comune

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2019PRIA0165	Adeguamento Sistema Depurativo loc. Bannone	DEPURAZIONE	Traversetolo	350.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2019PRIA0166	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali		1.213.625	442.317	771.308	0	0	0	-100%	Il codice è stato inserito nel 2019. I costi verranno riportati su ARSI a partire dal 2019, fino ad allora i costi sostenuti vengono rendicontati fuori da ARSI.
2019PRIA0167	Opere di difesa spondale per la protezione del Campo Pozzi di Velago	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	250.000	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTALI				131.344.520	20.105.825	1.078.317	19.027.508	21.397.845	556.148	20.841.697		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 15 gennaio 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2018

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 15 gennaio 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma

F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 17 giugno 2020

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
