

CLPR/2019/8 del 6 marzo 2019

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria
Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Montagna 2000 S.p.A.**

IL COORDINATORE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2019/8

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2019** il giorno sei del mese di marzo alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 -, si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2019/1591 dell'1.03.2019.

Assume la presidenza il Coordinatore Locale, che chiama Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI	Solari Federico	Assessore	SI'	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO			NO	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Zanetti Michela	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO			NO	1,8860
COMPIANO			NO	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Raminzoni Valentino	Vice Sindaco	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO	Agoletti Matteo	Vice Sindaco	SI'	1,2243
FORNOVO DI TARO	Grenti Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO			NO	2,0497

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MONCHIO DELLE CORTI	Moretti Claudio	Sindaco	SI'	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO			NO	2,6033
PALANZANO	Franzini Lino	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	1,3746
ROCCABIANCA	Gattara Alessandro	Vice Sindaco	SI'	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Porta Enrica	Vice Sindaco	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Bernardi Nicola	Sindaco	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO MEZZANI			NO	2,6562
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA			NO	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE			NO	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052
VARSI			NO	0,4384

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI PARMA	Delsante Giuseppe	Consigliere	SI'	10,000

Presenti n. 16 quote 68,37 Assenti n. 30 quote 31,63

Riconosciuta la validità della seduta, la Sig.ra Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Montagna 2000 S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n.8 dell'11 maggio 2018 del Consiglio locale di Parma è stata approvata la revisione straordinaria del programma degli interventi per gli anni 2018-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Montagna 2000 S.p.A., che costituisce proposta di aggiornamento del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;

- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.
- con deliberazione n. 55 del 7 ottobre 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Parma di competenza del gestore Montagna 2000 S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;

dato atto che:

- il gestore Montagna 2000 S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

rilevato che dai dati presentati è emerso per l'annualità 2017 che:

- non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015-19 approvato con Deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 dal Consiglio Locale di Parma, fatto salvo le revisioni ordinarie in conformità alla Deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 di Consiglio d'Ambito "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano degli Interventi e del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato";
- non sono stati avviati n.15 interventi per un importo complessivo lordo di € 442.000;
- sono stati anticipati/conclusi n.5 interventi previsti in altre annualità per un importo complessivo lordo di € 464.388;
- per n.8 interventi si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2017;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Marco Grana Castagnetti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti e la revisione ordinaria per l'annualità 2017 del gestore Montagna 2000 S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 8 del 06.03.2019

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: Montagna 2000 (PR)

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016, che il gestore Montagna 2000 ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 932.587	+ € 61.996	€ 994.583	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 932.587	+ € 61.996	€ 994.583	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

BERCETO				
PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 75.000	- € 75.000	€ 0	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 75.000	- € 75.000	€ 0	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.2 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017 - territorio di Berceto

Dalla tabella si nota come il gestore Montagna 2000 abbia effettuato investimenti lievemente maggiori rispetto alla pianificazione approvata: infatti rispetto agli investimenti sia lordi che netti la differenza ammonta a + € 61.996, non essendo stati previsti né incassati contributi estranei alla tariffa del SII.

Per avere un quadro più esaustivo degli investimenti rendicontati rispetto alla pianificazione approvata, si vedano le tabelle e i grafici successivi, nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017



**ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI INTERAMENTE DALLA PROTEZIONE CIVILE
INCREMENTO CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017**

Il gestore ha inoltre avviato nel 2017, e terminato nel 2018, una serie di interventi nei territori maggiormente colpiti dalla crisi idrica, finanziati dalla Protezione Civile - atto DPGR n. 158/2017 e DPGR 178/2017 – attualmente in corso di rendicontazione e che ammontano a ulteriori investimenti di ca. € 900.000.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato pianificato, e indicano le valutazioni in merito alle note giustificative degli tale scostamento fornite dal gestore.

Numero di interventi pianificati nel 2017: 24 (oltre a 2 Berceto)

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 15

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100% - esclusi interventi Berceto)	15	0	442.000	NO	2014PRMA0002 2014PRMA0007 2014PRMA0016 2014PRMA0018 2014PRMA0027 2014PRMA0031 2014PRMA0033 2014PRMA0050 2014PRMA0055 2014PRMA0060 2014PRMA0075 2014PRMA0079 2016PRMA0093 2016PRMA0097 2016PRMA0100
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	464.388	0	NO	
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID (<i>nulla-osta CAMB.75/2017 – interventi nuovo POI 2018-2022</i>)	1	57.885	67.587	NO	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	8	421.137	373.000	NO	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	1	51.173	50.000	NO	

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore non ha avviato n.15 interventi che erano stati programmati e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva. Per l'elenco di tali interventi si rimanda alla Tabella 3.

Il gestore ha concluso posticipatamente nel 2017 (rispetto a quanto programmato) n.5 interventi, ed ha avviato n.1 nuovo intervento che non erano nel Piano d'Ambito, a cui è stato attribuito un nuovo codice identificativo ID, autorizzato mediante nulla-osta ATERSIR - CAMB.75/2017.

Per n.8 interventi si è verificato uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al $\pm 20\%$ e le relative giustificazioni sono risultate esaustive.

Per n.1 intervento lo scostamento è inferiore al $\pm 20\%$ e quindi non è risultato necessario richiedere giustificazioni.

Risultano esclusi dalle tabelle e dai grafici della presente relazione gli ulteriori interventi dovuti all'emergenza idrica e finanziati interamente Protezione che sono stati realizzati tra l'annualità 2017 e il 2018, attualmente in corso di rendicontazione e che ammontano a ulteriori investimenti di ca. € 900.000 realizzati nell'annualità 2017 (per un totale 2017-2018 € 1.300.000 circa).

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

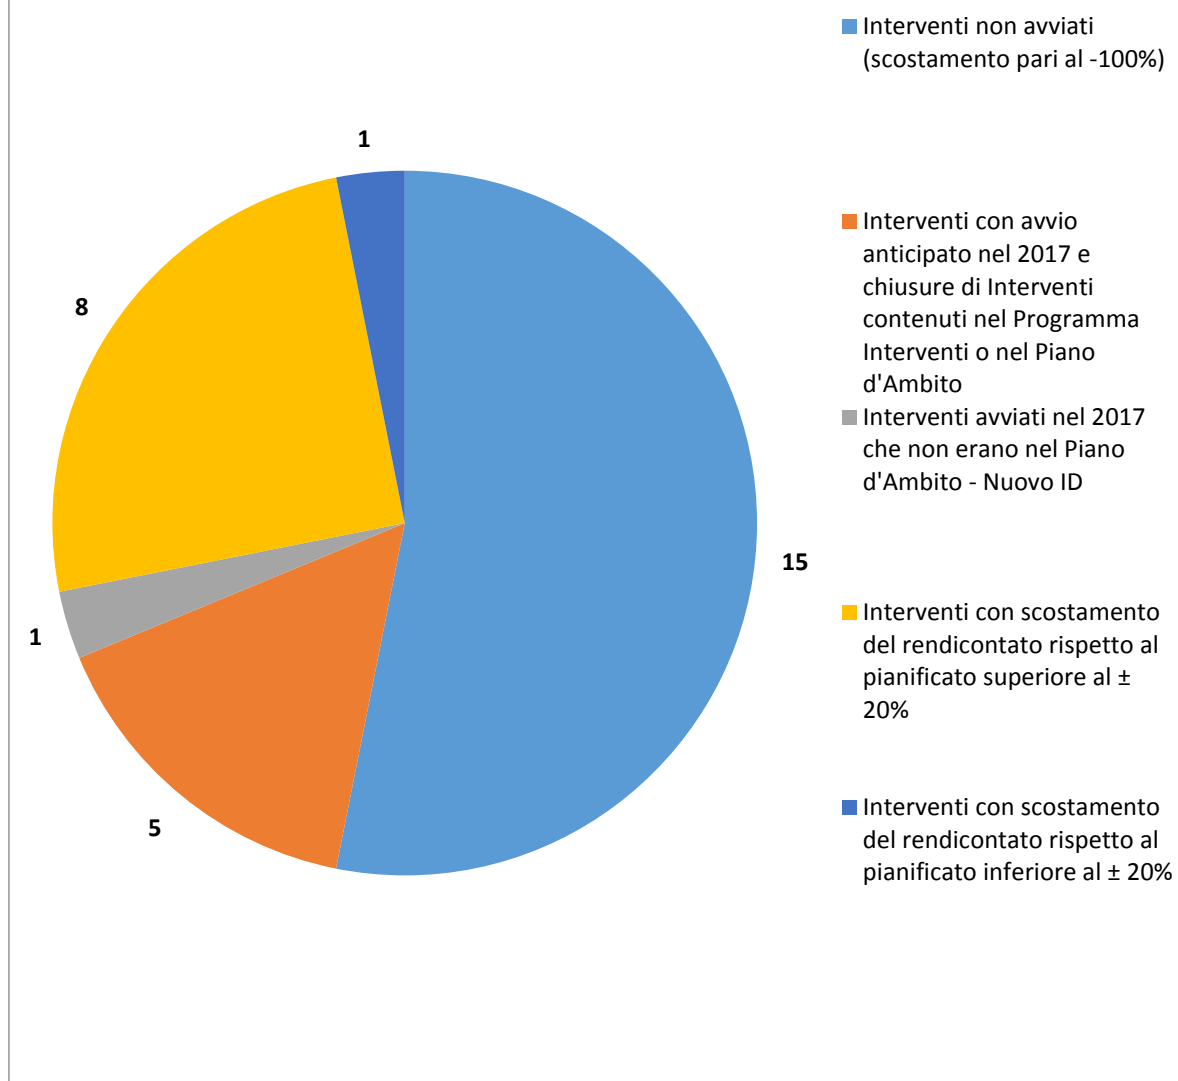


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

COMUNI	CODICE	TITOLO INTERVENTO	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017
Albareto	2014PRMA0002	AL108 - Estendimento e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011)	77.000	40.000
Bardi	2014PRMA0007	BA126 - Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, Lagacci, Granere e altri minori	102.000	37.000
Bedonia	2014PRMA0016	BE116 - Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane	30.000	20.000
Bedonia	2014PRMA0018	BE118 - Recupero funzionale e messa in sicurezza opere di presa e serbatoio a servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe	45.000	10.000
Bore	2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc. Felloni, Castiglione, Pozzolo, Franchi, altri minori e ripristino sorgenti in loc. Pozzolo	45.000	25.000
Borgo Val di Taro	2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	175.000	75.000
Borgo Val di Taro	2014PRMA0033	BVT103 - Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	40.000	40.000
Compiano	2016PRMA0097	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	20.000	20.000
Opere pluri-comunali	2016PRMA0093	Sistemi di contabilizzazione acqua	200.000	30.000
Pellegrino Parmense	2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	60.000	20.000
Solignano	2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	40.000	30.000
Solignano	2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	20.000	20.000
Terenzo	2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	68.000	25.000
Varano de' Melegari	2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	65.000	30.000
Varsi	2014PRMA0079	81MD - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi, Rocca, Sgui e Baghetti	20.000	20.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati (scostamento pari a -100%, esclusi interventi Berceto)

Codice	Comuni	Titolo	Servizio	PROGRAMMA INVESTIMENTI 2017 APPROVATO				CONSUNTIVO INVESTIMENTI RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017					Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento		
2014PRMA0029	Bore	BO133 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2016PRMA0094	Bore	Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori	ACQUEDOTTO	43.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0030	Borgo Val di Taro	BVT100 - Adeguamento e recupero funzionale del serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgotaro Capoluogo	ACQUEDOTTO	53.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0031	Borgo Val di Taro	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	175.000	75.000	0	75.000	0	0	0	-100	Posticipato per sincronizzare tempistiche Piano operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque". Ritardi nella progettazione esecutiva legati alla difficoltà a contattare tutti proprietari dei terreni attraversati	
2014PRMA0032	Borgo Val di Taro	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	42.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0033	Borgo Val di Taro	BVT103 - Rifacimento/estensione collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	FOGNATURA	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	-100	Difficoltà tecniche nel reperire i dati necessari alla progettazione esecutiva. Non erano ancora disponibili per la restituzione cartografica e digitale i dati delle reti e degli impianti. Sono in corso i rilievi e la georeferenziazione degli impianti.	
2014PRMA0034	Borgo Val di Taro	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	DEPURAZIONE	56.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0035	Borgo Val di Taro	BVT105 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0036	Borgo Val di Taro	BVT106 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0037	Borgo Val di Taro	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	45.000	0	0	0	0	0	0	0		
2016PRMA0095	Borgo Val di Taro	Rifacimento parziale e recupero funzionale cunicolo fognario in Piazza Verdi.Largo Roma nel Capoluogo	FOGNATURA	100.000	0	0	0	68.806	0	68.806	100	Intervento previsto nell'annualità 2016 ma completato anno 2017	
2016PRMA0096	Borgo Val di Taro	Potenziamento sistema depurativo (II livello) dell'agglomerato di Borgotaro (7.500 AE)	DEPURAZIONE	200.000	0	0	0	221.075	0	221.075	100	Intervento pianificato per l'annualità 2016, completato nel 2017	
2018PRMA0128	Borgo Val di Taro	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0038	Compiano	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	ACQUEDOTTO	65.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0039	Compiano	CO122 - Potenziamento/miglioramento acquedotto rurale di Costa Mezzana, Oratorio, ecc. (PRIP 2011)	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0040	Compiano	CO123 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0041	Compiano	CO124 - Telecontrollo serbatoi idrici e sollevamento fognario di Isola	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0042	Compiano	CO125 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2016PRMA0097	Compiano	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100	Difficoltà tecniche nel reperire i dati necessari alla progettazione esecutiva. Non erano ancora disponibili per la restituzione cartografica e digitale i dati delle reti e degli impianti. Sono in corso i rilievi e la georeferenziazione degli impianti.	
2016PRMA0098	Compiano	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	225.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0043	Fornovo di Taro	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	ACQUEDOTTO	185.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0044	Fornovo di Taro	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0045	Fornovo di Taro	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	DEPURAZIONE	150.000	50.000	0	50.000	51.173	0	51.173	2		
2014PRMA0046	Fornovo di Taro	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0047	Fornovo di Taro	FDT150 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0048	Fornovo di Taro	FDT151 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2014PRMA0049	Fornovo di Taro	FDT152 - Telecontrolli serbatoi	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0		
2016PRMA0099	Fornovo di Taro	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	143.000	0	0	0	0	0	0	0		
2016PRMA0106	Fornovo di Taro, Terenzo	* Interventi strutturali necessari al superamento delle criticità sull'acquedotto intercomunale Monte Bosso, a servizio dei comuni di Fornovo di Taro e Terenzo	ACQUEDOTTO	67.587	67.587	0	67.587	57.885	0	57.885	-14	Nota ATERSIR: nuovo intervento nulla osta ATERSIR CAMB.75/2017	

Codice	Comuni	Titolo	Servizio	PROGRAMMA INVESTIMENTI 2017 APPROVATO				CONSUNTIVO INVESTIMENTI RENDICONTATO - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2017
2014PRMA0071	Valmozzola	VA157 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Mormorola, Mariano ecc..	ACQUEDOTTO	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0072	Valmozzola	VA158 - sistemi di contabilizzazione acqua	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0073	Valmozzola	VAR156 - Interventi vari	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0074	Varano de' Melegari	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	114.000	0	0	0	33.060	0	33.060	100	Lavori previsti nell'annualità 2016 e completati nel 2017
2014PRMA0075	Varano de' Melegari	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	ACQUEDOTTO	65.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100	Posticipato per sincronizzare tempistiche Piano operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
2014PRMA0076	Varano de' Melegari	VM136 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0077	Varano de' Melegari	VM137 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0078	Varano de' Melegari	VM138 - Realizzazione impianti di telecontrollo serbatoi Pozzo Peschiera, Castagnola, Castello, Monte Mariolo e Lovai	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0107	Varano de' Melegari	* Collettore acque reflue Viazzano e Piani Riva	FOGNATURA		0	0	0	0	0	0	0	
2018PRMA0132	Varano de' Melegari	VDM74D - Costruzione impianto di depurazione loc. Vianino	DEPURAZIONE		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0079	Varsi	81MD - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi, Rocca, Sgui e Baghetti	ACQUEDOTTO	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100	La crisi idrica nel 2016-2017 non permetteva di realizzare interventi sugli acquedotti in oggetto per non aggravare ulteriormente la situazione già precaria
2014PRMA0080	Varsi	VAR153 - Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0081	Varsi	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0082	Varsi	VAR154 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO		0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0083	Varsi	VAR155 - Interventi vari	TUTTI		0	0	0	0	0	0	0	
2016PRMA0104	Varsi	Realizzazione nuova linea di distribuzione a servizio di via Cenni nel Capoluogo	ACQUEDOTTO	19.000	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE INVESTIMENTI					932.587	0	932.587	994.583	0	994.583		

Codice	Comuni	Titolo	Servizio	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2017	Contributi pianificati 2017	Importo netto pianificato 2017	Importo lordo consuntivo 2017	Contributi consuntivo 2017	Importo netto consuntivo 2017	Scostamento	Note giustificative
2014PRMA0021	Berceto	16MD - Lavori di sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in località Pian Farioli, Ghiare ed altri minori	ACQUEDOTTO	120.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100	
2014PRMA0022	Berceto	BER143 - Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case Brusini	FOGNATURA	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014PRMA0023	Berceto	BER144 - Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie)	TUTTI		15.000	0	15.000	0	0	0	-100	
2014PRMA0024	Berceto	BER145 - Sistemi di contabilizzazione acqua	ACQUEDOTTO	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0086	Berceto	BER14D - adeguamento depuratori Capoluogo e Ghiare	DEPURAZIONE	70.883	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0087	Berceto	BER15F - Adeguamento collettore via di Sales e località Poggio	FOGNATURA	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015PRMA0088	Berceto	BER16A - Ripristino sorgenti, sostituzione adeguamento tratti rete idrica acquedotti località Cervellino, Corchia e altri minori	ACQUEDOTTO	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE INVESTIMENTI					75.000	0	75.000	0	0	0		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 8 del 6.03.2019

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione consuntivo 2017 e revisione ordinaria Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 - Gestore Montagna 2000 S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 6 marzo 2019

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma
F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 3 giugno 2019
