

CLRA/2017/4 del 25 luglio 2017

CONSIGLIO LOCALE DI RAVENNA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE
F.to Antonio Bandini

CLRA/2017/4

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 del mese di luglio alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio della Provincia di Ravenna, si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo AT/2017/4309 del 17/07/2017.

Assume la presidenza il Coordinatore Antonio Bandini.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALFONSINE			NO	3,2301
BAGNACAVALLO	GIACOMONI MATTEO	ASSESSORE	SI	4,2542
BAGNARA DI ROMAGNA			NO	0,9101
BRISIGHELLA	RICCI ALESSANDRO	ASSESSORE	SI	2,2465
CASOLA VALSENIO	NATI MAURIZIO	ASSESSORE	SI	1,1623
CASTELBOLOGNESE			NO	2,4123
CERVIA	GIAMBI NATALINO	ASSESSORE	SI	6,5292
CONSELICE	ZAMBONI ROBERTO	ASSESSORE	SI	2,5543
COTIGNOLA	BALDINI PIERLUCA	ASSESSORE	SI	2,1009
FAENZA	BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	SI	12,9909
FUSIGNANO	PASI NICOLA	SINDACO	SI	2,2502
LUGO	RANALLI DAVIDE	SINDACO	SI	7,8591
MASSA LOMBARDA	AVVEDUTI LAURA	ASSESSORE	SI	2,4835
RAVENNA	BARONCINI GIANANDREA	ASSESSORE	SI	31,8503
RIOLO TERME	NICOLARDI ALFONSO	SINDACO	SI	1,7425
RUSSI	CALISTI LINO	ASSESSORE	SI	2,9457
S.AGATA SUL SANTERNO	SGARAVATO ELISA	ASSESSORE	SI	0,9962
SOLAROLO	BRICCOLANI STEFANO	ASSESSORE	SI	1,4817
PROVINCIA DI RAVENNA			NO	10,0000

Presenti n.15, quote 83,4475

Assenti n. 4, quote 16,55

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che: CLRA/2016/1 del 12 febbraio 2016

- con deliberazione n. 5 del 18 dicembre 2015 il Consiglio locale di Ravenna ha formalizzato la presa d'atto del consuntivo 2014 del gestore HERA s.p.a.
- con deliberazione n.1 del 12 Febbraio 2016 il Consiglio locale di Ravenna ha approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 32 del 26 aprile 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato l'integrazione del Piano di Ambito vigente nel territorio della Provincia di Ravenna, conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 il Consiglio d'ambito ha approvato, per il bacino di Ravenna, la determinazione, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr.
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;

- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2015 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n. 1 del 12 febbraio 2016 del Consiglio locale di Ravenna. Tuttavia sono stati anticipati due interventi previsti in annualità successive per un importo complessivo pari a 26.390,00 € mentre non sono stati avviati n. 8 interventi per un importo complessivo di 91.000€;
- ad eccezione delle variazioni sopracitate dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione di n° 2 interventi) nel corso dell'anno 2015, modifiche che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2015 e che non hanno comportato ritardi sugli altri interventi;
- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.15, quote 83,4475, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei sei interventi di cui in premessa) nel corso dell'anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l'anno 2015, e che non hanno comportato ritardi sugli altri interventi;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2015**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: RAVENNA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ravenna n. 01 del 12 Febbraio 2016, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

		PIANIFICATO 2015	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015	
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 10.732.000	€ 170.909	€ 10.902.909	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo Pianificato [B]	€ 103.000	€ 20.066	€ 123.066	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 10.629.000	€ 150.843	€ 10.779.843	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 3.149.500	-€ 488.918	€ 2.660.582	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera
TOTALE	Totale pianificato	€ 13.881.500	-€ 318.009	€ 13.563.491	Totale consuntivato

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 3 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) il gestore HERA ha invece eseguito investimenti superiori per circa l'1.5 % rispetto al pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

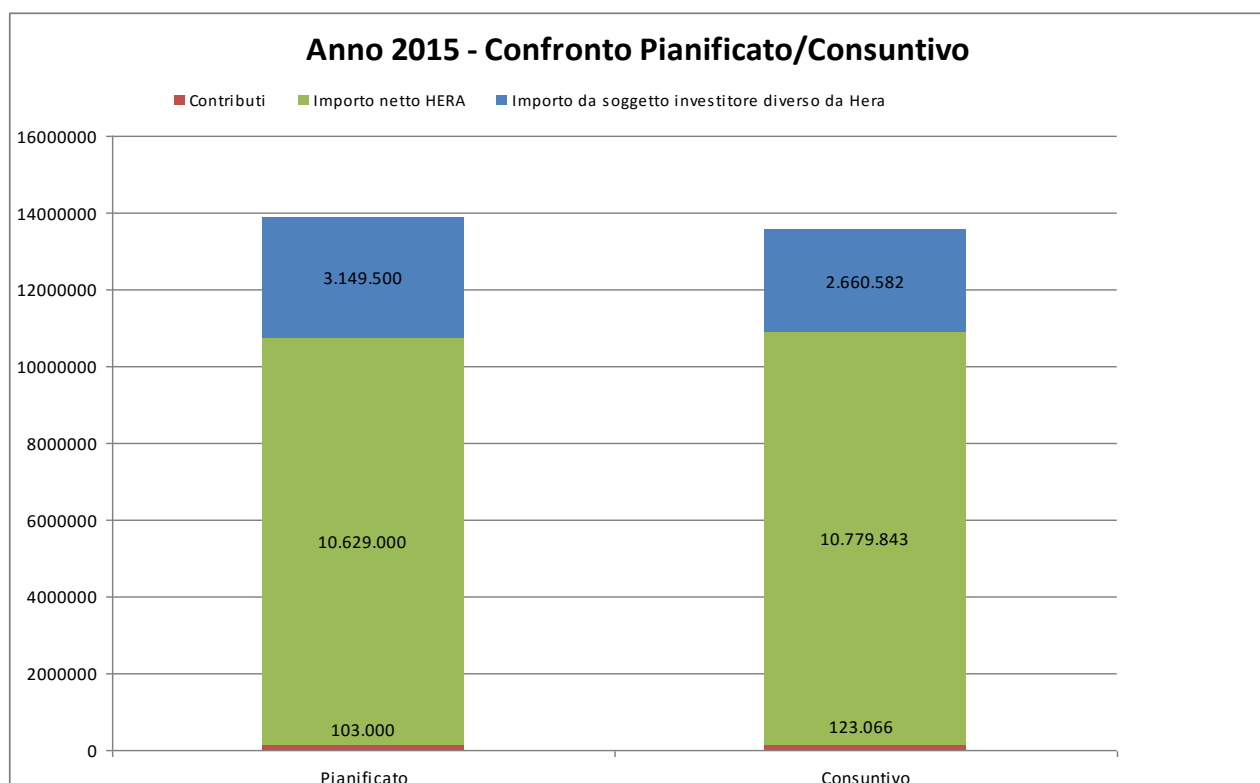


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2015 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2015*): 99

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 93

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	8	€ 0	€ 91.000	0		
2	Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	2	€ 26.390	€ 0	0		
3	Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	34	€ 2.114.684	€ 1.937.000	0		
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	57	€ 11.422.417	€ 11.853.500	GIUSTIFICAZIONE NON RICHESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2015 n.ro 8 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- sono stati anticipati n.ro 2 interventi che erano previsti in annualità successive e che non hanno comportato ritardi su altri interventi;
- non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

Inoltre si può notare come rispetto ai 93 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 36 % di questi (34 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 9 % rispetto al pianificato.

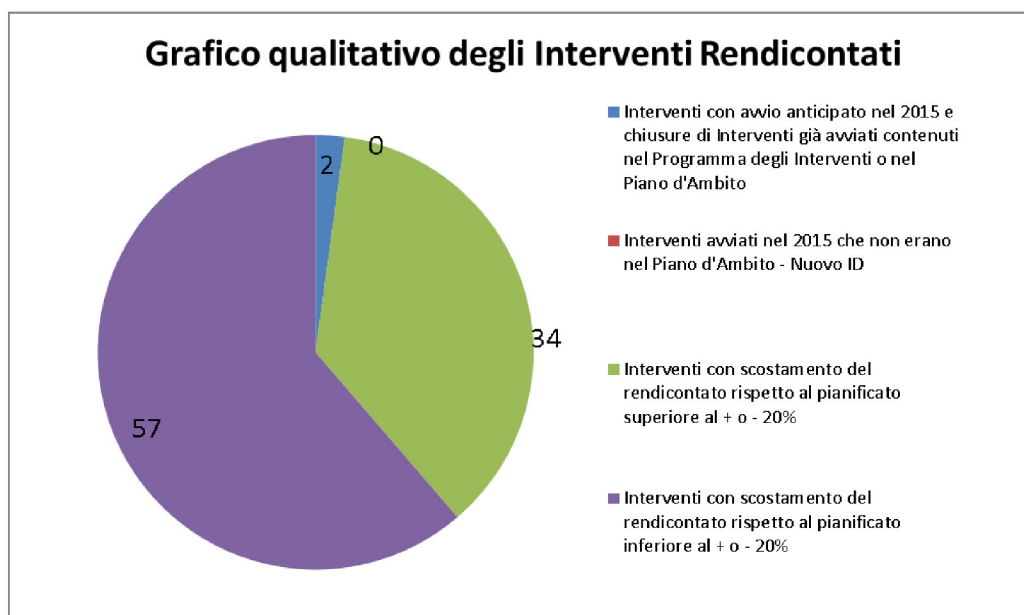


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

TIPO	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI
1	2014RAHA0009	POTENZ. RETE BONCELLINO -2° STRALCIO	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bagnacavallo	14.000
1	2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Castel Bolognese	10.000
1	2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3° LOTTO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	32.000
1	2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	5.000
1	2014RAHA0063	COLLETT.DEP.QUART.V.DAL POZZO V.BIASOLA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Faenza	1.000
1	2014RAHA0086	SIST.FOGNA MADONNA STUOIE-1°E2°STR	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Lugo	20.000
1	2014RAHA0118	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-2° STRAL.	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	8.000
1	2014RAHA0117	REAL.ADDUTTRICE "CORSO NORD"-3° STR.	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	1.000
							91.000,00

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015			CONSUNTIVO HERA 2015				
						PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2015 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2015 INV. NETTI	CONS 2015 INV. LORDI	CONS 2015 CONTRIBUTI	CONS 2015 INV. NETTI	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015
2014RAHA0001	DEP.ALFONSINE:AUTOMAZ.PER ADEG.LIM.AZOTO	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0002	COLLEGAMENTODEPURAZIONEBORGOCAVALLOTTI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	7.000	0	7.000	3.071	0	3.071	-56%	INTERVENTO CONCLUSO. INCASSO CONTRIBUTO PREVISTO NEL 2016 COME DA PIANO APPROVATO.
2014RAHA0003	ADEG. SCOLMAT. V. ROMA E RICOST. PARATOIA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	10.000	0	10.000	11.217	0	11.217	12%	
2014RAHA0004	REALIZZ.FOENATURA,VIA RASPONA ALFONSINE	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Alfonsine	90.000	0	0	94.504	0	0	5%	
2014RAHA0005	COLLA DEPUR.V.GUERRINA-ALFONSINE 2°ST.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Alfonsine	26.000	0	0	21.674	0	0	-17%	
2015RAHA0001	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - ALFONSINE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Alfonsine	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0006	RINN RETE ACQ V. DANTE - VILLANOVA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	85.000	0	85.000	86.926	0	86.926	2%	
2014RAHA0009	POTENZ. RETE BONCELLINO -2° STRALCIO	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bagnacavallo	14.000	0	0	0	0	0	-100%	ATTIVITÀ AVVIATA NEL 2015 MA NON ANCORA RENDICONTATA PER MANCANZA ACCORDO ATTUATIVO.
2014RAHA0010	DEP.BAGNACAVALLI:ADEG.+POT.LIN.ACQUE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	1.161.000	0	1.161.000	1.160.981	0	1.160.981	0%	
2014RAHA0011	RIF. FOGN. VIALE DANTE - VILLANOVA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	50.000	0	50.000	44.144	0	44.144	-12%	
2014RAHA0012	RIF FOGN. PER RIQUAL. CENTRO STORICO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	45.000	0	45.000	42.760	0	42.760	-5%	
2014RAHA0013	COLLETTAMENTODEPURAZIONETRAVERSARA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0014	INSTALL.TLC-ADEG.PRESA-SOLL.CA'DEL VENTO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	50.000	0	50.000	449	0	449	-99%	NEL 2015 SONO STATI NECESSARI APPROFONDIMENTI PER DEFINIRE LA REALE NECESSITÀ DELL'INTERVENTO E SUCCESSIVAMENTE ANCHE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PIÙ ADEGUATA. PER TALE MOTIVO LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO È STATA POSTICIPATA AL 2016.
2014RAHA0015	ADEG.SCOLM-GRIGLIA-SOLL.VFORMA BAGNACAV.	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	10.000	0	10.000	13.098	0	13.098	31%	AVANZAMENTO INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0016	COLLEGAMENTO ALLA DEPURAZIONE DI MASIERA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Bagnacavallo	136.000	0	0	154.892	0	0	14%	
2015RAHA0002	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - BAGNACAVALLI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Bagnacavallo	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0003	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VILLA VEZZANO	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Brisighella	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0020	MANUTENZIONE FOGNATURA IN V.EMILIANI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Brisighella	6.000	0	6.000	5.190	0	5.190	-13%	
2014RAHA0021	ADEGU.RETE FOGNA V.FRIULI-BRISIGHELLA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Brisighella	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0180	ADEG. RETE FOGNARIA S.MARTINO IN GATTARA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Brisighella	100.000	0	100.000	112.620	0	112.620	13%	
2015RAHA0033	STUDIO PRELIMINARE FOGNATURA VIA MORONICO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Brisighella	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0022	AUTOMAZ. PARATIA BACINI RIO CESTINA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	17.000	0	17.000	16.942	0	16.942	0%	
2014RAHA0024	SOST. FILTRO POT. M.FORTINO	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	98.000	0	98.000	97.221	0	97.221	-1%	
2015RAHA0004	REALIZZAZIONE COLLETTORE SCARICO POTABILIZZATORE DI CASOLA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0005	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO CASOLA VALSENI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Casola Valsenio	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0101	SIST. APPROV. IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Castel Bolognese	10.000	0	0	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO PROGETTAZIONE ALL'INIZIO DEL 2016 IN ATTESA DELIBERA PIANI CON INCLUSIONE INTERVENTO NELLA CONFIGURAZIONE FINALE.
2014RAHA0027	EST.RETE CASE SPARSE V.SALARA (A.09.14)	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	15.000	0	0	15.015	0	0	0%	
2015RAHA0006	POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MILANO MARITTIMA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0029	ADEGUAMENTO DEPURATORE DI CERVIA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0030	NUOVA VASCA DI EGUALIZZAZIONE TRATTAMENTO ACQUE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0031	DEP.CERVIA: AUTOMAZ. ADEG. LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0032	ADEG.LINEA ACQUE IMP.ELETT. DEP. CERVIA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Cervia	10.000	0	10.000	11.286	0	11.286	13%	
2014RAHA0034	COLL.V.VISDOMINA-BIGATTA 3°ST.-CERVIA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0035	COLLA DEP.DI MONTELETTO DI CERVIA1°E2°S	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	165.000	0	0	160.069	0	0	-3%	
2014RAHA0036	REALIZZ.IMP.SOLLEV.FOGN. TANTLON-CERVIA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	6.000	0	0	5.729	0	0	-5%	
2014RAHA0037	BY-PASS FOGNATURA NORD CERVIA-2°LOTTO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	66.000	0	0	66.293	0	0	0%	
2014RAHA0038	BY-PASS FN. NORD CERVIA-1°LOTTO 1°STR	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	310.000	0	0	782	0	0	-100%	LO SCOSTAMENTO È DOVUTO AD IMPORTI DI PIANO INVERTITI CON ID 2014RAHA0039. LA CONSUNTIVAZIONE È STATA EFFETTUATA IN MODO COERENTE AL LAVORO.
2014RAHA0039	BY-PASS FN. NORD CERVIA 1°LOTTO-2°STR	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	1.000	0	0	309.467	0	0	30847%	LO SCOSTAMENTO È DOVUTO AD IMPORTI DI PIANO INVERTITI CON ID 2014RAHA0038. LA CONSUNTIVAZIONE È STATA EFFETTUATA IN MODO COERENTE AL LAVORO.
2014RAHA0040	REALIZZ. COLL. F.N ZONA SUD CERVIA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	5.000	0	0	0	0	0	-100%	NEL 2015 ERA PREVISTO UNICAMENTE L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. PROGETTAZIONE NEL 2016 CONFERMATO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0041	BYPASS PRINCIPALE NORD CERVIA 3° LOTTO	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Cervia	32.000	0	0	0	0	0	-100%	ATTIVITÀ AVVIATA NEL 2015 MA NON ANCORA RENDICONTATA PER MANCANZA ACCORDO ATTUATIVO.
2015RAHA0007	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - CERVIA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Cervia	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0042	SISTE.EDILE STRUTTURALE POTAB.CONSELICE	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Conselice	12.000	0	12.000	18.118	0	18.118	51%	AVANZAMENTO PROGETTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0043	RICONFIG.ALIMENTAZIONE IDRICA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Conselice	14.000	0	14.000	19.171	0	19.171	37%	ATTIVITÀ '2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0044	POT.CONSELICE MAN.VASCA E SOST.IMP.OZONO	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Conselice	95.000	0	95.000	95.171	0	95.171	0%	
2014RAHA0045	LAVEZZOLA-SEPARAZIONE FOGNE NERE ZONA FE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Conselice	65.000	0	65.000	75.424	0	75.424	16%	
2014RAHA0048	MODELL. SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Conselice	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0008	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LAVEZZOLA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Conselice	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0051	ADEG. SCOLMATORE V.VIGNE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	10.000	0	10.000	5.576	0	5.576	-44%	AVANZAMENTO INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0052	RINNOVO SOLLEVAMENTO V.GRILLI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	0	0	0	6.429	0	6.429		ANTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE PREVISTA NEL 2016 AL FINE DI COMPLETARE LE OPERE NEL 2016 COME DA PIANO APPROVATO.
2014RAHA0053	NUOVA FOG V.DEL RIO BARBIANO COTIGNOLA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Cotignola	200.000	0	200.000	240.687	0	240.687	20%	
2014RAHA0055	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - HERA	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Faenza	521.000	0	521.000	513.816	0	513.816	-1%	
2014RAHA0056	EST.RETE LOC. REDA - II LOTTO - CONAMI	ACQUEDOTTO	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Faenza	290.000	0	0	172.271	0	0	-41%	SLITTAMENTO COMPLETAMENTO CANTIERE AI PRIMI MESI 2016.
2014RAHA0057	VERIFICA ADEG IMP EE DIRI ATO7	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Faenza	60.000	0	60.000	60.211	0	60.211	0%	
2014RAHA0059	ADEG. DEP. FAENZA LIMITI AZOTO	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Faenza	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0062	MODELL. SISTEMA FOGNARIO FAENZA (incl. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER CRITICITÀ VIA LAPI)	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Faenza	12.000	0	12.000	11.827	0	11.827	-1%	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015			CONSUNTIVO HERA 2015				NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015
						PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2015 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2015 INV. NETTI	CONS 2015 INV. LORDI	CONS 2015 CONTRIBUTI	CONS 2015 INV. NETTI	% SCOSTAMENTO	
2014RAHA0121	ADEG.LINEA ACQUE DEP. MARINA DI RAVENNA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0122	ADEG. DEPURATORE LIDO DI CLASSE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	21.000	0	21.000	25.206	0	25.206	20%	
2014RAHA0123	DEP.RAVENNA - ADEG.LINEA FANGHI	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0124	REVAMPING LINEA ACQUE DEP. RAVENNA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	13.000	0	13.000	7.889	0	7.889	-39%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0125	DEP. RAVENNA: REAL. NUOVA LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0127	REVAMPING DEPURATORE DI RAVENNA 2*LOTTO (FANGHI E OSSIDAZIONE)	DEPURAZIONE	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	15.000	0	0	19.521	0	0	30%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0128	DEP.MAR.RAVENNA, ADEGUAMENTO 1*STR-1*LOT	DEPURAZIONE	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	15.000	0	0	1.921	0	0	-87%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2015. I MINORI COSTI SONO LEGATI AD ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA
2015RAHA0025	REALIZZAZIONE MODELLO DEPURATORE RAVENNA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0130	ADEG. RETE FOGNARIA PONTE NUOVO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0131	COLLEGAMENTO A DEP. BORGO MONTONE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	77.000	0	77.000	100.035	0	100.035	30%	MAGGIORI ONERI DOVUTI ALLA REALIZZAZIONE DI MAGGIORI ASFALTI IN QUANTO STRADA FORTEMENTE AMMALORATA.
2014RAHA0132	ADEG. FOG. SANTERNO E PIANGIPANE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	342.000	0	342.000	341.048	0	341.048	0%	
2014RAHA0133	RINNOVO RETE FOGNARIA PIAZZA KENNEDY	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	134.000	0	134.000	137.757	0	137.757	3%	
2014RAHA0134	MANUT. STRAORDINARIA IDROVORA BIDENTE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0135	ADEG. SCOLMATORI V.ROMEA SUD PONTE NUOVO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0136	POT.FN AREAPORT. POLOG. SINO DEPCITTA'	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0137	IDROV.NORDCITTA'-ADEGIMPELE X GEST.POMPE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	10.000	4.618	0	4.618	-54%	AVANZAMENTO INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0138	MODELL. SISTEMA FOGNARIO RAVENNA (incl. STUDIO DI FATTIBILITÀ PER INTERVENTI SU PRINCIPALI SCOLMATORI)	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	30.000	0	30.000	31.084	0	31.084	4%	
2014RAHA0139	COLLET. A DEP. RAVENNA FRAZIONE CAMPIANO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	87.000	0	87.000	89.419	0	89.419	3%	
2014RAHA0140	RIFAC. SOLL. RAGONE-RAVENNA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	12.000	0	12.000	17.110	0	17.110	43%	AVANZAMENTO PROGETTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0141	RIFAC. SOLL. GAMBELLARA-RAVENNA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	13.000	0	13.000	11.204	0	11.204	-14%	
2014RAHA0142	REAL. BY-PASS FOGN ZONA NORD RAVENNA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0143	ADEG.RETE FOGN. PORTO FUORI-NUOVA RETE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0144	COLLEG.A DEPURAZIONE BASTIA-B.PASNA,RAV.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	163.000	0	0	157.419	0	0	-3%	
2014RAHA0145	COLLEG.A DEPURAZIONE, B.PAPALE-RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	3.500	0	0	3.874	0	0	11%	
2014RAHA0146	COLLEG.A DEPURAZIONE CONVENTELLO RAV	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	190.000	0	0	175.150	0	0	-8%	
2014RAHA0147	COLLEG.A DEPURAZIONE DI DUCENTA,RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	172.000	0	0	101.015	0	0	-41%	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA COME DA PIANIFICAZIONE. TERMINE LAVORI NEL 2016
2014RAHA0148	COLLEG.A DEP. DI DURAZZANO-RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	3.500	0	0	2.214	0	0	-37%	
2014RAHA0149	COLLEG. A DEPURAZIONE DI ERBOSA,RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	3.500	0	0	2.479	0	0	-29%	
2014RAHA0150	COLLEG.A DEP.DI MASSA CASTELLO, RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	50.000	0	0	40.840	0	0	-18%	
2014RAHA0151	COLLEG.A DEPURAZ.MENSA-MATELLICA,RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	27.000	0	0	17.649	0	0	-35%	NEL 2014 MANCATA STIPULA DELLE SERVITU' E MANCATA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI LEGATI ALL'ACCATASTAMENTO. LAVORI IN CORSO NEL 2015. PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2016.
2014RAHA0154	COLLEG.A DEPURAZ.BOTTEGA LA GUARNERA,RAV	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	327.000	0	0	313.489	0	0	-4%	
2014RAHA0155	COLLEG.A DEP. DI VIA CANALAZZO, RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	10.000	0	0	5.273	0	0	-47%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014RAHA0156	COLLEG.A DEP. DI PORTO FUORI, RAVENNA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	115.000	0	0	91.713	0	0	-20%	
2014RAHA0158	REAL. SOLL. SN1 VIA CHERSO - DARSENA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0159	REAL.SOLL.SN3 ROTONDA BELGIO-DARSENA	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0026	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO BIDENTE	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0027	INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORE SOLLEVAMENTO NORD CITTA'	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0028	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - LIDO DI CLASSE E LIDO DI SAVIO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0029	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - MARINA DI RAVENNA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0032	TRATTO DI RETE DI FOGNATURA VIA BONIFICA - PORTO FUORI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Ravenna	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0161	ADEG. DEPURATORE DI RUSSI - 3*LOTTO	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Russi	0	-103.000	-103.000	0	-103.354	-103.354		
2014RAHA0162	COMPL. FOGNA VIA GUCCI E S.GIOV. 3* STR.	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Russi	12.000	0	12.000	12.172	0	12.172	1%	
2014RAHA0163	COLL.ZA"MONALDINA NORD"-2* STR.-RUSSI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Russi	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0163	COLL.ZA"MONALDINA NORD"-2* STR.-RUSSI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Russi	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0164	ADEG.RETE FOGN.ARTIG.RUSSI-FIUMAZZO2*ST.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	38.000	0	0	37.943	0	0	0%	
2014RAHA0165	ADEG.RETE FOGN.ZONA ARTIG.RUSSI 3*STR.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	16.000	0	0	10.027	0	0	-37%	NEL 2014 MANCATA STIPULA DELLE SERVITU' E MANCATA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI LEGATI ALL'ACCATASTAMENTO. LAVORI IN CORSO NEL 2015. PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2016.
2014RAHA0167	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1* STR.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0167	COLL. ZA "MONALDINA NORD" - 1* STR.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Russi	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0030	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO E INTERVENTI PER RIDUZIONE CARICHI SCOLMATORI - RUSSI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Russi	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0168	COLLETTAMENTO DI UN TRATTO FOGNARIO DI S.P. 13 BASTIA ALLA DEPURAZIONE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	S. Agata sul Santeramo	6.000	0	6.000	8.943	0	8.943	49%	AVANZAMENTO INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE.
2014RAHA0169	POT.RETE ACQ NUOVA LOTT.IND.-SOLAROLO	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Solarolo	0	0	0	0	0	0		
2015RAHA0031	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA DI SOLAROLO	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Solarolo	0	0	0	0	0	0		
2014RAHA0171	EST.RETE FOG NUOVA LOTT.IND.-SOLAROLO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Solarolo	0	0	0	0	0	0		

13.881.500,00 -103.000,00 10.629.000,00 13.563.491,49 -123.065,89 10.779.843,40

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 4 del 25 luglio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 25 luglio 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Antonio Bandini

Il segretario verbalizzante
F.to Stefano Santandrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna 4 Agosto 2017

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
