

CLPR/2018/4 dell'11 maggio 2018.

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo
Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.**

LA COORDINATRICE
F.to Tiziana Benassi

CLPR/2018/4

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno **2018** il giorno undici del mese di maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma – Strada Repubblica n. 1 - si è riunito il Consiglio Locale di Parma convocato con lettera prot. n. PG/AT/2018/2986 del 4.05.2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Locale Tiziana Benassi, che chiama la funzionaria Fausta Pizzaghi ad assisterla in qualità di segretaria verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO	Riccoboni Davide	Sindaco	SI'	0,6059
BARDI			NO	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO			NO	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO			NO	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Zanetti Michela	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO			NO	1,8860
COMPIANO			NO	0,4083
CORNIGLIO			NO	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Malvisi Davide	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO			NO	1,2243
FORNOVO DI TARO	Gretni Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO	Bricoli Giordano	Sindaco	SI'	2,0497

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MEZZANI	Azzali Romeo	Sindaco	SI'	0,8366
MONCHIO DELLE CORTI	Moretti Claudio	Sindaco	SI'	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO			NO	0,4164
PARMA	Benassi Tiziana	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8301
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA			NO	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Trevisan Marco	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI	Gaibazzi Patrizia	Assessore	SI'	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO	Cesari Nicola	Sindaco	SI'	2,0153
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA	Bodria Amilcare	Sindaco	SI'	0,5961
TORNOLO			NO	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO	Lanzi Michele	Assessore	SI'	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI			NO	0,7052

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
VARSI			NO	0,4384
PROVINCIA DI PARMA			NO	10,0000

Presenti n. 17 quote 65,1 Assenti n. 30 quote 34,9

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice Tiziana Benassi, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.2 del 24 marzo 2016 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il Programma Operativo Interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Emiliambiente S.p.A., proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano d'Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 48 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Parma di competenza del gestore Emiliambiente S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"; tale deliberazione tra l'altro dispone che:

- entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
- il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
- il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore Emiliambiente S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo Interventi 2015-19, approvato con deliberazione n.2 del 24 marzo 2017 del Consiglio Locale di Parma – o a quanto previsto dal Piano d'Ambito;
- sono presenti n.4 interventi contenuti nel Programma Operativo Interventi 2015 – 2019 o nel Piano d'Ambito che hanno avuto avvio anticipato nel 2016 o chiusura, sempre nel 2016, di interventi programmati nelle precedenti annualità, per un importo complessivo di € 36.862;
- non sono stati avviati n.3 interventi per un importo complessivo di € 250.000;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato (le differenze derivano sostanzialmente dai contributi a fondo perduto non previsti in fase di pianificazione e agli investimenti di struttura non ricompresi, vedi tabella 1 di cui all'allegato 1);
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria sulla natura dell'intervento avente titolo "Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto"; codice identificativo Atersir ID:2016PREA00030;
- a seguito della trasmissione della documentazione oggetto della presente ai Comuni interessati non sono pervenute osservazioni;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare un supplemento istruttorio sulla natura dell'intervento avente titolo "Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto"; codice identificativo Atersir ID:2016PREA00030;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi a favorevoli n. 17 (quote 65,1), contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore Emiliambiente S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di svolgere un supplemento istruttorio sulla natura dell'intervento avente titolo "Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto"; codice identificativo Atersir ID:2016PREA00030;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Gestore: Emiliambiente S.p.A. (PR)**

1 marzo 2018

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.2 del 24 marzo 2016, che il gestore Emiliambiente S.p.A. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 3.150.000	-€ 6.358	€ 3.143.642	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 43.738	€ 43.738	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 3.150.000	-€ 50.096	€ 3.099.904	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Emiliambiente S.p.A. abbia effettuato investimenti che si discostano in misura modesta dalla pianificazione approvata in marzo 2016, non sono compresi gli Investimenti di Struttura.

Le differenze evidenziate derivano essenzialmente dai contributi a fondo perduto non previsti in fase di pianificazione pari a €43.738.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

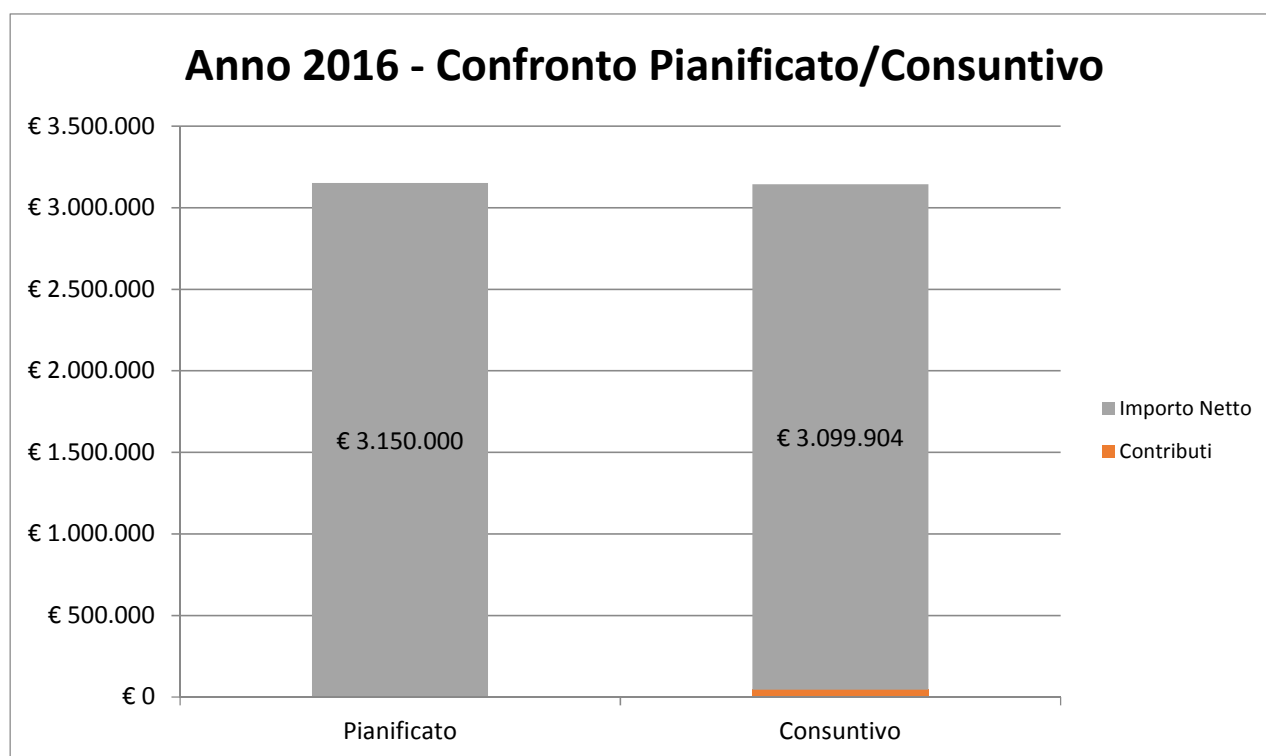


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato, indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento, che il gestore ha fornito, non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare, non sono compresi gli investimenti di struttura.

Numero di interventi programmati nel 2016: 14

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 15

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	3	€ 0	€. 250.000	NO	2014PREA0008 2014PREA0022 2014PREA0007	
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	4	€ 36.862	€ 0	NO	2014PREA0009 2014PREA0018 2014PREA0001 2015PREA0026	
Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	8	€ 2.977.584	€ 2.780.000	2016PREA0030	2014PREA0015 2014PREA0021 2016PREA0031 2014PREA0014 2014PREA0012 2014PREA0006 2014PREA0020	SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO SULLA NATURA DELL'INTERVENTO
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	3	€ 129.196	€ 120.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato nel 2016 n.3 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda "Allegato 1"), ha chiuso per €.36.862 interventi previsti in altre annualità. Si può notare inoltre come rispetto agli interventi programmati, che il gestore ha rendicontato, n. 8 interventi hanno avuto uno scostamento, rispetto alle previsioni di spesa, superiore al 20% in più o in meno, di tali interventi le giustificazioni del gestore sono state ritenute esaustive, tranne per l'intervento: ID2016PREA0030 – Comune di Fidenza – "Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep.di Fidenza e realizzazione asfalto", per il quale questa Agenzia si riserva di fare ulteriori approfondimenti sulla natura dell'intervento. Per 3 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

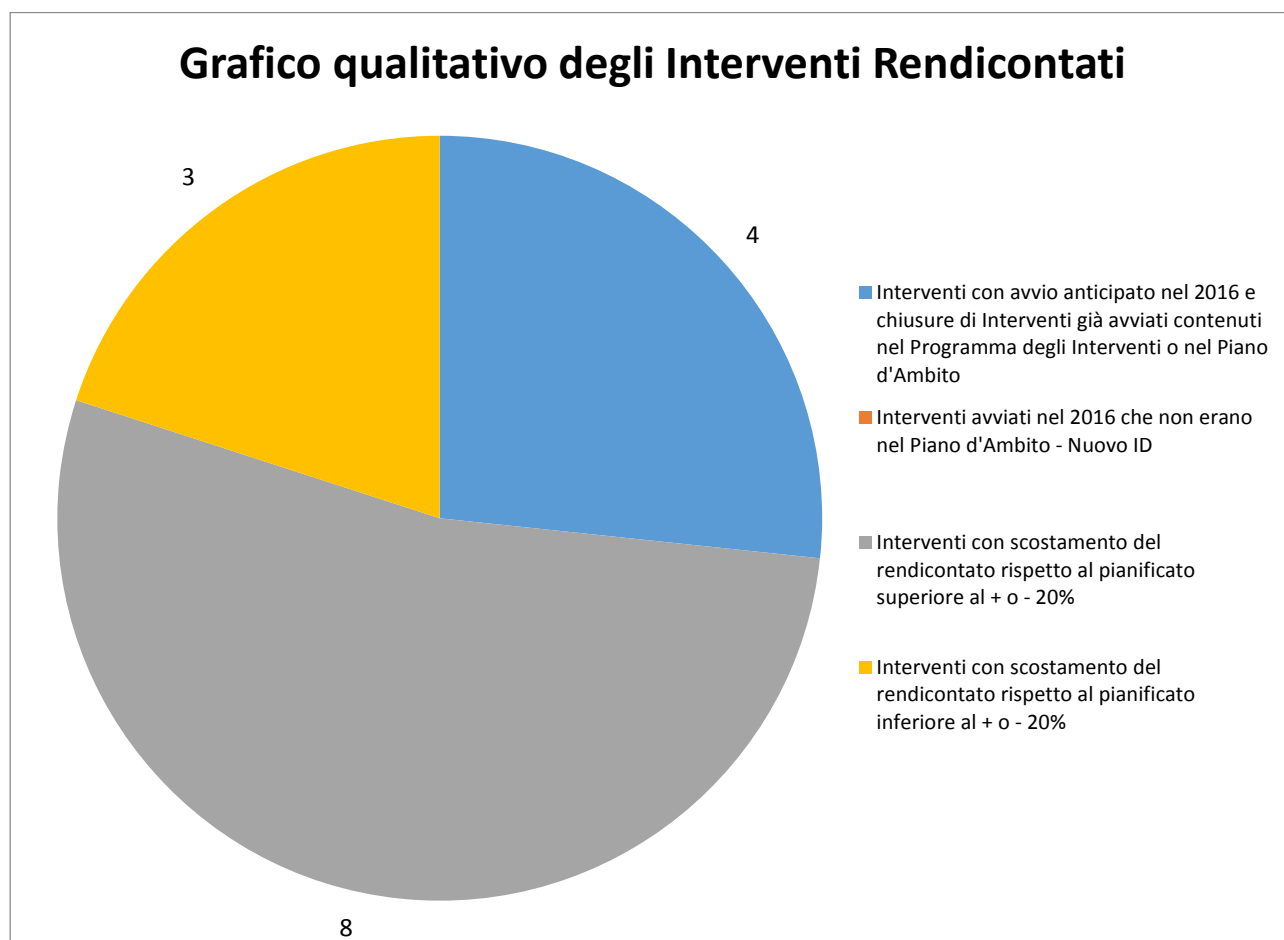


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2016
Sissa Trecasali,	2014PREA0022	062-EA - Potenziamento impianto di depurazione di Trecasali (2° liv.)	1.800.000	100.000
San Secondo,	2014PREA0007	024-EA-Adeguamento impianto di depurazione San Secondo, livello III	160.000	50.000
Torrile, Colorno,	2014PREA0008	030-EA-Rifacimento condotta alimentazione San Polo	425.000	100.000

TAB3 – Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (percentuale di scostamento -100%)

ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PREA0001	Busseto	Potenz. depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) + Adeguamento impianto depuraz. Busseto	DEPURAZIONE	700.000	0	0	0	18.830	0	18.830	100%	Completamento lavori
2014PREA0002	Colorno	008-EA - Condotte fognarie collettamento reflui Vedole-Colorno	FOGNATURA	205.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0003	Fidenza	009-EA - Adeguamento e potenziamento depuratore Fidenza	DEPURAZIONE	1.587.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0004	Fidenza	013-EA - Condotte fognarie collettamento reflui S.Margherita-Fidenza per adeguamento scarichi EA 200-2000	FOGNATURA	500.000	70.000	0	70.000	76.023	0	76.023	8%	Realizzate piccole varianti migliorative
2014PREA0005	Fontanellato	019-EA - Adeguamento e miglioramento reti e imp.acqua e sistema fognario-depurativo	FOGNATURA	400.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014PREA0006	Roccabianca	022-EA - Realizzazione fognatura per collettamento reflui Ragazzola a Roccabianca	FOGNATURA	330.000	70.000	0	70.000	525	0	525	-99%	Le opere di importo complessivo pari ad -. 330.000, sono state progettate dall'Amm. Provinciale, la quale ha affidato i lavori in data 31/12/2011 e terminati nel 2016. Il cofinanziamento iniziale dell'opera a carico di EA era previsto in -. 230.000, ma a seguito dei ribassi di gara il contributo è stato ridefinito in -. 158.890,53, già corrisposti all'Amm. Provinciale. Il progetto a base d'asta prevedeva il collegamento della zona est di Ragazzola all'impianto di depurazione di Roccabianca, Con le economie derivanti da ribasso ottenuto, l'amm. provinciale avrebbe dovuto realizzare il collegamento della zona ovest della frazione, ma a causa delle dismissioni delle Province, non si è dato seguito all'intervento, che verrà realizzato nel 2018 da Emiliambiente.
2014PREA0007	San Secondo	024-EA - Adeguamento impianto depurazione San Secondo, livello III.	DEPURAZIONE	160.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	I lavori previsti consistevano nella realizzazione di : 1) Adeguamento impianto elettrico; 2) Rifacimento impianto di ossidazione; 3) Installazione pesa per autobotti; I lavori di cui al punto 1) sono stati realizzati da EA e imputati nel Cap. EA45, mentre gli altri interventi previsti al punto 2 e 3, sono stati eseguiti come opere migliorative da parte dell'impresa a cui è stato aggiudicato l'appalto (con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa) per la manutenzione degli impianti di depurazione. Le opere previste sono quindi state tutte realizzate, ma non assegnate al presente Titolo.

ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014PREA0020	Fontanellato, Fidenza	060-EA - Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	ACQUEDOTTO	2.410.000	350.000	0	350.000	26.219	0	26.219	-92%	Le opere di importo complessivo pari ad E. 1.450.000, sono state progettate dall'Amm. Provinciale, la quale ha affidato i lavori nel 2011, poi terminati (tranne alcuni sistemazioni) nel 2015. Il cofinanziamento iniziale dell'opera a carico di EA era previsto in -. 450.000, ma a seguito dei ribassi il contributo, è stato ridefinito in -. 250.000,00 (circa - la cifra precisa dovrà essere indicata dalla R.E.R., con l'approvazione del consuntivo). L'Impresa Esecutrice delle opere appaltate dalla Provincia è fallita prima di realizzare tutte le opere previste. L'Amministrazione Provinciale di Parma ha chiesto ad EA, anziché di corrispondere il Contributo previsto e sopra indicato, di realizzare una parte delle opere non realizzate dall'Impresa Esecutrice. EA ha quindi realizzato opere per un totale di circa -. 300.000,00. Ad oggi l'amministrazione Provinciale non hanno ancora consegnato ad EA nè il collaudo delle opere, nè la rendicontazione delle spese inserite a quadro economico.
2014PREA0021	Opere pluricomunali	061-EA - Ricerca perdite acquedotto, controllo pressioni, sostituzione contatori	ACQUEDOTTO	3.590.000	100.000	0	100.000	20.944	0	20.944	-79%	Effettuata prevalentemente con personale interno
2014PREA0022	Sissa Trecasali	062-EA - Potenziamento impianto di depurazione di Trecasali (2° liv.)	DEPURAZIONE	1.800.000	100.000	0	100.000	0	0	0	-100%	I lavori previsti nel 2016, non sono stati realizzati in quanto le somme previste sono servite ad aumentare il capitolo di spesa 45EA, per interventi di somma urgenza. La realizzazione delle opere è pianificata per il 2018.
2014PREA0023	Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Roccabianca, San Secondo, Salsomaggiore, Torrile, Sissa Trecasali, Opere pluricomunali	063-EA - SIT Cartografia e modellazione reti	TUTTI	490.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0%	
2014PREA0024	Colorno, Fidenza, Fontanellato, Roccabianca, San Secondo, Salsomaggiore, Torrile, Sissa Trecasali, Opere pluricomunali, Busseto	046-EA - Quota allestimento sede e attrezzature (HW SW)	STRUTTURA	3.039.000	200.000	0	200.000	125.772	0	125.772	-37%	Codice generico in cui confluiscono investimenti diversi riconducibili all'infrastruttura di base di Emiliambiente (hardware, software, interventi sulla sede, ecc.) di molto difficile stima preventiva.
2015PREA0025	Colorno	007-EA - Depurazione reflui Mezzano Rondani	DEPURAZIONE		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0026	Busseto, Soragna	003-EA - Collettamento reflui Soragna Busseto	FOGNATURA		0	0	0	4.744	0	4.744	100%	Completamento lavori
2015PREA0027	Torrile	031-EA - Collettamento reflui S.Andrea al depuratore di S.Polo	FOGNATURA		0	0	0	0	0	0	0%	
2015PREA0028	Fontanellato	056-EA - Adeguamento scarichi acque reflue Fontanellato	DEPURAZIONE		0	0	0	0	4.900	-4.900	0%	

ID ATERSIR	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO 2016				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016				
				IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	INVESTIMENTI LORDI 2016	CONTRIBUTI 2016	INVESTIMENTI NETTI 2016	CONSUNTIVO LORDO 2016	CONTRIBUTI 2016	CONSUNTIVO NETTO 2016	Scostamento	Note del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del consuntivo rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2015PREA0029	Opere pluricomunali	044-EA - Strumentazione per attività di ricerca perdite	ACQUEDOTTO	325.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016PREA00030	Fidenza	Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto.	DEPURAZIONE	400.000	200.000	0	200.000	3.927	0	3.927	-98%	Emiliambiente in data 30 maggio 2016 (vedi allegato), ha richiesto al Comune di Fidenza l'approvazione del progetto di Ristrutturazione edilizia della palazzina esistente presso il depuratore di Fidenza da adibire a museo espositivo e laboratorio delle acque. L'approvazione ad oggi non è ancora pervenuta, per cui i lavori non sono mai stati avviati.
2016PREA0031	Fontanellato, Fidenza, Salsomaggiore	Installazione inverter nelle c.li di captazione	ACQUEDOTTO	150.000	150.000	0	150.000	100.417	0	100.417	-33%	Completamento lavori nel 2017
TOTALI				59.443.002	3.350.000	0	3.350.000	3.269.414	43.738	3.225.676		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 4 dell'11 maggio 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Emiliambiente S.p.A. Programma Operativo Interventi 2015-2019: approvazione consuntivo 2016.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 maggio 2018

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma
F.to Tiziana Benassi

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 25 giugno 2018
