



CLFE/2015/4 del 16 dicembre 2015.

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

IL COORDINATORE
F.to Andrea Marchi

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CLFE/2015/4

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 9.45 presso la Sala Rotonda (Sala della Giunta) del Comune di Ferrara – residenza municipale, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8756 del 10 dicembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Ferrara			no	10,0000
Argenta	Fiorentini Antonio	Sindaco	si	5,4468
Berra			no	1,5574
Bondeno	Bergamini Fabio	Sindaco	si	3,8388
Cento			no	8,3318
Codigoro	Ferretti Graziella	Assessore	si	3,2139
Comacchio	Fabbri Marco	Sindaco	si	5,5648
Copparo	Rossi Nicola	Sindaco	si	4,2744
Ferrara	Modonesi Aldo	Assessore	si	30,7476
Fiscaglia			no	2,5563
Formignana			no	1,0173
Goro	Viviani Diego	Sindaco	si	1,2675
Jolanda di Savoia			no	1,0631
Lagosanto			no	1,5097
Masi Torello	Ballarini Anna Maria	Assessore	si	0,9176
Mesola			no	2,0111
Mirabello			no	1,1777
Ostellato	Marchi Andrea	Sindaco	si	1,8537
Poggio Renatico	Garuti Daniele	Sindaco	si	2,5918
Portomaggiore	Minarelli Nicola	Sindaco	si	3,1672
Ro			no	1,1422
Sant'Agostino			no	1,9946
Tresigallo	Barbieri Dario	Sindaco	si	1,4202
Vigarano Mainarda	Giorgi Andrea	Vice-sindaco	si	2,0778
Voghiera	Cavicchi Chiara	Sindaco	si	1,2565

Presenti n. 14 pari a quote 67,6387

Assenti n. 11 pari a quote 32,3613

Riconosciuta la validità della seduta Marchi Andrea, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 2 del 26 marzo 2014 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i gestori CADF S.p.A. ed HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"*;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;

- B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;
- e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 2 del 26 marzo 2014 del Consiglio locale di Ferrara relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

Con voti:

favorevoli 14 pari a quote 67,6387

astenuti 0

contrari 0

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del dettaglio degli interventi del Piano d'ambito approvato con deliberazione n. 2 del 26 marzo 2014 del Consiglio locale di Ferrara relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
Ferrara Gestore: HERA s.p.a.**

5 novembre 2015

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n. 2 del 26 Marzo 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 agosto 2015 (prot. PG/2015/5672) come richiesto da ATERSIR in data 16 luglio 2015 (prot. PG/2015/4968).

		PIANIFICATO 2014		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014	
HERA	Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 7.015.100		€ 508.878	€ 7.523.978	Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
	Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B]	€ 863.600		-€ 197.379	€ 666.221	Importo Contributo a Consuntivo [B]
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 6.151.500		€ 706.257	€ 6.857.757	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]
	Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C]	€ 352.000		-€ 111.506	€ 240.494	Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014 Confronto

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un valore di circa 700.000 euro; nel caso specifico, a contribuire a questa differenza in termini di importo netto hanno contribuito sia un maggior impegno di spesa da parte del gestore ma anche un minore incasso di contributi.

Vi sono inoltre anche alcuni interventi (importo complessivo pari a 352.000 euro) il cui soggetto finanziatore non è il gestore HERA, il quale si incarica solo dell'esecuzione dell'opera, ma ACOSEA Impianti e tali interventi vengono considerati come un vero e proprio lavoro "conto terzi".

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

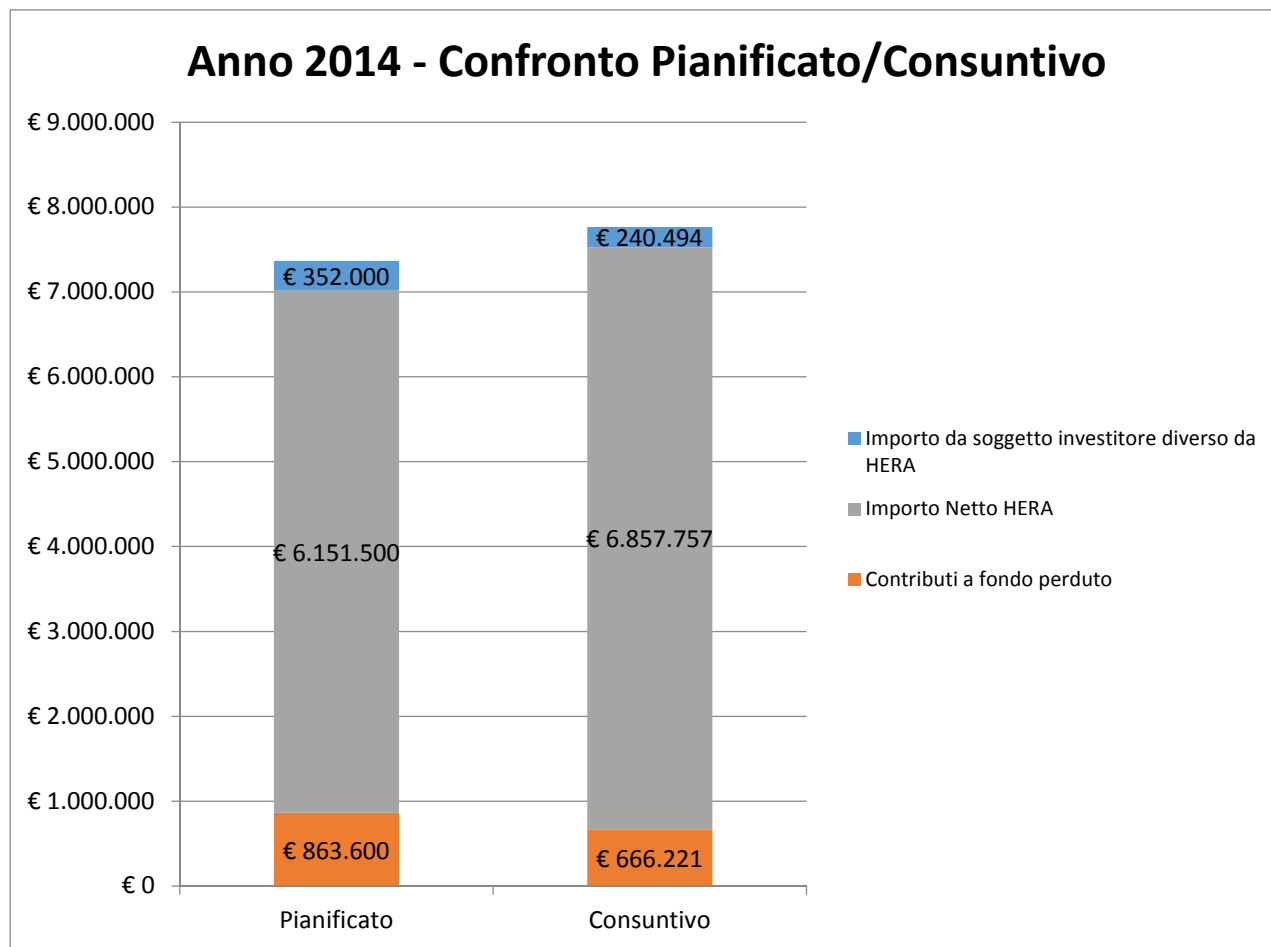


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014: 61

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 63

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	7	€ 0	€ 381.000	2	2014FEHA0038, 2014FEHA0052	
Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	4	€ 212.796	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	5	€ 171.115	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	35	€ 4.769.819	€ 4.324.100	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	19	€ 2.610.743	€ 2.662.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 7 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3); per 2 tra questi interventi le giustificazioni, che ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento dei progetti, non sono state ritenute esaustive e per tal motivo ATERSIR sta valutando quale provvedimento sanzionatorio assumere. In compenso però il gestore ha avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 4 interventi. Inoltre si può notare come rispetto ai 63 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 55% di questi (35 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per tali interventi le giustificazioni del gestore sono state ritenute esaustive e in questo caso non si intende assumere alcun provvedimento sanzionatorio.

Per i meccanismi del nuovo metodo tariffario la tariffa del 2016 sosterà circa 500.000 euro di investimenti effettuati in più (da suddividere tra ammortamenti, immobilizzazioni in corso e oneri finanziari).

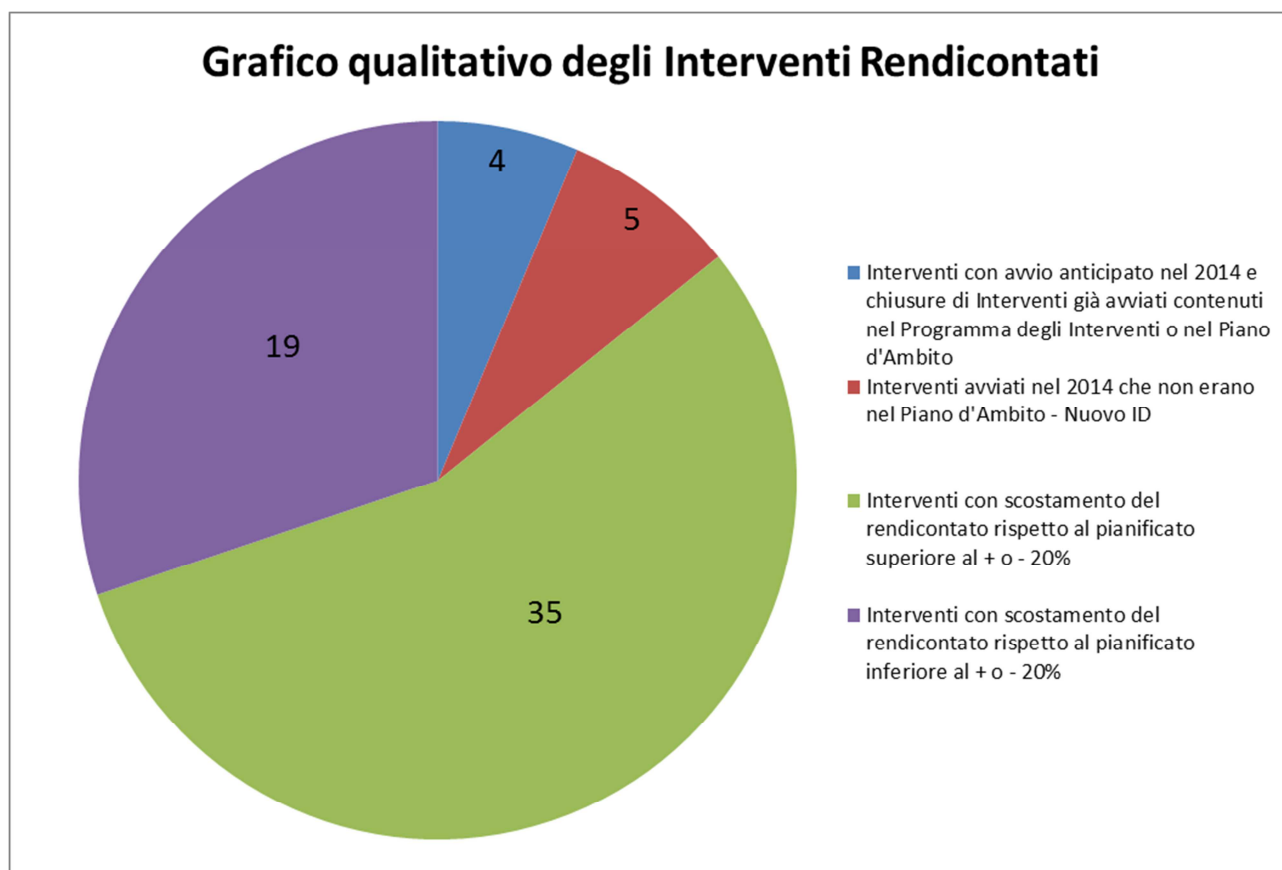


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014FEHA0025	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	ACQUEDOTTO	Ferrara	11.000
2014FEHA0004	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 2 (via Parata)	ACQUEDOTTO	Argenta	190.000
2014FEHA0036	POT. RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	ACQUEDOTTO	Ferrara	60.000
2014FEHA0070	MODELLAZIONE FOGNATURA FE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	10.000
2014FEHA0052	COLLEG. ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	10.000
2014FEHA0054	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	FOGNATURA	Ferrara	90.000
2014FEHA0038	ELIM DEP DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	10.000
				381.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO 1

HERA SpA - DIREZIONE ACQUA
Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 6 Ferrara

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0001	ACQUEDOTTO	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 3	Argenta	GESTORE HERA	290.000	50.000	0	50.000	13.672	0	13.672	-73%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU'). QUESTO ID ACCORPA LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA ANCHE DEL II STRALCIO IDENTIFICATO DA ID 2014FEHA0004 (VEDI NOTA ID 2014FEHA0004).
2014FEHA0002	ACQUEDOTTO	BONIFICA VIA ANIME A SAN NICOLÒ-ASSE3	Argenta	GESTORE HERA	115.000	0	-71.600	-71.600	0	-71.221	-71.221	1%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0003	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO IN VIA ROSSINI-ASSE3	Argenta	GESTORE HERA	81.000	0	-23.800	-23.800	0	-30.320	-30.320	-27%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0004	ACQUEDOTTO	RIFAC. TRATTO RETE ARGENTA-FILO-MENATE 2 (via Parata)	Argenta	GESTORE HERA	190.000	190.000	0	190.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO RICOMPRESO NEL I STRALCIO IDENTIFICATO DALL'ID 2014FEHA0001. L'INTERVENTO ERA STATO DELIBERATO IN DL 22/2014 DIVISO IN 2 STRALCI, MA AD OGGI LA REALIZZAZIONE E' PREVISTA MEDIANTE UN UNICO ID, PERTANTO LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA DI QUESTO ID VA ACCORPATA A QUELLA DELL'ID 2014FEHA0001.
2014FEHA0005	ACQUEDOTTO	POT. ACQ.FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1° STR	Argenta	GESTORE HERA	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0008	FOGNATURA	NUOVO ATTRAV FERROV FOG AD ARGENTA	Argenta	GESTORE HERA	565.000	0	-247.000	-247.000	0	-254.785	-254.785	-3%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0009	FOGNATURA	DISM.IMP.BOCCALONE-COLLETTAM.DEP.ARGENTA	Argenta	GESTORE HERA	350.000	10.000	0	10.000	3.410	0	3.410	-66%	RIPROGRAMMAZIONE DELLA FASE PROGETTUALE.
2014FEHA0010	FOGNATURA	DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA	Argenta	GESTORE HERA	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0011	FOGNATURA	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	Argenta	GESTORE HERA	490.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0006	DEPURAZIONE	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	Argenta	GESTORE HERA	440.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0007	DEPURAZIONE	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	Argenta	GESTORE HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0012	ACQUEDOTTO	REAL. 2 NUOVI POZZI CENTRALE STELLATA	Bondeno	GESTORE HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0014	FOGNATURA	SCARICHI NON DEP L.152-VIA MATTEOTTI	Bondeno	GESTORE HERA	184.000	10.000	0	10.000	3.159	0	3.159	-68%	RITARDI NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CAUSA NECESSITA' DI ULTERIORI INDAGINI NON PREVENTIVATE.
2014FEHA0013	DEPURAZIONE	COLLET SCARICHI V.PIRONI ALFIERI RENO	Bondeno	GESTORE HERA	175.000	0	-49.000	-49.000	0	-39.922	-39.922	19%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0017	FOGNATURA	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	Cento	GESTORE HERA	0	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0018	FOGNATURA	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	Cento	GESTORE HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0019	FOGNATURA	COLLETTAM. ALBERONE A DEP. BUONACOMPRA	Cento	GESTORE HERA	300.000	15.000	0	15.000	7.602	0	7.602	-49%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU').
2014FEHA0020	FOGNATURA	COLL. M. ALBERGATI-PILASTRELLO A BUONAC.	Cento	GESTORE HERA	495.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0021	FOGNATURA	COLLEG DI RENO C. A NUOVO DEP. CASUMARO	Cento	GESTORE HERA	160.000	10.000	0	10.000	15.379	0	15.379	54%	LA PIANIFICAZIONE E' STATA RESA COERENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO (ID 2014FEHA0016).
2014FEHA0022	FOGNATURA	COLL. FOG DI VIA ROSSINI AD ALBERONE	Cento	GESTORE HERA	70.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0023	FOGNATURA	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	Cento	GESTORE HERA	170.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0015	DEPURAZIONE	REAL. NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	Cento	GESTORE HERA	708.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0%	
2014FEHA0016	DEPURAZIONE	SISTEMA CASUMARO	Cento	GESTORE HERA	620.000	115.000	0	115.000	14.975	0	14.975	-87%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL COMUNE, AD ITER AUTORIZZATIVO AVVIATO, DI PRESENTARE AUA PRIMA DI AVERE TITOLO ABILITATIVO. SONO RISULTATI ANCHE MOLTO LUNGHII I TEMPI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CONCRETIZZARE LA VARIANTE URBANISTICA.
2014FEHA0024	ACQUEDOTTO	MANUT.GIUNTI BACINILAGUNAGGIO E DRENAGGI	Ferrara	GESTORE HERA	65.000	65.000	0	65.000	14.369	0	14.369	-78%	PARTI DEGLI INTERVENTI POSTICIPATI AL 2015 CAUSA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. CONSEGUENTEMENTE LA PIANIFICAZIONE E' STATA RIALLINEATA RISPETTO A QUANTO DELIBERATO IN DL 22/2014 IN RELAZIONE ANCHE ALLE ATTUALI ESIGENZE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BACINI.
2014FEHA0025	ACQUEDOTTO	RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA LAVEZZOLA	Ferrara	GESTORE HERA	458.000	11.000	0	11.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2013. L'IMPORTO DI PIANO 2014 ERA STATO APPOSTATO PRUDENZIALMENTE PER EVENTUALI OPERE ACCESSORIE RIVELATESI NON NECESSARIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL PIANO 2014 NON E' STATO PERTANTO UTILIZZATO.
2014FEHA0026	ACQUEDOTTO	IMPLEMENT. AUTOMAZIONE PONTELAGOSCURO	Ferrara	GESTORE HERA	281.000	100.000	0	100.000	83.100	0	83.100	-17%	
2014FEHA0027	ACQUEDOTTO	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	Ferrara	GESTORE HERA	322.000	80.000	0	80.000	19.049	0	19.049	-76%	FERMO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'INTERVENTO DI INTERRAMENTO DELLA SUBURBANA - IMPRESA AGGIUDICATARIA HA SCORPORATO RAMO D'AZIENDA CHE SEGUIVA IL LAVORO PER CUI LA STAZIONE APPALTANTE DEVE PROCEDERE A NUOVO AFFIDAMENTO. NE CONSEGUO IL NOSTRO STALLO NON IMPUTABILE AL GESTORE.
2014FEHA0028	ACQUEDOTTO	DEMOLIZIONE PENSILE S.MARTINO, FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	220.000	105.000	0	105.000	80.999	0	80.999	-23%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO A CAUSA DI VARIANTE MIGLIORATIVA CHE HA RICHIESTO INTERVENTI IMPIANTISTICI INIZIALMENTE NON PREVISTI E COMPORTATO UN RALLENTAMENTO DEI LAVORI.
2014FEHA0029	ACQUEDOTTO	REALIZ.NUOVI POZZI IN SOST.POZZI TOMBATI	Ferrara	GESTORE HERA	106.000	15.000	0	15.000	5.535	0	5.535	-63%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A SEGUITO DI RIDEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE E PER L'ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

ALLEGATO 1

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 6 Ferrara

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0030	ACQUEDOTTO	RINN.RETE IDRICA V. SALINGUERRA FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	51.000	50.000	0	50.000	58.624	0	58.624	17%	INTERVENTO TERMINATO.
2014FEHA0031	ACQUEDOTTO	RINN.RETE DN250-VIA VIAZZA BOARA FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	129.776	0	129.776	62%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER IMPREVISTI/VARIANTI IN FASE ESECUTIVA (SI E' RESO INDISPENSABILE ESTENDERE IL RINNOVO AI COLLEGAMENTI CON LE VIE LATERALI).
2014FEHA0032	ACQUEDOTTO	MAGLIATURA RETE AC - VLADINO-VFONDO RENO	Ferrara	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	53.700	0	53.700	7%	
2014FEHA0033	ACQUEDOTTO	RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	50.000	50.000	0	50.000	21	0	21	-99,96%	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPIANIFCATO NEL 2016 IN QUANTO NON PRIORITARIO RISPETTO AD ALTRE ESIGENZE DI RINNOVO RETE.
2014FEHA0034	ACQUEDOTTO	RINN.RETE DN400 E DN250 VVIVALDI FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	35.000	35.000	0	35.000	16.008	0	16.008	-54%	PROGETTAZIONE SVOLTA NEL 2014,ESECUZIONE POSTICIPATA AL 2015-2016 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE .
2014FEHA0035	ACQUEDOTTO	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	Ferrara	GESTORE HERA	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0036	ACQUEDOTTO	POT. RETE ACQ. VIA ERCOLE DE ROBERTI	Ferrara	GESTORE HERA	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AL 2015 CAUSA AUTORIZZAZIONI PRIVATI.
2014FEHA0041	FOGNATURA	COLLEG A DEP DI V. VESCOVO E FORNO	Ferrara	GESTORE HERA	285.000	4.000	-88.900	-84.900	0	-88.931	-88.931	-5%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2013. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0042	FOGNATURA	DISM DEP DI BOARA E COLLEG A FERRARA	Ferrara	GESTORE HERA	744.000	428.000	0	428.000	569.000	0	569.000	33%	MAGGIORI ONERI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA. NEL 2015 PREVISTO COMPLETAMENTO DELL'OPERA.
2014FEHA0043	FOGNATURA	COLLEG.BAURA A IMP.CONTRAPÒ-ADEG.E POT.	Ferrara	GESTORE HERA	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0044	FOGNATURA	COLLEG DI CORLO E MALBORG DI CORREGGIO	Ferrara	GESTORE HERA	725.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0045	FOGNATURA	COLLETTI DI VIA CERVELLA VIA CAVO DUCALE	Ferrara	GESTORE HERA	131.000	20.000	0	20.000	71.353	0	71.353	257%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA LEGATI A IMPREVISTI (DEMOLIZIONE SOTTOFONDO STRADALE E RINNOVO TUBAZIONE IDRICA IN CEMENTO-AMIANTO).
2014FEHA0046	FOGNATURA	SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA AEROPORTO	Ferrara	GESTORE HERA	624.000	350.000	0	350.000	378.870	0	378.870	8%	
2014FEHA0047	FOGNATURA	MANUT IMP DI SOLL IN VIA COMACCHIO (S6)	Ferrara	GESTORE HERA	200.000	200.000	0	200.000	106.245	0	106.245	-47%	INTERVENTO TERMINATO. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO. NEL 2015 PREVISTO IL COMPLETAMENTO.
2014FEHA0048	FOGNATURA	COLLEG A POGGIO E ELIM IMP DI MONTALBANO	Ferrara	GESTORE HERA	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0049	FOGNATURA	REVAMPING SOLLEVAMENTO VOLANO	Ferrara	GESTORE HERA	416.000	150.000	0	150.000	307.372	0	307.372	105%	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. ALLA LUCE DELLE REALI ESIGENZE DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E COMPLESSITA' DELL'INTERVENTO STESSO SI SONO RESE NECESSARIE OPERE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE INIZIALMENTE.
2014FEHA0050	FOGNATURA	ADEGUAMENTO SIST FOG IN VIA POLLINA	Ferrara	GESTORE HERA	30.000	30.000	0	30.000	5.893	0	5.893	-80%	INTERVENTO PROGETTATO NEL 2014 E PREVISTA REALIZZAZIONE NEL 2015, CAUSA RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'INIZIO DEI LAVORI.
2014FEHA0051	FOGNATURA	SUBURBANA-POTENZ RETE FOGN VIA AEROPORTO	Ferrara	GESTORE HERA	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0052	FOGNATURA	COLLEG. ZONA STAZIONE-CONA	Ferrara	GESTORE HERA	180.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI PER EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.
2014FEHA0053	FOGNATURA	RINN. VIA VOLANO	Ferrara	GESTORE HERA	25.000	25.000	0	25.000	50.463	0	50.463	102%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA LEGATI A IMPREVISTI, IN PARTICOLARE PRESCRIZIONI SULLA GESTIONE DELLA VIABILITA'.
2014FEHA0054	FOGNATURA	POT. RETE FOGN. VIA ERCOLE DE ROBERTI	Ferrara	GESTORE HERA	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO INIZIALMENTE RICHIESTO DAL COMUNE DI FERRARA PER L'ANNUALITÀ 2014 E POI POSTICIPATO DAL COMUNE STESSO AL 2015.
2014FEHA0037	DEPURAZIONE	ADEG E POTENZ DEP DI GAIBANELLA	Ferrara	GESTORE HERA	909.000	93.000	-190.500	-97.500	92.978	0	92.978	-0,02%	INTERVENTO TERMINATO.
2014FEHA0038	DEPURAZIONE	ELIM DEP DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	Ferrara	GESTORE HERA	261.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI PER EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.
2014FEHA0039	DEPURAZIONE	MANUT A DUE SEDIM SECONDARI DI GRAMICIA	Ferrara	GESTORE HERA	150.000	100.000	0	100.000	65.896	0	65.896	-34%	INTERVENTO TERMINATO. ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014FEHA0040	DEPURAZIONE	REVAMPING DIGEST ANAEROB DEP GRAMICIA	Ferrara	GESTORE HERA	2.903.000	15.000	0	15.000	11.239	0	11.239	-25%	LIEVI MINORI ONERI DI PROGETTAZIONE.
2014FEHA0055	FOGNATURA	REALIZZAZIONE DI UNA CANALE SCOLMATORE	Ferrara	ACOSEA IMPIANTI	0	352.000		0	128.032	0	128.032	-64%	RALLENTAMENTO DOVUTI A PROBLEMATICHE CON IMPRESA ESECUTRICE.
2014FEHA0088	FOGNATURA	POTENZIAMENTO IMP SOLLEVAMENTO S10 V.FABBRI-V.EVA E ADAMO	Ferrara	ACOSEA IMPIANTI		0	0	0	42.743		42.743		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 6 ante 2014. Lavoro finanziato da ACOSEA e regolamentato dalla convenzione in essere.
2014FEHA0083	FOGNATURA	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE FOGNARIA	Ferrara	GESTORE HERA		0	0	0	12.652	0	12.652		CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: Intervento vincolato alla realizzazione della Suburbana. Intervento iniziato nel 2013 e connesso all'omologo intervento sulla rete idrica ID 2014FEHA0027
2014FEHA0085	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE POZZO 21 CON NUOVO POZZO 21A	Ferrara	GESTORE HERA		0	0	0	92.831	0	92.831		CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: Intervento reso necessario causa ammaloramento del pozzo 21

ALLEGATO 1

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 6 Ferrara

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0056	ACQUEDOTTO	RINN.COND. AC - VADRIATICO MASI TORELLO	Masi Torello	GESTORE HERA	80.000	80.000	0	80.000	53.001	0	53.001	-34%	MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA. STRALCIATO DA QUESTO ID L'ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO PER PROBLEMI LEGATI ALLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. LA PARTE DI ADEGUAMENTO VERRA' RENDICONTATO CON L'ID 2014FEHA0062.
2014FEHA0057	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	1.300.000	0	1.300.000	1.261.966	0	1.261.966	-3%	
2014FEHA0058	ACQUEDOTTO	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	435.000	0	435.000	669.603	0	669.603	54%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0059	ACQUEDOTTO	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	270.000	0	270.000	278.439	0	278.439	3%	
2014FEHA0060	ACQUEDOTTO	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	80.000	0	80.000	58.849	0	58.849	-26%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECONOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014FEHA0061	ACQUEDOTTO	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	265.000	0	265.000	614.621	0	614.621	132%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0067	FOGNATURA	MANUT.STRA.RETI/ALL. FOGNATURA - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	463.000	0	463.000	812.137	0	812.137	75%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0068	FOGNATURA	MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	200.000	0	200.000	185.262	0	185.262	-7%	
2014FEHA0069	FOGNATURA	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	30.000	0	30.000	27.224	0	27.224	-9%	
2014FEHA0065	DEPURAZIONE	MANUT. STRA. IMP. DEPURAZIONE - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	532.000	0	532.000	646.795	0	646.795	22%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014FEHA0066	DEPURAZIONE	ADEG. SICUREZZA IMP. DEPURAZIONE - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	100.000	0	100.000	82.458	0	82.458	-18%	
2014FEHA0062	ACQUEDOTTO	ADEG. ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	167.000	70.000	0	70.000	34.404	0	34.404	-51%	PARTE DELL'INTERVENTO SVOLTA NEL 2014,PARTE RESTANTE POSTICIPATA AL 2015-2016 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE (RITARDO AUTORIZZATIVO FER - FS).
2014FEHA0063	ACQUEDOTTO	VERIFICHE SISMICHE IMP. ACQUEDOTTO FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2.216.000	0	0	0	83.212	0	83.212		ANTICIPATI INTERVENTI DI VERIFICA SISMICA SU IMPIANTI ACQUEDOTTO AL FINE DI AVVIARE LE OPERE DI ADEGUAMENTO NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE.
2014FEHA0064	ACQUEDOTTO	DISTRETT. RETI ACQUA - FE - ATO 6	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	392.000	50.000	0	50.000	44.222	0	44.222	-12%	
2014FEHA0070	FOGNATURA	MODELLAZIONE FOGNATURA FE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	254.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO IN SEGUITO ALLA RIDEFINIZIONE DELLA PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI PER EVIDENZE GESTIONALI EMERSE NEL CORSO DELL'ANNO.
2014FEHA0071	FOGNATURA	RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	80.000	0	0	0	17.121	0	17.121		ANTICIPATI RILIEVI PREVISTI NEL 2015 PER NECESSITA' OPERATIVE LEGATE AL PERFEZIONAMENTO DELLA CONSISTENZA RETI, SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STESSE.
2014FEHA0082	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - ATO 6	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	0	58.231	0	58.231		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogeneizzazione Conti Cumulativi. Gli interventi di bonifica dei contatori sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria reti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014FEHA0086	FOGNATURA	RINNOVO RETI/ALL.FOGNATURA DA PI - ATO 6	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	0	0	0	0		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogeneizzazione Conti Cumulativi.
2014FEHA0087	ACQUEDOTTO	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQUEDOTTO - ATO 6	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	0	0	0	0	2.142	0	2.142		CASO C - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: il nuovo ID è stato creato nell'ottica di omogeneizzazione Conti Cumulativi. Tali interventi sono stati scorporati dal conto cumulativo di Programma "manutenzione straordinaria impianti acquedotto" nel quale erano precedentemente contenuti.
2014FEHA0072	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO IN VIA PONTE ROSSO-ASSE3	Poggio Renatico	GESTORE HERA	128.000	0	-78.000	-78.000	0	-77.320	-77.320	1%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0073	FOGNATURA	COLLEG SCARICHI NON DEP DI QUARTIERE	Portomaggiore	GESTORE HERA	500.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0074	FOGNATURA	SCARICHI NON DEP DI RUNCO E COLL A GAMBU	Portomaggiore	GESTORE HERA	266.000	0	0	0	0	0	0		
2014FEHA0075	ACQUEDOTTO	RIN.RETE IDRICA V.MATTEOTTI-S.AGOSTINO	Sant'Agostino	GESTORE HERA	51.000	50.000	0	50.000	48.900	0	48.900	-2%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014.
2014FEHA0076	FOGNATURA	COLLEG VIA MONTECASSINO E LIM A DOSSO	Sant'Agostino	GESTORE HERA	369.000	110.000	0	110.000	16.887	0	16.887	-85%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO A CAUSA DI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI.
2014FEHA0089	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO RETE IDRICA S.AGOSTINO	Sant'Agostino	ACOSEA IMPIANTI	0	0	0	0	69.719	0	69.719		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 6 ante 2014. Lavoro finanziato da ACOSEA e regolamentato dalla convenzione in essere.
2014FEHA0084	FOGNATURA	MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN CARLO	Sant'Agostino	GESTORE HERA	0	0	0	0	5.260	0	5.260		CASO A - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI: Propedeutico alla programmazione degli interventi sulle reti fognarie.
2014FEHA0077	ACQUEDOTTO	ESTENSIONE IN VIA MANTOVA-ASSE3	Vigarano Mainarda	GESTORE HERA	77.000	21.000	-29.000	-8.000	1.520	-25.222	-23.702	-93%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0078	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO RETE VIA RONDONA-ASSE3	Vigarano Mainarda	GESTORE HERA	121.000	0	-63.000	-63.000	0	-57.281	-57.281	9%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.

ALLEGATO 1

Consuntivo investimenti annualità 2014 Bacino Ex-ATO 6 Ferrara

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	Servizio (Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Generale)	Titolo intervento (descrizione sintetica)	Comune	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014FEHA0079	ACQUEDOTTO	POTENZIAMENTO A VIGARANO PIEVE-ASSE3	Vigarano Mainarda	GESTORE HERA	54.000	8.100	-22.800	-14.700	0	-21.219	-21.219	-44%	INTERVENTO TERMINATO. INCASSATO CONTRIBUTO PREVISTO.
2014FEHA0080	FOGNATURA	COLLET VIGARANO PIEVE-DEP. FE I STRALCIO	Vigarano Mainarda	GESTORE HERA	396.000	290.000	0	290.000	188.436	0	188.436	-35%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015.
2014FEHA0081	FOGNATURA	COLLET VIGARANO PIEVE-DEP.FE II STRALCIO	Vigarano Mainarda	GESTORE HERA	400.000	10.000	0	10.000	34.117	0	34.117	241%	MAGGIORI ONERI IN FASE DI PROGETTAZIONE.

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR

7.367.100 -863.600 6.151.500 7.764.472 -666.221 7.098.251

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara

F.to Andrea Marchi

Il segretario verbalizzante

F.to Elisa Di Francesca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 04 gennaio 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna
