

CLPR/2017/6 del 17 ottobre 2017.

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.

LA COORDINATRICE
F.to Tania Tellini

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

CLRE/2017/6

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,00 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettere PG/AT/2017/6242 dell'11/10/2017 e PG/AT/2017/6393 del 13/10/2017.

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA			NO	1,58
BAGNOLO IN PIANO			NO	1,65
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,78
BIBBIANO	Bellelli Loretta	Assessore	SI'	1,58
BORETTO			NO	1,03
BRESCELLO			NO	1,06
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,60
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,07
CAMPEGINE			NO	1,01
CANOSSA	Marco Grassi	Consigliere	SI	0,80
CARPINETI			NO	0,93
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	2,74
CASINA			NO	0,98
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI'	2,30
CASTELNOVO MONTI			NO	1,59
CASTELNOVO SOTTO	Bottazzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,99
CAVRIAGO	Burani Paolo	Sindaco	SI'	1,80
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI'	3,88

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
FABBRICO	Terzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,18
GATTATICO			NO	1,16
GUALTIERI			NO	1,31
GUASTALLA			NO	2,68
LUZZARA			NO	1,72
MONTECCHIO EMILIA			NO	1,76
NOVELLARA			NO	2,33
POVIGLIO	Manghi Giammaria	Sindaco	SI'	1,36
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,20
REGGIO EMILIA	Tutino Mirko	Assessore	SI'	25,52
REGGIOLO			NO	1,73
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,14
ROLO	Allegretti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,85
RUBIERA			NO	2,24
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,36
S. POLO D'ENZA	Fontanili Marco	Assessore	SI'	1,13
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,93
SCANDIANO			NO	4,28
TOANO			NO	0,96
VENTASSO			NO	1,66
VETTO			NO	0,55
VEZZANO SUL CROSTOLO	Bigi Mauro	Sindaco	SI'	0,88
VIANO	Borghi Nello	Assessore	SI'	0,74
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,94
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Manghi Giammaria	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 23

quote 68,37

Assenti n. 20

quote 31,63

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 del Consiglio locale di Reggio Emilia è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore Iren S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 54 del 7 ottobre 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Reggio Emilia di competenza del gestore Iren S.p.A., dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n.12 del 27 febbraio 2017 inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore Iren S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n.4 del 01 aprile 2014 del Consiglio Locale di Reggio Emilia;
- sono stati anticipati quattro interventi previsti in annualità successive per un'importo complessivo di €46.911,72;
- non sono stati avviati n.24 interventi per un'importo complessivo di €2.493.876,00;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati risultano essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2016;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto:

- di apporvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore Iren S.p.A. per il bacino tariffario di Reggio Emilia come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Reggio Emilia Gestore: IREN s.p.a.**

1 settembre 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 del 01 aprile 2016, che il gestore IREN ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 23.343.203	- € 4.363.296	€ 18.979.907	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 1.090.067	- € 735.270	€ 354.797	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 22.253.136	- € 3.628.026	€ 18.625.110	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI abbia effettuato investimenti che si discostano dalla pianificazione approvata e precisamente: rispetto agli investimenti lordi la differenza ammonta a - € 4.363.296, mentre facendo il confronto con gli investimenti netti è di - € 3.628.026 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 735.270.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

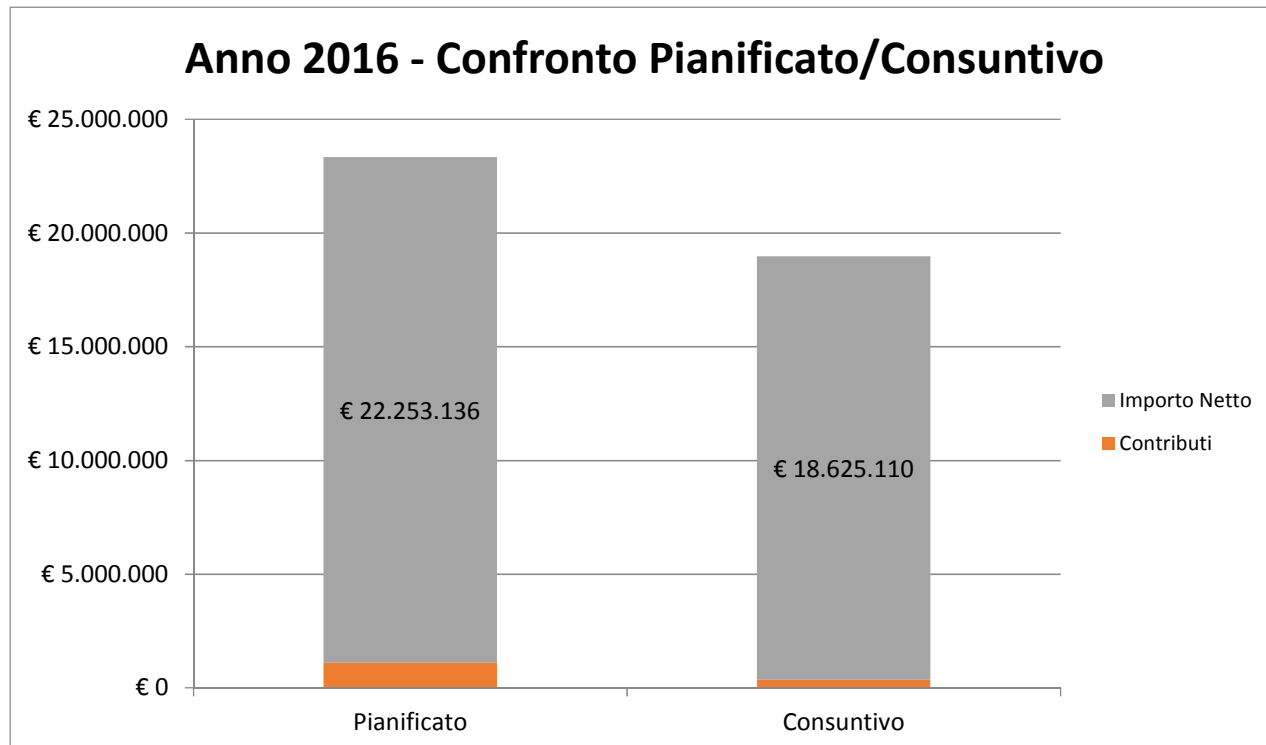


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2016: 88

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 82

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	24	€ 0	2.493.876	NO	2014REIA0010 2014REIA0025 2014REIA0032 2014REIA0039 2014REIA0040 2014REIA0041 2014REIA0042 2014REIA0061 2014REIA0066 2014REIA0071 2014REIA0079 2016REIA0105 2016REIA0108 2016REIA0110 2016REIA0114 2016REIA0120 2016REIA0122 2016REIA0125 2016REIA0127 2016REIA0128 2016REIA0132 2016REIA0133 2016REIA0138 2016REIA0144	
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	18	€ 833.286	€0	NO	2014REIA0017 2014REIA0018 2014REIA0024 2014REIA0026 2014REIA0035 2014REIA0058 2014REIA0059 2014REIA0060 2014REIA0062 2014REIA0085 2015REIA0097 2015REIA0098 2015REIA0100 2015REIA0102 2015REIA0103 2016REIA0107 2016REIA0121 2016REIA0145	
Interventi avviati nel	0	0	€ 0			

2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID						
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	53	€.10.939.882	€ 14.067.729	NO	2014REIA0001 2014REIA0002 2014REIA0003 2014REIA0004 2014REIA0006 2014REIA0007 2014REIA0008 2014REIA0009 2014REIA0012 2014REIA0013 2014REIA0015 2014REIA0020 2014REIA0023 2014REIA0028 2014REIA0031 2014REIA0033 2014REIA0044 2014REIA0046 2014REIA0047 2014REIA0049 2014REIA0050 2014REIA0051 2014REIA0053 2014REIA0054 2014REIA0055 2014REIA0056 2014REIA0057 2014REIA0063 2014REIA0068 2014REIA0074 2014REIA0076 2014REIA0078 2014REIA0081 2014REIA0082 2014REIA0083 2014REIA0086 2014REIA0087 2014REIA0088 2014REIA0090 2014REIA0091 2014REIA0095 2015REIA0099 2016REIA0057 2016REIA0070 2016REIA0119 2016REIA0123 2016REIA0129 2016REIA0131 2016REIA0134 2016REIA0140 2016REIA0141 2014REIA0077 2016REIA0058	

Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	11	€7.206.738	€6.781.598	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA	2014REIA0021 2014REIA0027 2014REIA0030 2014REIA0037 2014REIA0038 2014REIA0043 2014REIA0045 2014REIA0070 2014REIA0094 2016REIA0143 2014REIA0069	
--	----	------------	------------	-------------------------------	--	--

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che il gestore, non ha avviato, nel 2016, 24 interventi che erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella "Allegato 1"), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva.

Ha avviato anticipatamente/chiuso rispetto a quanto programmato 18 interventi mentre 53 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per il quale la giustificazione è risultata esaustiva. Per 11 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.

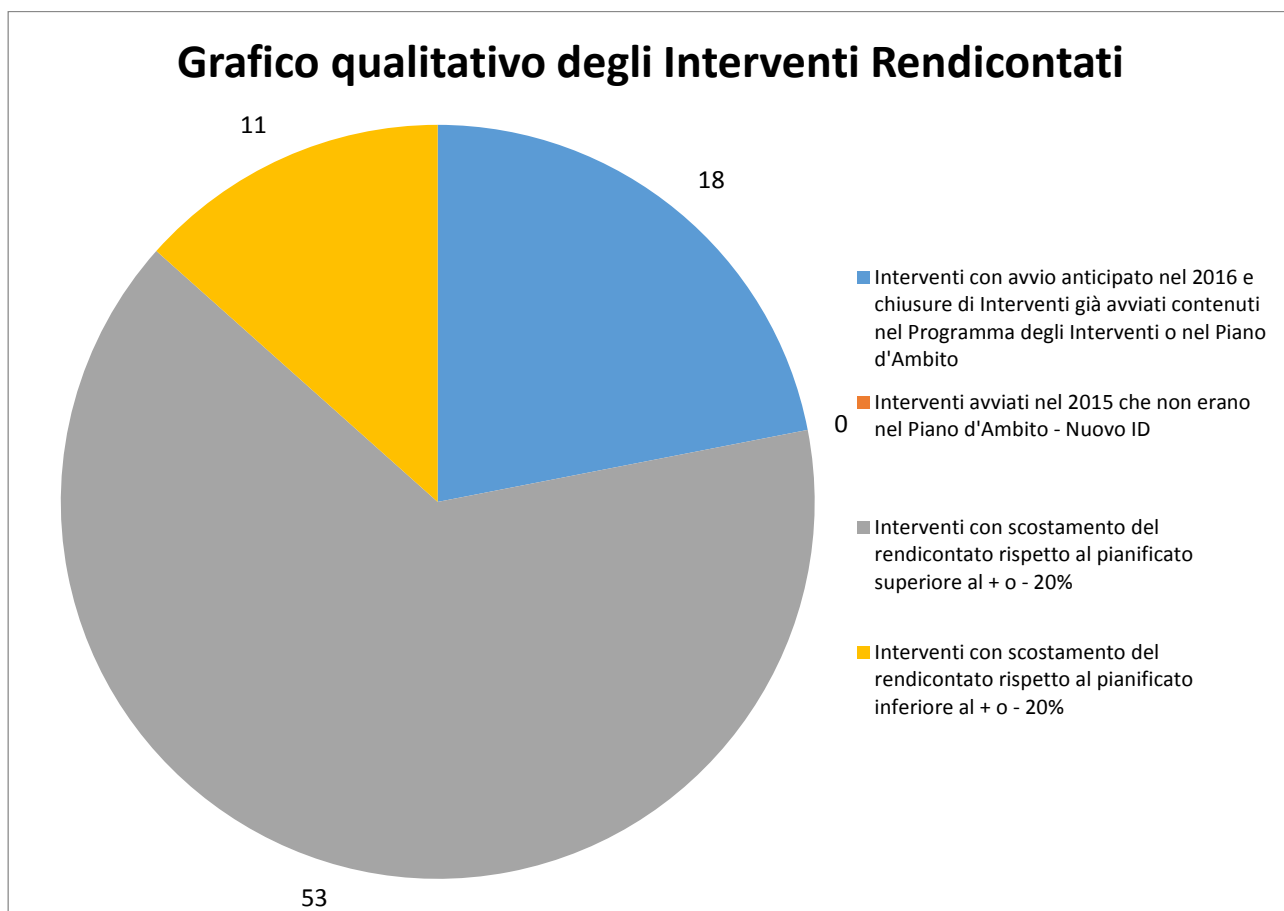


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

Comune	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2016
San Martino in Rio	2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	170.000,00	70.000,00
Campegine	2014REIA0010	5.8.Uspf.113 - Risanamento fognature capoluogo 1° stralcio	95.000,00	95.000,00
Villa Minozzo	2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	30.000,00	30.000,00
Rio Saliceto	2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	258.000,00	58.000,00
Guastalla	2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitrigenitri	300.000,00	50.000,00
Guastalla	2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	485.566,00	485.566,00
Castelnovo Monti	2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	700.000,00	50.000,00
Scandiano	2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	180.000,00	180.000,00
Correggio	2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	500.000,00	250.000,00
Reggio Emilia	2014REIA0061	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento digestori	220.000,00	50.000,00
Gualtieri	2014REIA0040	5.8.Uspf.80 - Risanamento fognatura scuole	50.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	100.000,00	100.000,00
Reggio Emilia	2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	500.000,00	200.000,00
Casalgrande	2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	500.000,00	50.000,00
Castelnovo Monti	2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	165.000,00	165.000,00
Bagnolo in Piano	2016REIA0105	Estendimento rete fognaria in loc. Pieve Rossa, strada Provinciale Nord	130.166,00	130.166,00
Viano	2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	900.000,00	50.000,00
Montecchio	2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	150.000,00	50.000,00
Castelnovo di Sotto	2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	150.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	100.000,00	20.000,00
Boretto	2016REIA0108	Razionalizzazione sistema fognario in Via Marchesi	120.144,00	120.144,00
Gualtieri	2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	140.000,00	40.000,00
Cadelbosco di Sopra	2016REIA0110	Razionalizzazione sistema fognario in Via Zurco, Via Gabella, Via Torquato Tasso	100.000,00	100.000,00
Reggio Emilia	2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	300.000,00	50.000,00

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (percentuale di scostamento pari a -100%)

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0015	Sistemazione scarico Rio Fontanello	FOGNATURA	Carpineti;	30.000	30.000		30.000	39.169		39.169	30%	Intervento concluso. Sforamento dovuto alla necessità, emersa in corso d'opera, di realizzare un tratto aggiuntivo di collettore
2014REIA0016	5.8.Uspf.130 - Realizzazione collegamento rete fognaria località S.Biagio al depuratore di Cà perizzi2° stralcio	FOGNATURA	Carpineti;	95.000							0%	
2014REIA0017	5.10.D15.40 - Adeguamento impianto: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Casalgrande;	250.000				2.944		2.944	100%	Intervento realizzato in annualità precedenti. Mancano alcune opere di completamento (sistemazione area esterna, verde..)
2014REIA0018	5.8.Uspf.94 - Ristrutturazione rete fognaria capoluogo 3° stralcio	FOGNATURA	Casalgrande;	278.527	0		0	4.620		4.620	100%	Intervento pianificato in annualità successive. Anticipate alcune attività di progettazione per consentire a Comune di pianificare interventi di propria competenza
2014REIA0019	Realizzazione di terzo pozzo S.Donnino	ACQUEDOTTO	Casalgrande;	200.000							0%	
2014REIA0020	Realizzazione estendimento rete fognaria in località Rovetto	FOGNATURA	Casina;	125.000	125.000		125.000	14.076		14.076	-88%	Cantiere in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione. Verrà ultimato nella primavera 2017
2014REIA0021	5.3.36 - M.RE Barazzone 6 km DN 300 (gabellina)	ACQUEDOTTO	Casina;	1.020.000	141.782		141.782	146.929		146.929	3%	
2014REIA0022	5.3.28 - Raddoppio adduttrice 4 km DN 500	ACQUEDOTTO	Castellarano;	398.000							0%	
2014REIA0023	5.8.Uspf.116 - Realizzazione di Nuova fossa imhoff Montebabbio (100AE)	DEPURAZIONE	Castellarano;	150.000	100.000		100.000	13.851		13.851	-86%	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di acquisizione dell'area da privati
2014REIA0024	5.8.Uspf.78 - Collegamento fognario località Farneto a rete depurata	FOGNATURA	Castellarano;	125.000				24.154		24.154	100%	Intervento concluso nella primavera 2016, in ritardo rispetto alla pianificazione 2015 con un importo finale di ~ 158.835 rispetto a ~ 125.000 di progetto
2014REIA0025	5.10.D15.23 - Adeguamento impianto di depurazione Rio Dorgola (2° linea acqua trattamento nutrienti ed adeguamento linea fanghi 1° stralcio)	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti;	700.000	50.000		50.000				-100%	In corso verifiche del processo depurativo per individuare gli interventi di upgrading necessari
2014REIA0026	5.10.D15.5 - Potenziamento Costa de Grassi: 2° linea	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti;	250.000				14.628		14.628	100%	Anticipate spese di progettazione per intervento pianificato nell'annualità 2017
2014REIA0027	5.10.D15.13 - Potenziamento Impianto Ca' Perizzi - Posa biodischi linea 4	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti;	200.000	198.384		198.384	184.726		184.726	-6%	
2014REIA0028	5.10.D15.17 - Castelnovo ne' Monti - Rio Spirola secondario - Realizzazione nitrifiltr.+sist.esistente	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti;	300.000	295.514		295.514	12.331		12.331	-95%	Progettazione esecutiva ultimata. In attesa di autorizzazione sismica si prevede di iniziare i lavori nella primavera 2017
2014REIA0029	5.10.D15.35 - Rio Maillo sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Castelnovo Monti;								0%	
2014REIA0030	5.10.D15.7 5.10.D15.14 - Meletole: Impianto di depurazione 1° e 2° Linea	DEPURAZIONE	Castelnovo di Sotto;	3.110.000	1.200.000		1.200.000	1.268.375		1.268.375	5%	
2014REIA0031	5.8.Uspf.96 - Estendimento fognario in Via Alberici, Meletole	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto;	154.710	154.625		154.625	4.713		4.713	-96%	In attesa di concordare con l'Amministrazione Comunale la soluzione progettuale da adottare rispetto alle diverse ipotesi presentate

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0032	5.8.Uspf.117 - Estendimento fognario Via Peschiera	FOGNATURA	Castelnovo di Sotto;	150.000	50.000		50.000				-100%	In corso verifiche in campo per la definizione/fattibilità dell'intervento a gravità
2014REIA0033	capoluogo con interventi vari via Rivasì, via Marzabotto, via 1° Maggio, via Arduini, via Costituzione, via Spaggiari, via Grandi, Sottopasso Pianella, Via Girondola, via Guerra	FOGNATURA	Cavriago;	250.357	160.000		160.000	2.857		2.857	-98%	Progettazione esecutiva completata. Si prevede la realizzazione nella primavera 2017
2014REIA0034	5.10.D15.24 - Cerreto Alpi: 400 AE biodischi	DEPURAZIONE	Collagna;	535.000							0%	
2014REIA0035	PROGR 2009 tab. 2 - Canolo potenziamento impianto depurazione	DEPURAZIONE	Correggio;	626.000				13.362		13.362	100%	Intervento realizzato in annualità precedenti. Realizzate alcune opere di completamento (sistemazione area esterna)
2014REIA0036	5.8.Uspf.96 - Interventi pregressi Dinazzano Lemizzone 1° lotto	FOGNATURA	Correggio;	200.000	0		0				0%	
2014REIA0037	5.8.Uspf.118 - Risanamento reticolo fognario in via Pozzi e limitrofe	FOGNATURA	Fabbrico;	263.258	162.335		162.335	161.198		161.198	0%	
2014REIA0038	5.10.D15.42 - Potenziamento Impianto di depurazione Praticello: nuovo ispessitore	DEPURAZIONE	Gattatico;	130.707	126.543		126.543	135.391		135.391	6%	
2014REIA0039	5.8.Uspf.98 - Potenziamento rete fognaria capoluogo. 1° stralcio	FOGNATURA	Gualtieri;	140.000	40.000		40.000				-100%	In corso studio idraulico in accordo con il Comune di Gualtieri per l'individuazione delle priorità di intervento
2014REIA0040	5.8.Uspf.80 - Risanamento fognatura scuole	FOGNATURA	Gualtieri;	50.000	50.000		50.000				-100%	In corso studio idraulico in accordo con il Comune di Gualtieri per l'individuazione delle priorità di intervento
2014REIA0041	5.10.D15.19 - Impianto di depurazione Guastalla Nord: nitri-denitri	DEPURAZIONE	Guastalla;	300.000	50.000		50.000				-100%	Progettazione esecutiva completata. Si prevede la realizzazione nella primavera 2017
2014REIA0042	5.7.D11.3 - Madonna del Ficchetto: risoluzione criticità di deflusso	FOGNATURA	Guastalla;	485.566	485.566		485.566				-100%	In ritardo rispetto alla pianificazione in quanto la progettazione esecutiva delle opere è in capo al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po e l'appalto al Comune di Guastalla
2014REIA0043	5.8.Uspf.99 - Collegamento fognario loc. San Giacomo alla rete depurata	FOGNATURA	Guastalla;	165.000	163.360		163.360	177.515		177.515	8%	
2014REIA0044	5.8.Uspf.134 - Sistemazione fognature Giarola Campo	FOGNATURA	Ligonchio;	137.820	32.246		32.246	23.822		23.822	-26%	Intervento concluso con minore spesa
2014REIA0045	5.3.7 - Nuovo serbatoio Luzzara mc 2000	ACQUEDOTTO	Luzzara;	1.400.000	1.086.769		1.086.769	871.006		871.006	-19%	
2014REIA0046	5.5.D04.8 5.8.Uspf.120 - Casoni: collettamento a rete depurata	FOGNATURA	Luzzara;	536.678	513.914		513.914	258.750		258.750	-49%	Cantiere in corso, in lieve ritardo rispetto alla pianificazione. Si prevede la conclusione dei lavori entro la primavera 2017
2014REIA0047	Realizzazione di 6° pozzo centrale idrica	ACQUEDOTTO	Luzzara;	180.000	19.011		19.011	27.551		27.551	44%	Intervento concluso, in lieve ritardo rispetto alla pianificazione. Scostamento rispetto alla singola annualità ma non sul totale dell'intervento
2014REIA0049	5.3.8 - Completamento centrale idrica	ACQUEDOTTO	Novellara;	300.000	30.000		30.000	906		906	-96%	Cantiere in corso, manca completamento dell'impiantistica elettrica

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0065	5.10.D15.10 - Rio Saliceto: potenziamento impianto 6000 adeguamenti diversi - sedimentatore secondario	DEPURAZIONE	Rio Saliceto;	150.000							0%	
2014REIA0066	5.8.Uspf.85 - Potenziamento scaricatore di piena fognature del capoluogo.	FOGNATURA	Rio Saliceto;	258.000	58.000		58.000				-100%	Da definire con l'amministrazione Comunale e il Consorzio di Bonifica le modalità di intervento
2014REIA0067	5.7.D11.10 - Potenziamento drenaggio urbano II° lotto	FOGNATURA	Rolo;	602.000							0%	
2014REIA0068	5.7.D11.2 - Potenziamento drenaggio urbano III° lotto	FOGNATURA	Rolo;	1.300.000	600.746		600.746	1.109.339		1.109.339	84%	Intervento realizzato in anticipo rispetto al pianificato. In corso collaudo
2014REIA0069	5.8.Uspf.124 - Estendimento rete fognaria in Via Bedollo	FOGNATURA	Rolo;	130.000		49.036	-49.036	30.176	45.000	-14.824	8%	Intervento concluso
2014REIA0070	5.8.Uspf.86 5.8.Uspf.138 - Estendimento fognature in via delle Valli, via Togliatti e Completamento lavori TAV	FOGNATURA	Rubiera;	235.000	172.426		172.426	161.789		161.789	-6%	
2014REIA0071	5.8.Uspf.125a - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 1° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio;	170.000	70.000		70.000				-100%	In corso verifiche preliminari con l'Amministrazione comunale per definire le modalità d'intervento
2014REIA0072	5.8.Uspf.125b - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 2° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio;	130.000	0		0				0%	
2014REIA0073	5.8.Uspf.139 - Realizzazione rete fognaria Zona sportiva 3° stralcio	FOGNATURA	San Martino in Rio;	182.740	0		0				0%	
2014REIA0074	5.8.Uspf.87 - Costruzione nuovo scolamatore scuole su collettore Ciano Roncocesi e potenziamento fognatura via Riolo.	FOGNATURA	San Polo d'Enza;	140.000	24.101		24.101	8.113		8.113	-66	Intervento concluso con risparmio
2014REIA0075	5.8.Uspf.141 - Collettore fognario in loc. Rampa d'Enza	FOGNATURA	Sant'Ilario d'Enza;	150.000							0%	
2014REIA0076	5.8.Uspf.105 - Estendimento fognario in loc. Chiozza	FOGNATURA	Scandiano;	320.000	300.693	160.000	140.693	2.650		2.650	-99%	Progettazione esecutiva completata. In attesa autorizzazioni. Inizio lavori previsti nel 2017
2014REIA0077	Uspf - pregressi 5.8.Uspf.9 - Sistemazione fognature Arceto 2° e 3° lotto	FOGNATURA	Scandiano;	380.000	0	78.750	-78.750	6.336		6.336	108%	Opere di completamento di intervento realizzato in annualità precedenti
2014REIA0078	5.8.Uspf.107 5.8.Uspf.127 - Risanamento fognature in loc. Sedrio	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo;	108.248	81.988		81.988	108.298		108.298	32%	Intervento concluso. Sforamento sulla singola annualità ma non sull'importo totale
2014REIA0079	5.10.D15.29 - Potenziamento impianto 5000 AE N+D+sedimentatore II + ispessimento	DEPURAZIONE	Viano;	900.000	50.000		50.000				-100%	In corso verifiche gestionali per definire le priorità di intervento
2014REIA0080	5.10.D15.9 - Potenziamento impianto San Giovanni di Querciola	DEPURAZIONE	Viano;	243.000							0%	
2014REIA0081	5.8.Uspf.108 - Realizzazione collettore fognario in loc. Predale	FOGNATURA	Viano;	181.829	162.250		162.250	15.409		15.409	-90%	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di acquisizione dell'area da privati

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REIA0082	Costruzione di depuratore al servizio della frazione di Gazzano	DEPURAZIONE	Villaminozzo;	370.000	364.071		364.071	18.644		18.644	-94	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione di un percorso stabile in zona di frana. In corso di ottenimento servitù di passaggio in terreni privati
2014REIA0083	Costruzione reti di collettamento e depuratore al servizio della frazione di Carniana	FOGNATURA	Villaminozzo;	700.000	37.172		37.172	9.543		9.543	-74	Progettazione in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione per difficoltà di individuazione di un percorso stabile in zona di frana.
2014REIA0084	5.4.16 - Nuovi impianti di depurazione/potenziamento impianti esistenti	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali;	500.000	0		0				0%	
2014REIA0085	5.4.7 - Adeguamento depuratori al D.gls 152/06 e delibere regionali - Trattamenti appropriati	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali;	1.000.000	0		0	3.238		3.238	100%	Errore di imputazione ore di personale.
2014REIA0086	5.4.8 - Piano fognario	FOGNATURA	Opere pluricomunali;	5.369.000	662.690		662.690	4.272		4.272	-99%	Disponibilità prevista per interventi su reticoli fognari minori su richiesta dei Comuni secondo le disponibilità previste nella tabella D allegata al POI approvato
2014REIA0087	5.2.25 - Estendimenti acqua in zone non servite. Studio zone contaminate da arsenico Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnuovo Sotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali;	524.860	100.000		100.000	1.635		1.635	-98%	Disponibilità prevista per estendimenti di rete su richieste di privati soggette a cofinanziamento. Nel corso del 2016 non sono pervenute richieste
2014REIA0088	5.4.11 - Estensione fogne nere o miste	FOGNATURA	Opere pluricomunali;	369.044	100.000		100.000	3.940		3.940	-96%	Disponibilità prevista per estendimenti di rete su richieste di privati soggette a cofinanziamento. Nel corso del 2016 non sono pervenute richieste
2014REIA0089	5.4.8 - Adeguamento e nuova costruzione di collettori fognari verso gli impianti di trattamento o collettori esistenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali;		0		0	0		0	0%	
2014REIA0090	Distributori di acqua pubblica	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali;	198.856	40.000		40.000	50.490		50.490	26%	Realizzati distributori di acqua pubblica
2014REIA0091	5.2.2. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. - 5.2.9. - 5.2.9. - 5.2.11. - 5.2.12. - 5.2.13 - Manutenzioni straordinarie acqua	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali;	34.320.631	5.500.000		5.500.000	6.994.960		6.994.960	27%	Maggiori necessità di interventi di manutenzione straordinaria per: maggior numero di rifacimento prese a seguito di rotture; maggiori sostituzioni di reti di distribuzione; adeguamento accesso impianti D.Lgs 177 (ambienti confinati); spostamenti imprevisti adduttrici per interferenze con opere di viabilità pubblica
2014REIA0092	5.2.19 - Interconnessioni acquedotti e nuove opere adduttrici (tab. 5.3)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali;		0		0	0		0	0%	
2014REIA0093	5.2.20 - Nuovi serbatoi di stoccaggio	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali;		0		0	0		0	0%	
2014REIA0094	5.4.1. - 5.4.2. - 5.4.3. - 5.4.4. - 5.4.5 - Manutenzioni straordinarie fog/dep	FOGNATURA	Opere pluricomunali;	20.764.703	3.500.000		3.500.000	4.034.802		4.034.802	15%	
2014REIA0095	5.2.1 - Cartografia numerica acqua/fognature	TUTTI	Opere pluricomunali;	1.588.814	250.000		250.000	362.212		362.212	44%	Maggiori risorse dedicate all'attività di aggiornamento della cartografia numerica delle reti soprattutto fognarie
2015REIA0096	Potenziamento impianto idr. linee TAV Autostrada A1-Sesso-RE	ACQUEDOTTO	Reggio Emilia;								0%	
2015REIA0097	Serbatoio di Novellara - 1° Stralcio completamento	ACQUEDOTTO	Novellara;					49.845		49.845	100%	Completamento impianto elettrico centrale idrica realizzata in annualità precedenti

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016REIA0113	Depuratore di Valestra: realizzazione 2ª linea	DEPURAZIONE	Carpineti;	250.000							0%	
2016REIA0114	Risoluzione criticità idraulica collettore di Salvaterra, loc. Villaggio Macina Dinazzano	FOGNATURA	Casalgrande;	500.000	50.000		50.000				-100%	In corso le verifiche preliminari per definire le priorità di intervento
2016REIA0115	Acquedotto di Salvaterra: potenziamento adduttrice tratto terminale DN 200	ACQUEDOTTO	Casalgrande;	180.000							0%	
2016REIA0116	Agglomerato Salvaterra: adeguamento potenzialità impianto a 27.000 - Realizzazione 4° sedimentatore e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	Casalgrande;	150.000							0%	
2016REIA0117	Potenziamento impianto di depurazione Casina 2	DEPURAZIONE	Casina;	325.000							0%	
2016REIA0118	Studio razionalizzazione rete fognaria in loc. diverse del comune di Casina	FOGNATURA	Casina;	20.000							0%	
2016REIA0119	Sostituzione adduttrice Via Manganello	ACQUEDOTTO	Castellarano;	200.000	195.330		195.330	95.416		95.416	-51%	Cantiere in corso ma in ritardo rispetto alla pianificazione, si prevede la conclusione dei lavori nella primavera 2017
2016REIA0120	Rifacimento collettore fognario in Via De Gasperi, Via Fontanesi e Via Risorgimento in loc. Felina	FOGNATURA	Castelnovo Monti;	165.000	165.000		165.000				-100%	Progettazione esecutiva in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione dovuto alla complessità di realizzazione del collettore. Si prevedono scavi profondi in prossimità di fabbricati
2016REIA0121	Acquedotto Gabellina: adeguamento scarico acque controlavaggio Collagna	ACQUEDOTTO	Collagna;	200.000				25.149		25.149	100%	Anticipate spese di progettazione e di acquisto dell'area per intervento pianificato nell'annualità 2017
2016REIA0122	Potenziamento reticolo fognario in Via del Falegname	FOGNATURA	Correggio;	500.000	250.000		250.000				-100%	Progettazione esecutiva in corso in attesa di definire le modalità esecutive con Attuatori privati di opere concomitanti
2016REIA0123	Estensione fognario in Via Ville loc. San Girolamo 1° lotto	FOGNATURA	Guastalla;	105.000	104.836		104.836	5.382		5.382	-94%	Progettazione esecutiva completata. Si prevede la realizzazione nella primavera 2017
2016REIA0124	Tagliata: realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento	FOGNATURA	Guastalla;	180.000							0%	
2016REIA0125	Razionalizzazione sistema fognario in strada Barilla e limitrofe	FOGNATURA	Montecchio;	150.000	50.000		50.000				-100%	In corso le verifiche preliminari per definire le priorità di intervento
2016REIA0126	Sostituzione adduttrice Novellara-Bettolino	ACQUEDOTTO	Novellara;	600.000							0%	
2016REIA0127	Eliminazione criticità di drenaggio area nord-est: Area Ex-Reggiane	FOGNATURA	Reggio Emilia;	500.000	200.000		200.000				-100%	L'opera deve essere realizzata in concomitanza a lavori di riqualificazione dell'area da parte del Comune, si prevede nel corso del 2017
2016REIA0128	Depuratore di Roncocesi - sistemazione e adeguamento impiantistica	DEPURAZIONE	Reggio Emilia;	300.000	50.000		50.000				-100%	In corso le verifiche preliminari per definire le priorità di intervento

ALLEGATO 1
IREN REGGIO EMILIA
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016REIA0129	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia;	300.000	300.000		300.000	1.395		1.395	-99%	Progettazione esecutiva in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione dovuto alla complessità di realizzazione dell'opera
2016REIA0130	Depuratore di Mancasale - adeguamenti tecnologici	DEPURAZIONE	Reggio Emilia;	640.000							0%	
2016REIA0131	Ristrutturazione collettore fognario in Via Lungocrostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia;	200.000	200.000		200.000	112.208	164.080	-51.872	-43	Cantiere in corso, sospeso per problemi di viabilità. In accordo con il comune di Reggio Emilia sarà possibile la ripresa dei lavori solo a scuole chiuse: giugno 2017
2016REIA0132	Potenziamento collettore Villaggio Crostolo	FOGNATURA	Reggio Emilia;	100.000	20.000		20.000				-100%	Progettazione esecutiva completata, manca autorizzazione Autostrada A1 e TAV
2016REIA0133	Risoluzione criticità idraulica rete fognaria in loc. Pieve, Parco Buda	FOGNATURA	Reggio Emilia;	100.000	100.000		100.000				-100%	Progettazione esecutiva completata. Si prevede la realizzazione nella primavera 2017
2016REIA0134	Nuovo serbatoio Rubiera mc 2000	ACQUEDOTTO	Rubiera;	1.408.465	49.346		49.346	10.543		10.543	-78%	Progettazione in corso
2016REIA0135	Depuratore di Rubiera: sistemazione e potenziamento linea fanghi	DEPURAZIONE	Rubiera;	180.000							0%	
2016REIA0136	Depuratore di San Martino: potenziamento linea fanghi e progettazione dell'adeguamento del parametro Azoto Totale ai limiti di Tabella 2, allegato 5 D.Lgs 152/06	DEPURAZIONE	San Martino in Rio;	200.000							0%	
2016REIA0137	Rifacimento collettore di Arceto a monte dello scolmatore	FOGNATURA	Scandiano;	350.000							0%	
2016REIA0138	Depuratore di Bosco: sistema di aerazione seconda linea	DEPURAZIONE	Scandiano;	180.000	180.000		180.000				-100%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per la necessità di monitoraggio del funzionamento del depuratore ai fini di dimensionare correttamente l'impianto di aerazione
2016REIA0139	Risanamento fognature in loc. Sedrio 2° lotto	FOGNATURA	Vezzano sul Crostolo;	100.000							0%	
2016REIA0140	Trattamenti Appropriati agglomerato <200 AE: realizzazione fossa imhoff a servizio della frazione di Pineto	DEPURAZIONE	Vetto d'enza;	250.000	250.000		250.000	4.091		4.091	-98%	Progettazione in corso, in ritardo rispetto alla pianificazione per problemi di ottenimento di servitù di passaggio su terreni privati e autorizzazione zona sic
2016REIA0141	Sostituzione reti idriche da serb. Faggiola a serb. M.Te Cerlino. 1° e 2° stralcio	FOGNATURA	Viano;	450.000	200.000		200.000	123.319		123.319	-38%	Cantiere in corso, si prevede l'ultimazione nella primavera 2017
2016REIA0142	Trattamenti Appropriati: realizzazione depuratore a servizio della frazione di Sologno	DEPURAZIONE	Villaminazzo;	250.000							0%	
2016REIA0143	Sistemazione rete fognaria in loc. Razzolo	FOGNATURA	Villaminazzo;	30.000	30.000		30.000	34.831		34.831	16%	
2016REIA0144	Completamento rete fognaria in loc. Minozzo	FOGNATURA	Villaminazzo;	30.000	30.000		30.000				-100%	Piccolo intervento di completamento della rete fognaria da realizzarsi su proprietà privata: Intervento concordato con il proprietario, da realizzare nel 2017
2016REIA0145	Estensione reti a carico di privati	TUTTI	Opere pluricomunali;					192.697	145.717	46.981	100%	Interventi richiesti e finanziati da privati ma non previsti nel Programma degli interventi

ALLEGATO 1
 IREN REGGIO EMILIA
 CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNUALITA' 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE PREVISTO	Importo lordo pianificato 2016	Contributi pianificati 2016	Importo netto pianificato 2016	Importo lordo consuntivo 2016	Contributi consuntivo 2016	Importo netto consuntivo 2016	Percentuale di Scostamento	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2016, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2016REIA0146	Contributi - Coll.soll.pretratt. Imhoff dep. LUZZARA (2014REIA0085)	DEPURAZIONE	Luzzara;								0%	
2016REIA0147	Contributi - Risanamento Cavo Ariolo RE (2014REIA0094)	DEPURAZIONE	Reggio Emilia;								0%	
2016REIA0148	Contributi - Raccolta acque nere via Tassoni RE (5.4.17)	FOGNATURA	Reggio Emilia;								0%	
2017REIA0149	Potenziamento con spostamento dell'impianto di sollevamento fognario in Via G. di Vittorio	FOGNATURA	San Polo d'Enza;	50.000							0%	
TOTALE INVESTIMENTI 2016					23.343.203	1.090.067	22.253.136	18.979.907	354.797	18.625.110		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 6 del 17.10.2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore Iren S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 17.10.2017

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Reggio Emilia

F.to Tania Tellini

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 23 ottobre 2017
